

◆ 특수공시 목록 ◆

연번	사 업 명	부 서	비고
1	연안동 행정복지센터 신축	총무과	
2	전통시장 시설 현대화 지원 (신포시장 아케이드 개선 공사)	일자리경제과	
3	송월동 동화마을 경로당 확충	어르신장애인과	
4	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	기반시설과	
5	선녀바위 문화탐방로 조성사업	도시공원과	
6	무의도 해상관광탐방로 연결사업	도시공원과	
7	용유도 해안 조망 공간 조성사업	도시공원과	
8	무의도 트레킹 둘레길 조성 사업	도시공원과	

1 연안동 행정복지센터 신축

문화복지 시설이 열악한 연안동 지역에 행정복지센터 청사를 신축하여 주민 행정서비스 향상 및 주민편의를 도모하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 축항대로86번길 44 (항동7가 58-70)
- 규 모 : 지하 1층, 지상 5층
- 대지면적 999㎡ / 건축연면적 2,422㎡
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2020. 1월
- 사업예산 : 6,423백만원 (국비 400 / 구비 6,023)

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별 / 구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계	6,423	1,287	3,284	1,852	
국고보조금	400	400	-	-	
시비보조금	-	-	-	-	
자체재원	6,023	887	3,284	1,852	
지방채	-	-	-	-	

■ 추진실적


- 2016. 10월 : 연안동 주민센터 신축 기본계획 수립
- 2017. 10월 ~ 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2020. 1월 : 공사 준공

■ 기대효과

- 주민들의 행정서비스 만족도 향상

■ 관련사진

○ 현장사진

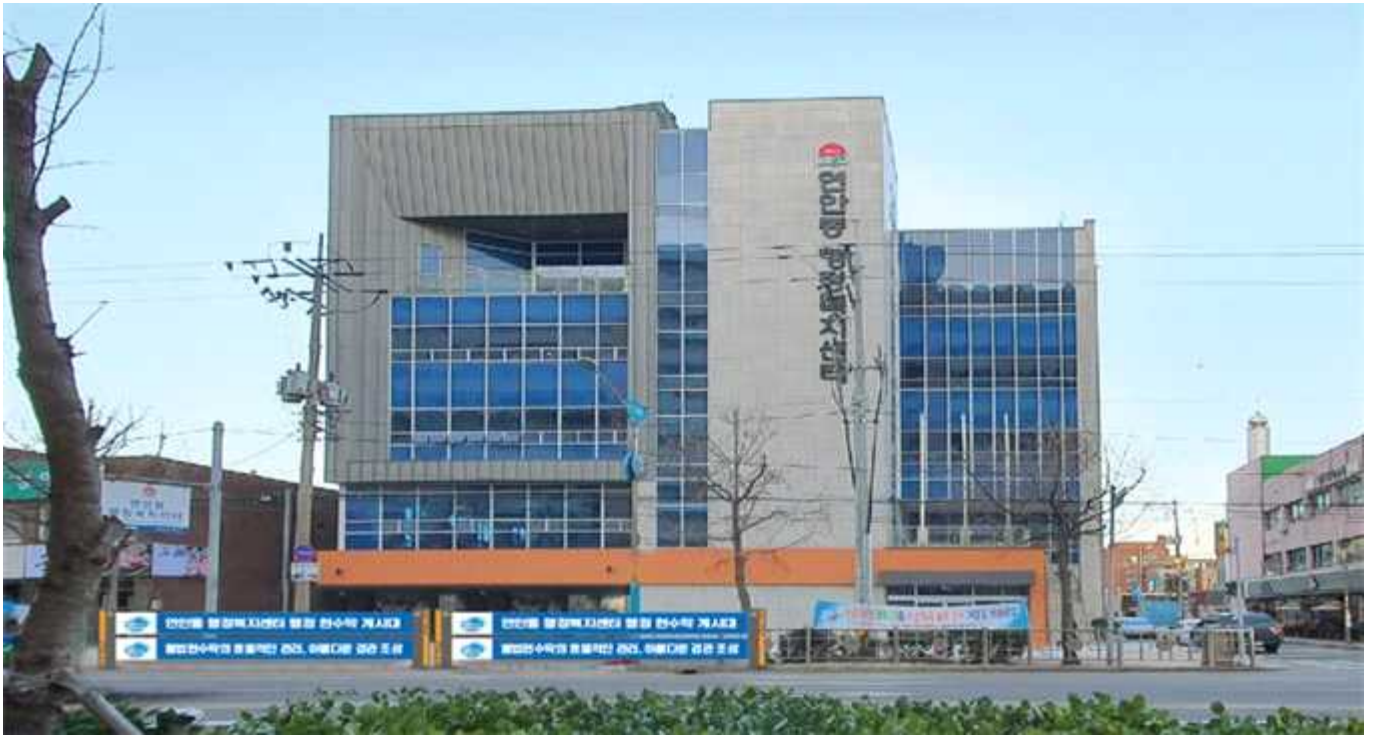

2 전통시장 시설 현대화 지원(신포시장 아케이드 개선 공사)

신포시장 내 아케이드 시설현대화 사업 추진으로 고객편의 증진 및 시장 내 건물 안전도를 제고하여 신포시장을 중심으로 한 지역상권 활성화를 유도하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월 ~ 2020. 12월
- 사업위치 : 신포국제시장
- 사업비 : 937백만원 (국비 562 / 시비 141 / 구비 187 / 자부담 47)
- 주요내용 : 신포국제시장 아케이드 리모델링 공사
 - 기존)폴리카보네이트 → 변경)PTFE 막구조
- 사업물량 : 2,553.09㎡

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계					937	
국고보조금					562	
시비보조금					141	
자체재원					234	
지방채						

■ 추진실적


- 2019. 6월 ~ 8월 : 신포시장 아케이드 개선공사 실시설계
- 2019. 12월 : 신포시장상인회 자부담금액 납부(47백만원)
- 2020. 4월 : 신포시장 아케이드 개선공사(건축, 관급자재) 계약체결 및 착공
- 2020. 11월 : 신포시장 아케이드 개선공사(건축, 관급자재) 준공

■ 기대효과


- 쾌적하고 깨끗한 쇼핑 환경제공을 통한 매출증대 및 시장 활성화 기여
- 노후시장시설 개선을 통한 시장이용 안전성 제고

■ 관련사진

○ 위치도

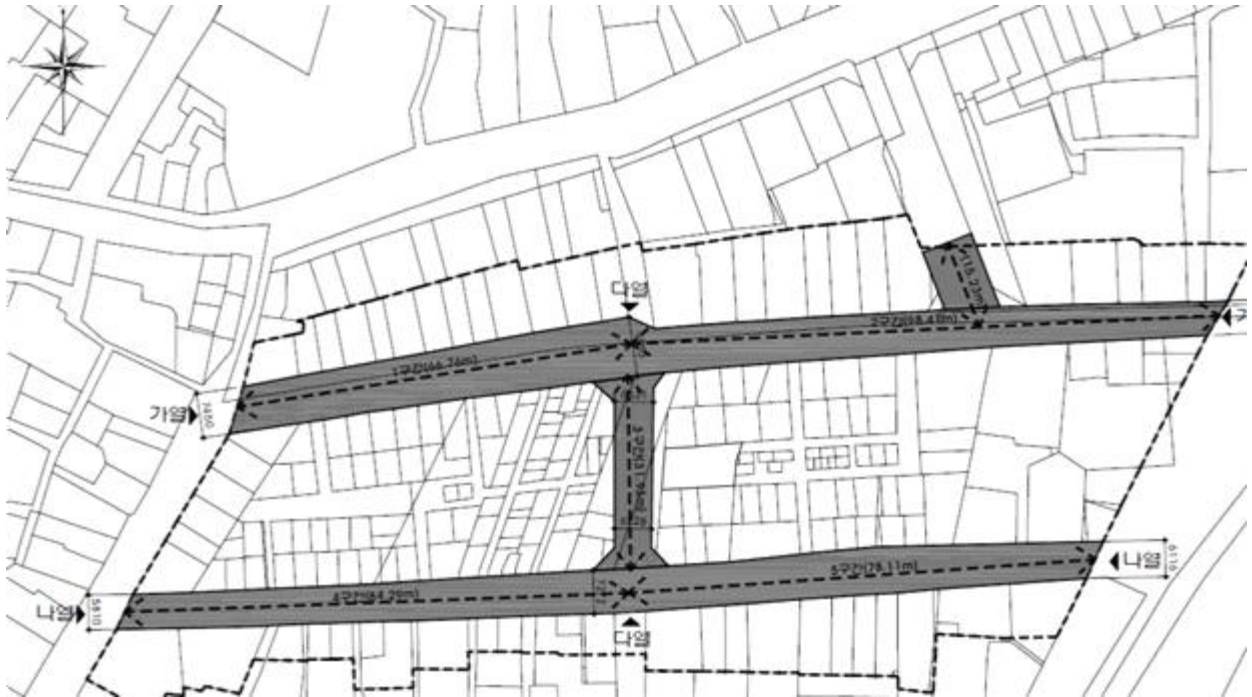

○ 현장사진

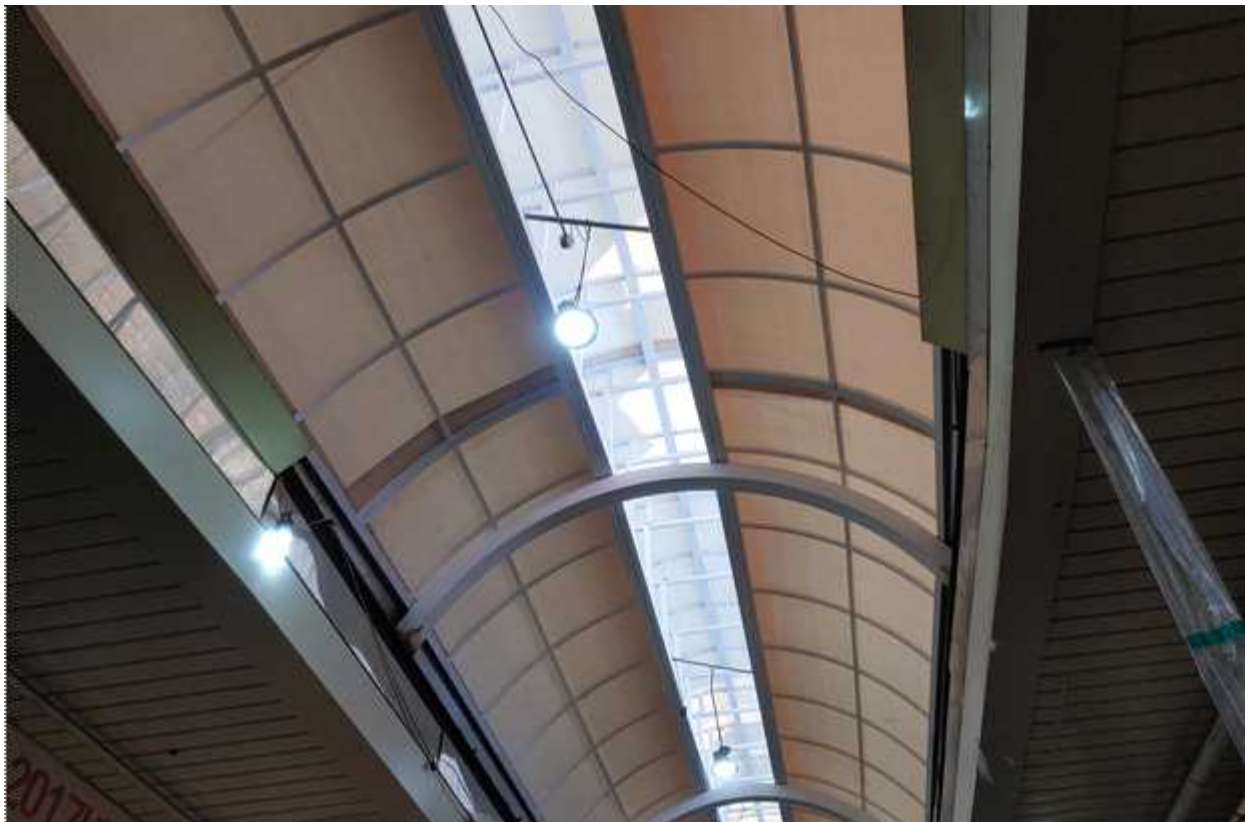

3 송월동 동화마을경로당 확충

동화마을경로당을 신축하여 지역 내 어르신들의 여가복지증진과 소통공간으로 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2020. 10월
- 위 치 : 인천광역시 중구 동화마을길 21-60(송월동3가)
- 규 모 : 지상1층, 연면적 165.06㎡
- 사 업 비 : 529백만원(전액구비)
- 사업내용 : 경로당 신축

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계		529	20	2	40	467
국고보조금						
시비보조금						
자체재원		529	20	2	40	467
지방채						

■ 추진실적


- 2016. 2월 : 경로당 건립 건의서 접수(주민 299인)
- 2016. 3월 : 경로당 건립계획 수립
- 2017. 2월 : 도시관리계획(지구단위계획) 변경고시
(주차장폐지⇒사회복지시설·공공공지 결정)
- 2017. 3월 : 변경계획 수립(지상 1층 화장실, 지상 2층 경로당)
- 2018. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2018. 3월 : 주민설명회 실시
- 2019. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 8월 : 계약 체결
- 2019. 9월 : 공사 착공 → 송월동 주민 30인 진정서 제출 → 공사 중지
- 2020. 4월 : 변경계획 수립(지상 1층) → 공사변경 계약 체결 → 공사 착공
- 2020. 10월 : 공사 준공
- 2020. 11월 : 노인여가복지시설(경로당) 등록

기대효과

- 지역 어르신들의 여가 및 소통 공간으로 활용

관련사진

- 위치도

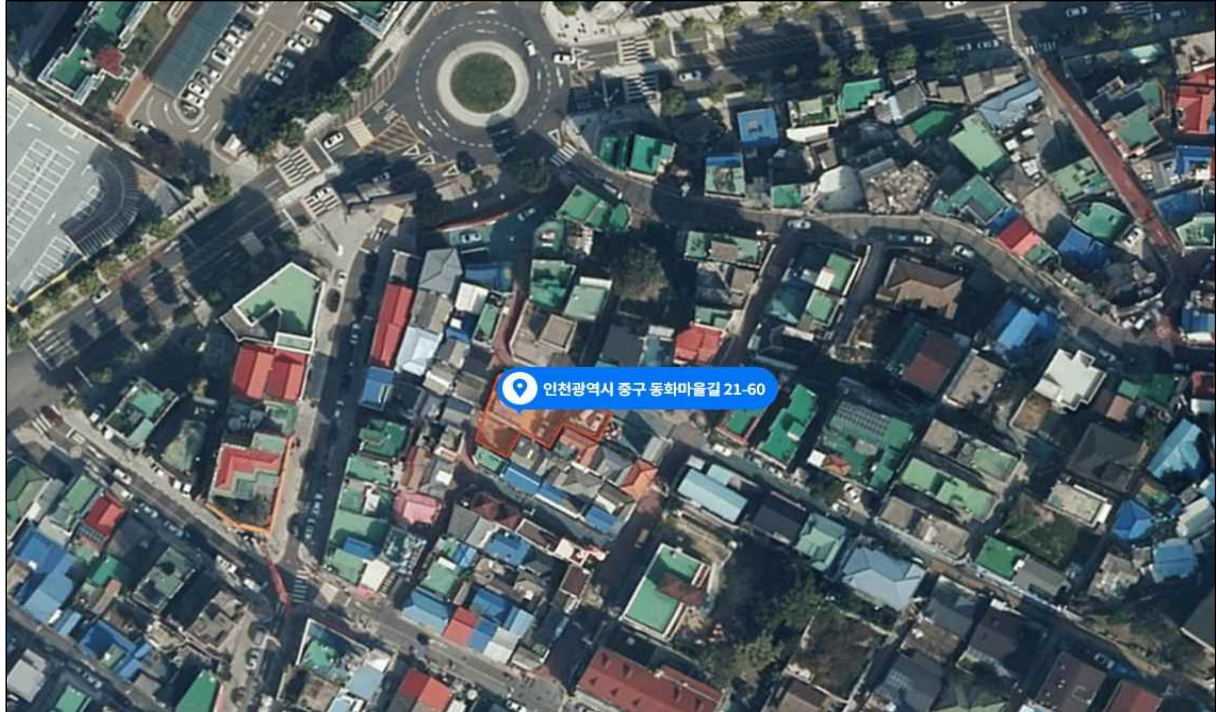

- 현장사진



4

영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사

운북교 ~ 운북동 높은마을 입구를 연결하는 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선, 상·하수도 및 도시가스 등 주민편의시설 공급기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2020. 4월
- 위 치 : 운북동 13-22 ~ 운북동 27-2
- 규 모 : 도로개설 L=850m, B=8m
- 총사업비 : 5,200,000천원 (시비 2,500,000 / 구비 2,700,000)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별 / 구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계	5,200	5,000	-	200	-
국고보조금					
시비보조금	2,500	2,500	-	-	-
자체재원	2,700	2,500	-	200	-
지방채					

추진실적

- 2016. 9월 : 중기지방재정계획 반영
- 2017. 5월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017.12월 : 실시계획인가
- 2018. 1월 : 보상계획 공고
- 2018. 1월 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2018. 8월 : 공사 착공
- 2020. 4월 : 공사 준공

기대효과

- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

■ 관련사진

○ 위치도 및 현장사진

위치도



현장사진



5 선녀바위 문화탐방로 조성사업

용유지역 천혜 해안경관인 선녀바위~을왕리해수욕장의 아름다운 자연과 구전 설화를 엮어 해안 탐방로를 개설하여 관광객이 느끼고 체험할 수 있는 걷기 중심의 둘레길을 조성하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03 ~ 2020. 12
- 위 치 : 선녀바위 해변 ~ 을왕리 해수욕장
- 규 모 : 탐방로(2.1km)
- 총사업비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 데크로드, 전망대, 출렁다리, 포도존 등

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계		1,500	-	-	1,500	-
국고보조금		500	-	-	500	-
시비보조금		-	-	-	-	-
자체재원		1,000	-	-	1,000	-
지방채		-	-	-	-	-

■ 추진실적

- 2019. 04 : 특별교부세(지역현안) 교부 결정
- 2019. 07 : 토지사용 협의 및 선녀바위 문화탐방로 실시설계용역 착공
- 2020. 03 : 선녀바위 탐방로 조성사업 본공사, 관급데크로드 착공
- 2020. 04 : 관급자재 출렁다리 착공
- 2020. 09 : 태풍 및 집중호우로 인하여 공사(납품)기간 연장
- 2020. 12 : 선녀바위 탐방로 조성사업 및 관급자재 준공

■ 기대효과

- 용유지역 최고의 탐방로 조성을 통한 국내외 관광객 유치
- 주민이 힐링할 수 있는 공간 확충 및 지역경제 활성화 적극 도모

■ 관련 사진

○ 위치도



○ 현장사진



6 무의도 해상관광탐방로 연결사업

기존 무의도 해상관광탐방로를 연장 조성하여 호룡곡산 등산로 환상의 길과 연결, 순환형 탐방로를 조성함으로써 해상관광탐방로 수용 가능 인원 및 코스 이용의 효율성 증대를 통한 무의도 관광 활성화 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03 ~ 2020. 12
- 위 치 : 중구 무의동 하나개해수욕장 일원 공유수면
- 규 모 : 탐방로(0.3km)
- 총사업비 : 1,400백만원
- 사업내용 : 해상데크로드(302M)

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별 구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계	1,400	-	-	1,400	-
국고보조금	700	-	-	700	-
시비보조금	500	-	-	500	-
자체재원	200	-	-	200	-
지방채	-	-	-	-	-

■ 추진실적

- 2018. 6월 : 무의도 해상관광탐방로 조성사업 준공(L=550m)
- 2020. 1월 : 일상감사, 계약심사 결과 통보
- 2020. 3월 : 공유수면 점·사용허가 승인
- 2020. 4월 : 공사 착공
- 2020. 7월 : 강관 파일 설치 완료(ϕ 500mm, 21EA)
- 2020. 8월 : 종점부 계단 제작 및 도장
- 2020. 10월 : 거더 설치 완료(B=2.0m, L=289.4m)
- 2020. 11월 : 교량 데크 설치
- 2020. 12월 : 무의도 해상관광탐방로 연결사업 준공

기대 효과

- 무의지역 관광인프라 확충을 통한 관광객 유입 증가
- 지역내 유동인구 증가에 따른 경제활성화 및 주민소득 증대 기여

관련 사진

- 위치도



- 현장사진



7

용유도 해안 조망 공간 조성사업

주민 요구 사업으로 용유 지역의 특색있는 경관자원을 체계적으로 정비하고 보전·관리하여 지역 경제 활성화를 도모하고, 도서 지역 정주 환경을 개선하여 지역 주민의 삶의 질 개선에 기여하고자 함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01 ~ 2020.07
- 사업위치 : 중구 덕교동 128-48번지
- 사업내용
 - 전망대 진입로 설치 1식
 - 전망대 설치 1식
 - 야간 경관조명 설치 1식

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계		1,000	-	-	-	1,000
국고보조금		-	-	-	-	
시비보조금		500	-	-	-	500
자체재원		500	-	-	-	500
지방채		-	-	-	-	

■ 추진실적

- 2020. 3월 : 공사 착공
- 2020. 7월 : 공사 준공
- 2020. 8 ~ 9월 : 「용유 하늘전망대 환경개선 공사」 착공 및 준공
- 2020. 9월 : 「용유 하늘전망대」 개장

■ 기대효과

- 경관이미지 향상을 통해 지역의 장소적 가치 상승을 통하여 관광수요 증대 및 지역경제 활성화에 기여

■ 관련 사진

○ 위치도



○ 현장사진



8 무의도 트레킹 둘레길 조성사업

무의도 일원에 트레킹 둘레길을 조성하여 산림과 해안풍경을 느끼며 걸을 수 있는 관광 기반시설을 확충하여 관광객 유입을 증대하고 지역경제활성화 및 주민 소득창출에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4 ~ 2020. 12
- 위 치 : 중구 무의동 실미도~작은하나개 일원 산림 및 공유수면
- 규 모 : 둘레길(5.0km)
- 총사업비 : 3,750백만원
- 사업내용 : 해상데크로드, 숲데크로드, 전망대, 안내판 등

■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	구분	총사업비	2017년 이전	2018년	2019년	2019년 이후
계		3,750	-	118	3,632	-
국고보조금		2,800	-	94	2,706	-
시비보조금		209	-	7	202	-
자체재원		740	-	17	723	-
지방채		-	-	-	-	-

■ 추진실적

- 2019. 4월 : 공사 착공
- 2019. 12월 : 파일 기초 보완 추가예산 반영
- 2019. 12월 : 사업 명시이월 및 동절기 공사 중지
- 2020. 2월 : 공사 설계변경 계약체결 및 공사 재개
- 2020. 4월 : 도급공사 일시중지
- 2020. 6월 : 관급자재(SY-I형 거더) 납품 완료
- 2020. 7월 : 관급자재(조인트바 데크) 납품 완료
- 2020. 10월 : 관급자재(일체형 데크시스템) 설계변경
- 2020. 11월 : 사후해양환경영향조사 설계변경
- 2020. 12월 : 무의도 트레킹둘레길 조성사업 준공

기대효과

- 무의도 지역 관광 인프라 확충을 통한 지역경제 활성화 도모
- 걷기 중심의 트레킹문화 활성으로 산림휴양문화 확대

관련사진

- 위치도



- 현장사진

