

2021년도 예산 반영, 주민참여예산 사업 현황

(2021.5.31. 기준, 단위 : 천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	총 계	총 43건	2,540,100	748,299	3	24	16
1	홍보체육실 (영중동)	백운로228번길 방범용 CCTV 설치	150,000	0		○	
2	문화관광과 (북성동)	차이나타운 디자인 계단 사업	170,000	0		○	
3	문화관광과 (신포동)	월드커뮤니티센터 관광안내 홍보판 설치	15,000	12,946			○
4	어르신 장애인과	장애인 친화도시 'ALL IN ONE' 프로젝트	10,000	822		○	
5	건설과 (북성동)	제물량로 일원 보안등 설치 사업	13,000	13,000			○
6	건설과 (신포, 동인천, 신흥)	긴 담모퉁이길 및 홍예문 확대 안전진단용역	20,000	19,604			○
7	건설과 (동인천)	보도블럭 정비 및 안전휀스 설치	72,000	23,000		○	
8	건설과 (중구)	장애인을 위한 점자 보도블럭 정비	150,000	0		○	
9	건설과 (신포동)	칼국수 골목 일원 보행환경 개선	60,000	30,000		○	
10	도시개발과 (신포동)	답동쉼터 시계조형물 정비	25,000	0		○	
11	도시개발과 (동인천동)	홍예문로 꽃 터널 길 조성	75,000	0		○	
12	교통운수과 (신포동)	홍예문로 교차로내 태양광 도로 표지병 설치	5,000	4,889			○
13	교통운수과 (중구)	어린이보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치	100,000	97,850			○
14	교통운수과 / 교통과 (중구)	버스승강장 냉방 편의시설 설치	73,500	0		○	
15	환경보호과 (운서동)	넙디 내 상습 무단투기지역 CCTV 설치	40,000	39,814			○
16	환경보호과 (중구)	공중화장실 세척대 설치 사업	3,000	0		○	
17	도시공원과 (운서동)	백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치	100,000	5,364		○	
18	도시공원과 (운서동)	세계평화의 숲 산책로 가로수 정비	600,000	247,080		○	
19	도시공원과 (영중동)	예단포항 산책로 입구 계단 설치	20,000	16,836			○

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
20	도시공원과 (영종국제 도시)	인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성	50,000	0		○	
21	도시공원과 (운서동)	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비	350,000	85,828		○	
22	보건행정과 (중구)	방역취약계층 방문방역 지원 사업	100,000	34,445		○	
23	신포동	신포역 부근 경관개선사업	25,000	13,860		○	
24	신포동	신포로35번길 감나무길 화단 조성사업	15,000	4,480		○	
25	연안동	자전거 공기펌프기 설치	5,000	4,840			○
26	신흥동	주민자치센터 방수 및 리모델링 공사	14,000	13,100			○
27	신흥동	동 청사(체력단련실,회의실) 방수 공사	22,000	20,390			○
28	도원동	도원동 일대 계단 방부목 및 난간 보수	5,000	4,340			○
29	율목동	장수의자(어르신일자) 설치	5,000	0		○	
30	율목동	율목동 환경개선사업	22,000	0		○	
31	율목동	코로나 19 대비 살균 소독수 지원	10,600	6,523			○
32	동인천동	주민 소통 공간 조성	20,000	0		○	
33	동인천동	동인천동 힐링 체험 교육	10,000	0	○		
34	북성동	북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업	4,000	3,880			○
35	북성동	삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치	3,000	0		○	
36	북성동	차이나타운 경사 개선 사업	5,000	4,801			○
37	북성동	북성동 동네부엌 조성 사업	30,000	0		○	
38	송월동	무단횡단금지대 설치	20,000	18,130			○
39	영종1동	영종1동 소식지 게시판 설치	13,000	12,986			○
40	영종1동	배움과 나눔(아기자기)	27,000	0	○		
41	운서동	앞마루 공원 정자 정비	38,000	9,491		○	
42	운서동	상습 무단투기지역 꽃씨뿌리기 활동	2,000	0	○		
43	용유동	마을 공동 부엌 설치	43,000	0		○	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-18
------	---------


기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	백운로228번길 방범용 CCTV 설치			제안자	김*호
부서명		담당자	방송통신7급 전명지	연락처	760-7102
추진상황	예산	150,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		30%	

□ 개 요

- 위 치 : 백운로228번길 외 12개소
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 주민참여예산 제안자 의견을 반영하여 영종역2번 출구 ~ 백운로228번길 논골마을 일대 방범 사각지대에 대해 CCTV 설치
 - 설치 시 200만 화소 회전형 및 고정형 카메라, IP비상벨 설치
- 추진상황
 - 2021. 2월 : 주민참여예산 주민의견 청취 및 현장실사
 - 2021. 2월 : 일상감사, 계약심사 의뢰
 - 2021. 3월 : 행정예고 시행
 - 2021. 4월 : 2021년 방범용 CCTV 설치공사 착공
- 향후계획
 - 2021. 6월 초 : 2021년 방범용 CCTV 설치공사 준공
 - 2021. 6월 말 : 관제업무 개시

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-38
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	차이나타운 디자인 계단 사업			제안자	장*훈
부서명	문화관광과	담당자	시설6급 김두용	연락처	760-6452
추진상황	예산	170,000천원		집행액	0천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			20%

□ 개 요

- 위 치 : 선린문 계단 일원
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 차이나타운 선린문 계단을 특색있는 계단으로 재정비

□ 그동안 추진사항

- 2021. 2. 4 : 용역 발주
- 2021. 2. 19 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. 19 : 용역 중지(주민의견 수렴)
- 2021. 5. 20 : 주민참여예산 제안자 설명

□ 향후계획

- 2021. 6월 : 용역 재개
- 2021. 6월 : 공사 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-112
------	----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	월드커뮤니티센터 관광안내 홍보판 설치			제안자	류*근
부서명	문화관광과	담당자	행정7급 정해원	연락처	760-6477
추진상황	예산	15,000천원		집행액	12,946천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 월드커뮤니티센터 내(중구 제물량로 232번길 26)
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 관광 포스터 등 안내물 게시대 및 주변 주요관광지의 안내지도가 포함 된 다기능 홍보판 설치
 - 월드커뮤니티센터 내 관광안내 홍보판을 신규 설치하여 홍보 기능강화

□ 추진사항

- 2021. 4. 23 : 관광안내 홍보판 제작·설치 계획 수립
- 2021. 5. 11 : 관광안내 홍보판 제작·설치 물품 계약 체결
- 2021. 5. 31 : 관광안내 홍보판 제작 및 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p data-bbox="1038 1823 1197 1850">사진 별첨</p>

사업 시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-16
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.


사업명	장애인 친화도시 'ALL IN ONE' 프로젝트			제안자	방*혁
부서명	어르신장애인과	담당자	사회복지 7급 정지현	연락처	760-7662
추진상황	예산	10,000천원	집행액	822천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		8%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 매소홀로 10 인천중구장애인종합복지관
- 사업기간 : 2021년 2월 ~ 12월
- 사업내용
 1. AAC(보완대체 의사소통) 환경 조성으로 장애인의 의사소통 접근성 강화
 2. 지역사회 활동가 양성으로 장애인의 긍정적인 인식개선 효과 도모
- 추진상황
 1. AAC(보완대체 의사소통) 관련 1,2차 직원 교육 실시
 - 코로나19 방역수칙에 따라 실시간 화상시스템 줌(ZOOM)으로 진행
 2. 복지관 내 AAC(보완대체 의사소통) 환경 조성 준비
 - AAC 시스템 및 안내도움판 구입
 - AAC 상징물 이미지 매칭
 - 복지관 시각 지원판 제작
- 향후계획
 1. 6/2(수) : AAC 3차 직원 교육 진행
 2. 중구장애인종합복지관 내부 환경 ACC(보완대체 의사소통) 조성
 3. 지역 사회 활동가 모집, 캠페인 등 활동 진행

□ 관련사진

사업시행 중 (2차 직원교육)



사업시행 중 (AAC 안내도움판 구입)



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-52
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	제물량로 일원 보안등 정비공사	제안자	조*경
부서명	건설과 담당자	공업9급 나원영	연락처 760-7833
추진상황	예산	13,000천원	집행액 13,000천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
			○ 100%

□ 개 요

- 위 치 : 제물량로 일원(제물량로 로터리~인천역 사거리)
- 사업기간 : 3월(착공일로부터 28일간)
- 사업내용
 - 보안등 신설 4본
 - LED 로고조명 설치 7개소
- 추진상황
 - 보안등 신설 4본, LED 로고조명 7개소 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-95
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	긴 담모퉁이길 및 홍예문 축대 안전진단 용역			제안자	조*원
부서명	건설과	담당자	시설9급 이강산	연락처	760-7454
추진상황	예산	20,000천원		집행액	19,604천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			100%

□ 개 요

- 위 치 : 송학동3가8 일원 외 1개소
- 사업기간 : 2021.3. ~ 2021.5.
- 사업내용
 - 홍예문 및 긴담모퉁이길 석축 정밀안전점검 용역
 - 석축의 구조적인 결함의 유무를 확인하여 향후 점검 및 유지관리에 활용
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 정밀안전점검 용역 착수
 - 2021. 5월 : 정밀안전점검 용역 준공
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 결과보고회 개최 및 건의자에게 결과알림

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2018 - 72
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	보도블럭 정비 및 안전휰스 설치(큰우물로 일대)			제안자	동인천동 주민자치위원회
부서명	건설과	담당자	시설9급 정예준	연락처	760-7456
추진상황	예산	72,000천원		집행액	23,000천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			90%

□ 개 요

- 위 치 : 큰우물로 일원 (길병원 ~ 예지요양병원 앞)
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 6월
- 사업내용
 - 보도블럭 정비 (L = 159M, B = 2M)
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 제안자 의견 확인 및 현장점검
 - 2021. 4월 : 동인천동 행정복지센터 및 주민자치위원회 의견수렴
 - 2021. 4월 : 설계도서 작성 및 착공
 - 2021. 05. 03. : 동인천동 주민자치위원회와 보도 패턴협의
 - 2021. 05. 24. : 큰우물로 일원 보도정비공사 착공
- 향후계획
 - 2021. 06. 20. : 큰우물로 일원 보도정비공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-39
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	장애인을 위한 점자 보도블럭 정비			제안자	이*배
부서명	건설과	담당자	시설9급 이강산	연락처	760-7454
추진상황	예산	150,000천원		집행액	0천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			20%

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 일원(영종·용유 제외)
 - 인천역~중부경찰서 일원, 율목동 행정복지센터 일원
 - 관내 부적정 설치구간 정비 등
- 사업기간 : 2021.5 ~ 2021.8
- 사업내용
 - 점자블록 미설치 구간 신규설치 및 부적정 설치구간 정비
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 계약의뢰
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 공사착공
 - 2021. 8월 : 공사준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-111
------	----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	칼국수 골목 일원 보행환경 개선			제안자	윤*정
부서명	건설과	담당자	시설8급 이주영, 공업9급 나원영	연락처	760-7455
추진상황	예산	60,000천원	집행액	30,000천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 신포동 61번지 일원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 토목 : 보도블럭 정비 (L=200, B=2~3m)
 - 전기 : 보안등 신설(4개소), 보안등 교체(10개소)
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 제안자 의견 및 현장 확인
 - 2021. 5월 : 토목 (보도블럭 정비 완료) / 전기 (설계완료 및 착공)
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 전기 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
 	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2019-80
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	답동쉼터 시계조형물 정비				제안자	김*애
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 박석준		연락처	760-7582
추진상황	예산		25,000천원	집행액		0천원
	시기 미도래		추진중	완 료		추진율
			○			0%

□ 개 요

- 위 치 : 답동 18-5(답동쉼터)
- 사업기간 : 미정
- 사업내용
 - 답동쉼터 시계탑 설치 1식
 - 기존시계탑 철거 및 폐기물 처리 1식
- 추진상황
 - 市에서 추진하는 「신포지하공공보도 연장 복합센터 사업」에 답동쉼터가 포함됨에 따라, 사업 세부내용에 관한 별도 협의 필요
 - 사업제안자에게 市추진사업방향에 대하여 설명하였으며, 답동쉼터 시계조형물 정비사업 잠정중단에 대하여 안내하고 의견 청취
- 향후계획
 - 市추진 사업에 답동쉼터 반영예정임에 따라, 시계탑 설치를 포함한 주민건의 사항 반영 협의 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-74
------	---------


기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	홍예문로 꽃 터널 길 조성			제안자	윤*수
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 박석준	연락처	760-7582
추진상황	예산	75,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 전동 2-4(동인천동 쉼터) 일원
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2021. 6.
- 사업내용
 - 장미터널(16개소) 설치 및 장미(320주) 식재
 - 플랜터 212.1m 설치, 꽃잔디 2,170본 식재, 기존수목 560주 이식 등
- 추진상황
 - '21.02.04. ~ '21.04.08. : 실시설계용역 완료
 - '21.05.14. : 공사 착공
- 향후계획
 - '21.06.22. : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-75
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	홍예문로 교차로내 태양광 도로 표지병 설치	제안자	김*섭
부서명	교통운수과 담당자	시설9급 강희엽	연락처
			760-7682
추진상황	예산	5,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
			○
			4,889천원
			추진율
			100%

□ 개 요

○ 위 치 : 홍예문로 교차로

○ 사업기간 : 시기 미도래

○ 사업내용

－ 홍예문로 교차로 내 태양광 표지병 34개 설치

○ 추진상황

－ 2021. 05. 12. 홍예문로 교차로 내 도로표지병 구입·설치 시행

－ 2021. 05. 12. 홍예문로 교차로 내 도로표지병 구입·설치 물품 계약의뢰

－ 2021. 05. 24. 준공

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-36
------	---------

기준일 : 2021. 05. 31.

사업명	어린이 보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치			제안자	이*문 이*린
부서명	교통운수과	담당자	시설9급 강희엽	연락처	760-7682
추진상황	예산	100,000천원	집행액	97,850천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	


☐ 개요

○ 위치

- 신흥동3가 7-207(인하대병원 앞) 약 420m 구간
- 신흥동3가 30(중구장애인 복지관 앞) 약 190m 구간
- 향동7가 27-106(연안초등학교 앞) 약 130m 구간
- 신흥동3가 28-2(신광초등학교 앞) 약 160m 구간
- 신흥동3가 56(삼익아파트 앞) 약 140m구간

○ 사업기간 : 2021. 02. 18. ~ 2021. 03. 05.

☐ 관련사진

구분	시공 전	시공 후
신흥동3가 7-207		
신선초등 학교		

구분	시공 전	시공 후
항 동 7 가 27-106		
신 흥 동 3 가 28-2		
신 흥 동 3 가 56		

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-37
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	버스승강장 냉방 편의시설 설치			제안자	김*기
부서명	교통운수과 교통과	담당자	행정7급 오상미 행정6급 조윤진	연락처	760-7572 760-7752
추진상황	예산	73,500천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 버스승강장 내
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월
- 사업내용
 - 버스승강장 내 에어커튼(송풍기) 설치
- 추진상황
 - (원도심) 2021. 4월 : 에어커튼(송풍기) 설치 대상지 검토
2021. 5월 : 전기공사 현지 실사
 - (영 종) 2021. 4월 : 에어커튼(송풍기) 설치 대상지 검토
2021. 5월 : 전기 굴착허가 신청 및 도로관리심의회 개최
- 향후계획
 - (원도심) 2021. 6월 : 냉방편의시설 설치 완료
 - (영 종) 2021. 6월 : 냉방편의시설 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-99
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	넙디 내 상습 무단투기지역 CCTV 설치			제안자	장*애
부서명	환경보호과	담당자	행정8급 정기영	연락처	760-7416
추진상황	예산	40,000천원	집행액	39,814천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 넙디 등 환경취약지역
- 사업기간 : 2021년 4월~5월 중
- 사업내용
 - 환경취약지역에 무단투기 단속을 위한 CCTV 10개 설치
- 추진상황
 - 2021.3. : CCTV 설치 지역 선정
 - 2021.3. : CCTV 설치 계획 수립
 - 2021.4. : CCTV 설치에 따른 행정예고 실시
 - 2021.5. : CCTV 설치
- 향후계획
 - CCTV 운용 및 단속 철저

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



설치 사진



인천광역시 중구 해안동2가 9-5

설치 사진



인천광역시 중구 신생동 2-22



인천광역시 중구 사동 30-58



인천광역시 중구 답동 35-16



인천광역시 중구 선화동 28-2



인천광역시 중구 운북동 779-27

설치 사진



인천광역시 중구 운서동 2893-4

설치 사진



인천광역시 중구 운서동 2889-15



인천광역시 중구 운남동 1719-39



인천광역시 중구 운서동 2854-6

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2019-60
------	---------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	공중화장실 세척대 설치 사업	제안자	김*애
부서명	환경보호과 담당자	환경7급 임 슬	연락처
			760-7218
추진상황	예산	3,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	0천원
			추진율
			0%

□ 개 요

- 위 치 : 월미도선착장 등 공중화장실 6개소
- 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업내용
 - 소요예산 : 500,000원 * 6개소
 - 2021년 市 주민참여예산 제안사업
 - 재활용이 가능하고 위생안전성이 높은 월경컵 사용자 증가를 고려하여 공중화장실 중 여성화장실에 월경컵 세척대 설치
- 추진상황
 - 2021.3월 여성공중화장실 안 월경컵 세척대 설치예정지 현장확인
 - 월미도선착장 공중화장실 개축공사 설계변경으로 세척대 설치 지연
- 향후계획
 - 2021년 상반기 월미도선착장 등 공중화장실 6개소에 월경컵세척대 설치예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
사진	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 58
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치	제안자	조*현
부서명	담당자	녹지9급 강원	연락처
			760-7774
추진상황	예산	100,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	5%

□ 개 요

- 위 치 : 백련산 전망대(중구 운서동 산98-11)
- 사업기간 : 2021.3 ~ 2021.6
- 사업내용
 - 백련산 전망대 정비(2층 증설)
- 추진상황
 - 2021. 04. 15. : 백련산 전망대 정비공사 실시설계 용역 준공
 - 2021. 05. 18. : 백련산 전망대 정비공사 착공
- 향후계획
 - 2021. 06. : 백련산 전망대 정비공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 57
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	세계평화의 숲 산책로 가로수 정비			제안자	최*자
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 김유리	연락처	760-7777
추진상황	예산	600,000천원	집행액	247,080천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		80%	

□ 개 요

- 위 치 : 공항신도시 유수지공원 및 완충녹지 1호·2호
- 사업기간 : 2021. 03. 29. ~ 05. 29. (착공일 2021. 03. 31.)
- 사업내용
 - 수목보식 : 왕벚나무 외 3종 460주
 - 지피식재 : 왕수선화 10,630본
 - 생태학습관 소방도로 조성 : 245m
 - 각종 시설물 설치 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 15. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 03. 31. : 사업 착수
 - 2021. 04. 22. : 선급금 지급
- 향후계획
 - 2021. 06. 15. : 사업 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 87
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	예단포항 산책로 입구 계단 설치	제안자	이*배
부서명	도시공원과 담당자	시설8급 문종욱	연락처 760-8848
추진상황	예산	20,000천원	집행액 16,836천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
			○ 100%

□ 개 요

- 위 치 : 운북동 1264
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 4월
- 사업내용
 - 공원 입구 계단 설치 1식
 - 부지정리 및 야자매트 설치 1식
- 추진상황
 - 2021.2월~3월 : 공사 설계
 - 2021. 03. 30. : 공사 착공
 - 2021. 04. 29. : 공사 준공
- 향후계획
 - 상시 유지관리 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 108
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성	제안자	배*희
부서명	도시공원과 담당자	행정6급 이기옥	연락처 760-7781
추진상황	예산	50,000천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
		○	50%

□ 개 요

- 위 치 : 운골녹지연결통로(운서동 3157-3)
운서역 철교 하부 통로(운서동 1427-45)
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 9월
- 사업규모 : 623㎡
- 사업내용 : 벽화작업(도색 등) 및 경관조명 확충을 통한 시설 정비
- 추진상황
 - 2021. 05. 24 : 공사계약
- 향후계획
 - 2021. 06. : 공사착공
 - 2021. 07. : 공사준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
 	 

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 109
------	------------


기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비			제안자	안*숙
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 지호승	연락처	760-7778
추진상황	예산	350,000천원	집행액	85,828천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		24%	

□ 개 요

- 위 치 : 공항신도시 영마루공원
- 사업기간 : 2021. 04. 01. ~ 06. 30. (착공일 2021. 04. 01.)
- 사업내용
 - 시설물공 : 시설물공 : 공연장 기둥보수 1개소, 체력단련시설 17개소, 이동식농구대 3개소, 플랜터 264.4㎡ 등
 - 식재공 : 장미 5종 970주
 - 포장공 : 인조화강설블럭포장 718㎡, 고무칩포장 207.3㎡, 플라스틱바닥포장 282㎡ 등
 - 부대공 : 수목제거 310주, 토사운반 275.7㎡ 및 폐기물처리 1식 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 10. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 04. 01. : 사업 착공
 - 2021. 04. 26. : 선급금 지급
- 향후계획
 - 2021. 06. 30. : 사업 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-114
------	----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	방역취약계층 방문방역 지원 사업			제안자	윤*수
부서명	보건행정과	담당자	의료기술6급 김상덕	연락처	760-6071
추진상황	예산	100,000천원	집행액	34,445천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		34%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 보건행정과
- 사업기간 : 2021. 3. 2 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 대상
 - 300세대 미만의 공동주택과 단독주택 거주
 - 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대,
 - 장애의 정도가 심한 장애인, 65세 이상 홀로 사는 노인세대 등
 - 내용
 - 대상 세대 방문 실내 · 외 방역소독 실시
 - 살균, 살충, 유충구제, 바퀴구제, 개미구제 등
- 추진상황
 - 2021. 3월 ~ 5월 실적 : 263세대
- 향후계획
 - 취약계층 방문방역 사업에 대한 주기적 홍보
 - 거동불편 취약계층 방문 방역 중점 실시 추진
 - 관내 쪽방촌 56세대(인현동, 북성동, 경동·내동) 주기적 방역 실시 추진
 - 지역아동센터, 아동복지시설 지속적 방문방역 실시

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-1(동)
------	-----------



기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	신포역 부근 경관개선 사업			제안자	송*숙
부서명	신포동	담당자	행정민원팀장 임철기	연락처	760-6103
추진상황	예산	25,000천원	집행액	13,860천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		50%	

□ 개 요

- 위 치 : 답동사거리~신포역~신포사거리
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 9월
- 사업내용
 - 답동사거리~신포역 가로등 꽃걸이 17개소 초화 식재
 - 신포역~신포사거리 인도웬스 화분설치 및 초화식재(88m)
- 추진상황
 - 2021.2.24. : 제1차 지역위원회 시 주요 사업내용 선정
 - 2021.3.6. : 사업 추진에 따른 관련부서 검토의견 접수
 - 2021.4.6. : 제3차 지역위원회 시 사업범위와 구체적인 사업내용 선정
 - 2021.4.30. : 조경공사 계약 및 공사 시행
 - 2021.5.21. : 봄 초화 식재 완료
- 향후계획
 - 2021. 8월 중 : 가을 초화 식재

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-2(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	신포로35번길 감나무길 화단 조성사업			제안자	김*유
부서명	신포동	담당자	행정민원팀장 임철기	연락처	760-6103
추진상황	예산	15,000천원	집행액	4,480천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		40%	

□ 개 요

- 위 치 : 신포로35번길
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 감나무 전지작업 및 화단 정리·개보수
- 추진상황
 - 2021.2.24. : 제1차 지역위원회 시 주요 사업내용 선정
 - 2021.3. 6. : 사업 추진에 따른 관련부서 검토의견 접수
 - 2021.3.16. : 제2차 지역위원회 시 사업범위와 구체적인 사업내용 선정
 - 2021.3.25. ~ 3.31. : 감나무 전지작업 및 화단 정리 사업 실시
- 향후계획
 - 2021.6월 중 : 감나무길 화단 개보수
 - 2021.9월 중 : 감나무길 감 수확 행사 실시

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-3(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	자전거 공기펌프기 설치	제안자	김*영
부서명	연안동 담당자	행정7급 김신아	연락처 760-6124
추진상황	예산	5,000천원	집행액 4,840천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
			○ 100%

□ 개 요

- 위 치 : 연안동 행정복지센터 1층
- 사업기간 : 2021. 3월
- 사업내용
 - 자동식 복합형 자전거 공기주입기 설치
- 추진상황
 - 2021. 3. 19. : 계약 체결
 - 2021. 3. 29. : 구입·설치 완료
- 향후계획
 - 2021. 4월 : 자전거공기주입기 설치 홍보

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-4(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	주민자치센터 방수 및 리모델링 공사			제안자	김*원
부서명	신흥동	담당자	행정7급 장진이	연락처	760-6147
추진상황	예산	14,000천원		집행액	13,100천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 주민자치센터(도원로 4)
- 사업기간 : 2021. 4월 中
- 공사내용
 - 실리콘 방수 작업
 - 바닥 교체
 - 벽지 교체
 - 외벽 가림막 설치
- 그동안 추진사항
 - 2021. 4월 : 공사 시행 및 착공
 - 2021. 4월 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-5(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	동 청사(체력단련실, 회의실)방수 공사			제안자	오*영
부서명	신흥동	담당자	행정7급 장진이	연락처	760-6147
추진상황	예산	22,000천원	집행액	20,390천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 행정복지센터(제물량로80번길 3-14) 옥상 등
- 사업기간 : 2021. 4월 초 ~ 5월 초
- 공사내용
 - 바닥, 수직면 바탕면처리
 - 바닥, 수직면 방수프라이머 도포
 - 바닥 3mm 도막 방수 도포
 - 수직면 0.2mm 도막 방수 도포
 - 바닥, 수직면 마감도료(Top-coat) 도포
- 그동안 추진사항
 - 2021. 4월 초 : 공사 착공
 - 2021. 5월 초 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-6(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	도원동 일대 계단 방부목 및 난간 보수			제안자	김*윤
부서명	도원동	담당자	행정7급 염혜란	연락처	760-6164
추진상황	예산	5,000천원		집행액	4,340천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

○ 위 치 : 참외전로244번길 26-1 외 8개소

※ 참외전로244번길 19-10, 도원로30번길 16, 참외전로244번길 30,
도산로 21, 도원로50번길 4-6, 도원로 48, 참외전로244번길 48,
샛골로9번길 53

○ 사업기간 : 2021. 1. 28. ~ 2. 2.

○ 사업내용

－ 노후된 계단 방부목 보수 및 난간 도색

○ 기대효과

－ 주민 통행의 안전성 및 편의성 확보

□ 관련사진 : 불임 참고


사업시행 전




사업시행 후



참외전로244번길 26-1

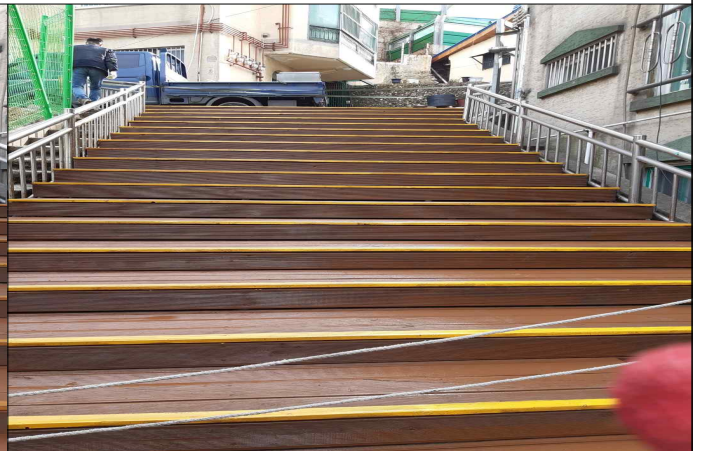

참외전로244번길 19-10

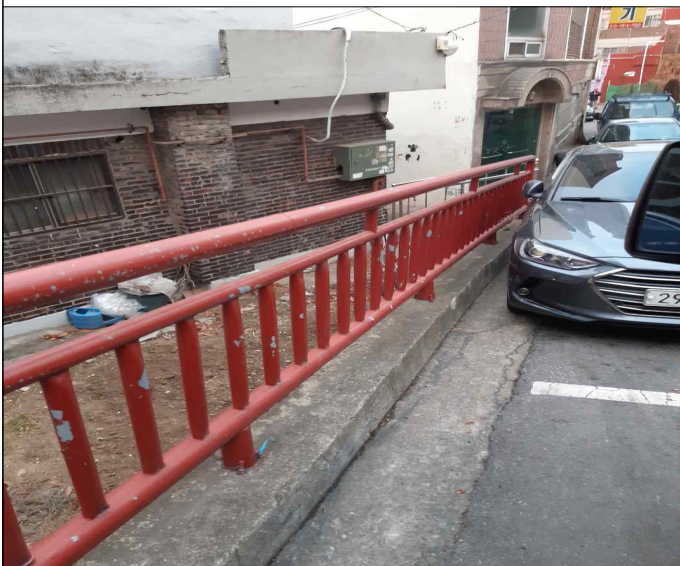

도원로30번길 16



사업시행 전





사업시행 후



참외전로244번길 30

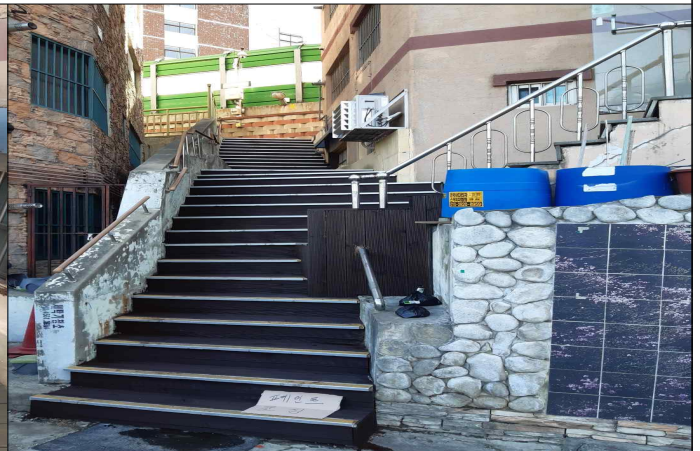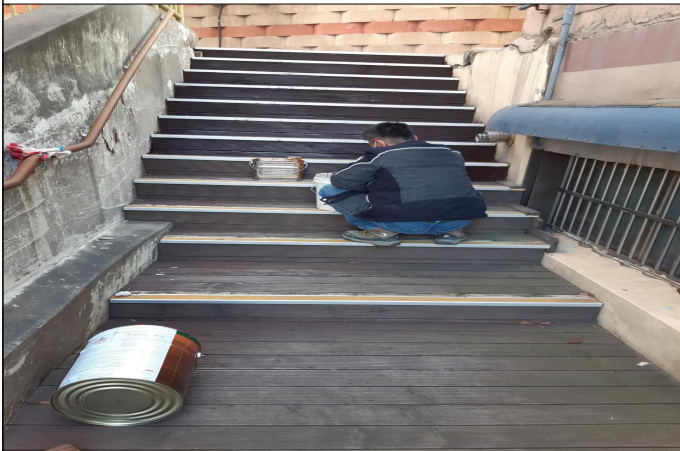


도산로 21

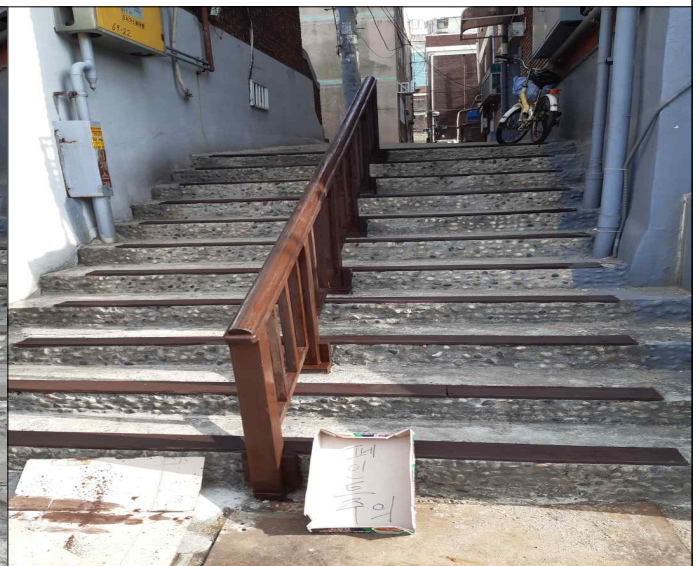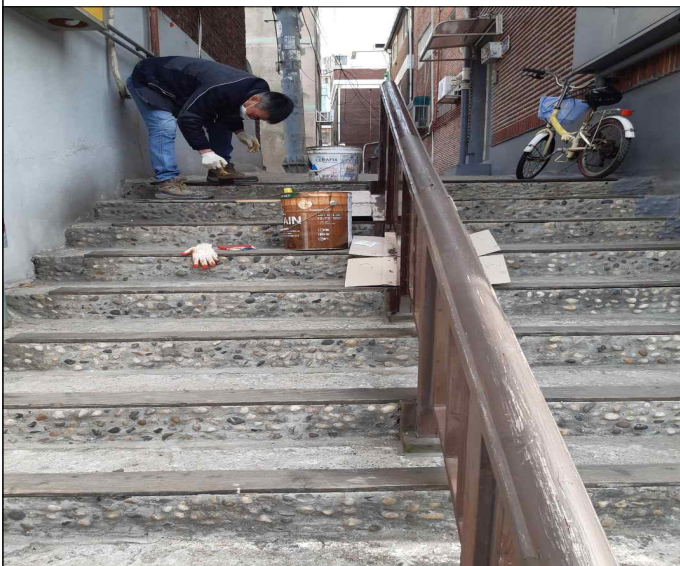


도원로50번길 4-6

사업시행 전

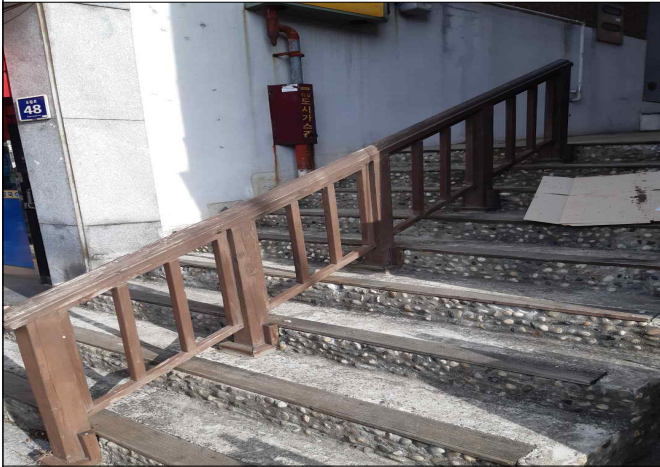

사업시행 후

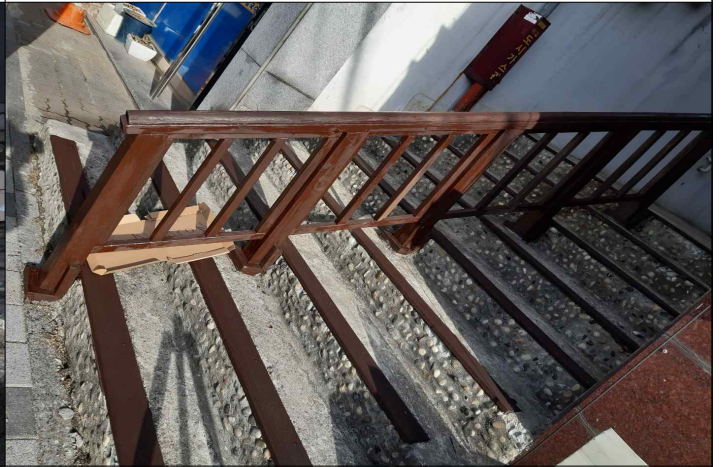

도원로 48



참외전로244번길 48



셋골로9번길 53

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-7(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	장수의자(어르신)의자 설치			제안자	이*훈
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	5,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 서해대로483번길 3 앞 횡단보도 등
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 6월
- 사업의 필요성 및 기대효과
 - 교통약자(노인, 장애인, 임산부)를 위한 대기공간을 제공하여 무단횡단으로 인한 교통사고 방지
 - 율목동 높은 언덕길 요소요소에 설치하여 어르신들이 쉬어갈 수 있는 공간 제공
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터 앞 서대해로 횡단보도 및 율목공원 및 율목동 높은 언덕길에 의자를 설치하여 교통약자 (노인, 장애인, 임산부)를 위한 대기공간을 제공함
- 향후계획
 - 2021. 5월 중 ; 설치대상 확정
 - 2021. 6월 중 : 물품구매 계약 체결 및 의자 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-8(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	율목동 환경개선사업	제안자	이*훈
부서명	율목동 담당자	행정7급 김희준	연락처
			760-6185
추진상황	예산	22,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	0 천원
			추진율
			0%

□ 개 요

- 위 치 : 율목동
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 율목동 노후 벽화 및 담장 도색
 - 율목동 소규모 정비 공사
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 노후 벽화·담장 및 환경정비 대상 발굴 및 확정
- 향후계획
 - 2021. 6월
 - 노후 벽화 및 담장 도색
 - 소규모 환경정비 공사 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-9(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	코로나19 대비 살균소독수 지원	제안자	이*주
부서명	율목동 담당자	행정7급 김희준	연락처
			760-0000
추진상황	예산	10,600천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
			○
			6,523천원
			추진율
			100%

□ 개 요

- 위 치 : 서해대로483번길 3 (율목동 행정복지센터)
- 사업기간 : 2021. 1월 설치완료 (연중 상시 배부)
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터에 미산성 살균소독수 생성장치를 설치해 주민들에게 무료로 제공하여 주민들 및 개인사업주에게 방역을 강화할 수 있는 방안을 제공함과 동시에 경제적인 도움을 주고자 함.
- 추진상황
 - 살균소독수 생성장치 설치 완료
 - 홍보용 물병을 구입하여 소독수를 담아서 홍보용을 제공하고 있음.
- 향후계획
 - 2021년 연중 상시 홍보 및 무료 배부

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-10(동)
------	------------


기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	주민 소통 공간 조성			제안자	윤*수
부서명	동인천동	담당자	행정7급 백연지	연락처	760-6204
추진상황	예산	20,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		10%	

□ 개 요

- 위 치 : 동인천동 행정복지센터 옥상
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 7월
- 사업내용
 - 무대 설치
 - 주민 휴게 공간 조성
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 소통 공간 조성 관련 제안자와 협의
 - 2021. 5월 : 공간 조성 계획 및 업체 선정
- 향후계획
 - 2021. 6월 ~ 7월 : 공사 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<div style="text-align: center; height: 200px;"> <p>사진</p> </div>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-11(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	동인천동 힐링 체험 교육			제안자	윤*수
부서명	동인천동	담당자	행정7급 백연지	연락처	760-6204
추진상황	예산	10,000천원		집행액	0천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
	○				-

□ 개 요

- 위 치 : 동인천동 행정복지센터
- 사업기간 : 2021. 7월 ~ 12월
- 사업내용
 - 우수 사례지 탐방
 - 힐링 체험 교육
 - 주민을 위한 문화프로그램 개설
- 추진상황
 - 코로나 19 확산에 따라 사업 진행이 어려움
- 향후계획
 - 2021. 7월 ~ 12월 : 우수 사례지 탐방
힐링 교육 및 문화프로그램 개설

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-12(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업			제안자	유*길
부서명	북성동	담당자	행정7급 박은예	연락처	760-6224
추진상황	예산	4,000천원	집행액	3,880천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 북성동1가 4-183 부근(북성동 3통 쪽방촌)
- 사업기간 : 2021. 5월
- 사업내용
 - 북성동 3통 쪽방촌 골목길 포장
 - 취약계층 주거지역 환경개선 및 보행안전 확보
- 추진상황
 - 북성동 3통 쪽방촌 골목길 규사 포장
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 주민참여예산사업 모니터링 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-13(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치			제안자	황*욱
부서명	북성동	담당자	행정7급 박은예	연락처	760-6224
추진상황	예산	3,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운로 55번길 19 일원
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 화교중산학교 앞 삼거리 부분 불법주차로 어린이 안전위협 및 주민불편
 - 보행자 및 차량통행에 방해가 되지 않도록 주차금지 시설물 설치
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 공사 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-14(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	차이나타운 경사 개선 사업			제안자	황*한
부서명	북성동	담당자	행정7급 박은예	연락처	760-6224
추진상황	예산	5,000천원	집행액	4,801천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운 경사 골목 일원
- 사업기간 : 2021. 2월
- 사업내용
 - 강우·강설시 관광객 및 보행자 낙상사고 발생 빈번
 - 경사로 개선 사업으로 보행자 안전 확보
- 추진상황
 - 북성동2가 9-7 앞 계단 우측 난간 설치
 - 선린동 41-3 옆 계단 중앙 난간 설치
 - 북성동2가 10-8 북성동행정복지센터 입구 경사로에 난간 설치

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-15(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	북성동 동네부엌 조성 사업			제안자	유*길
부서명	북성동	담당자	행정7급 박은예	연락처	760-6224
추진상황	예산	30,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 미정
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 먹거리를 매개로 이웃간 소통을 활성화하는 마을공동 공간 설치
 - 지역사회 주민들이 자발적으로 소규모 사업을 수행하는 공간으로 사용
- 추진상황
 - 2021. 1월 : 동네부엌 조성 계획 수립 및 공유재산 사용 신청
 - 2021. 2월 : 공유재산 사용 불가 회신
 - 2021. 3월 : 동네부엌 사업장소 재검토
- 향후계획
 - 2021. 4월 ~ 8월 : 동네부엌 조성 장소 확보
 - 2021. 9월 : 동네부엌 공사 시행
 - 2021. 10월 : 동네부엌 운영물품 구입
 - 2021. 11월 : 동네부엌 운영 개시

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-16(동)
------	------------

기준일 : 2021. 3. 31.

사업명	무단횡단 금지대 설치			제안자	강*규
부서명	송월동	담당자	행정7급 송문희	연락처	760-6245
추진상황	예산	20,000천원	집행액	18,130천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 송월아파트 앞 참외전로 일원 도로 160m
- 사업기간 : 2021.3.13.(토)
- 사업내용
 - 송월아파트 앞 도로중앙에 무단횡단 금지대 설치
- 기대효과
 - 무단횡단으로 인한 안전사고 예방 및 감소
- 행정사항 : 시설물 설치 후 교통운수와 사후관리

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-17(동)
------	------------

기준일 : 2021. 3. 31.


사업명	영종1동 소식지 게시판 설치			제안자	영종1동 주민참여예산 지역위원회
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이현정	연락처	760-6364
추진상황	예산	13,000천원	집행액	12,986천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 관내 공동주택 13개소
- 사업기간 : 2021. 4월중
- 사업내용
 - 소식지 게시대를 제작하여 공동주택에 배부하고, 매주 발행하고 있는 영종1동 행정복지센터 소식지를 비치하여 구정 소식을 홍보하고자 함.
- 추진상황
 - 공동주택별 소식지 게시대 배부 완료.

□ 관련사진

사업시행 전

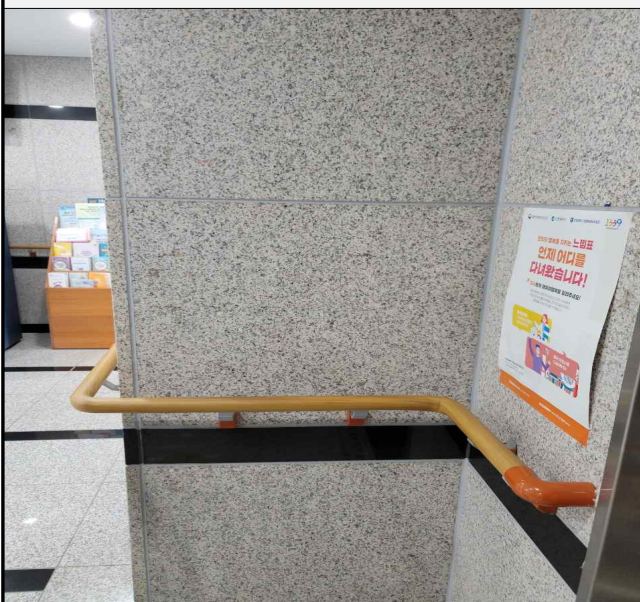

사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-18(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	배움과 나눔(아기자기)	제안자	한*희
부서명	영종1동 담당자	행정8급 이현정	연락처 760-6364
추진상황	예산	27,000천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
	○		0%

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터
- 사업기간 : 2021. 7월~12월 (※ 사회적 거리두기 단계 조정에 따라 유동적 시행)
- 사업내용
 - 영종1동 행정복지센터 내 공유주방 및 프로그램실을 활용하여 다양한 문예교육·취미여가·체험활동을 진행하여 배움과 나눔으로써 활기찬 생활을 영위할 수 있도록 기회를 마련
- 추진상황
 - 시기 미도래로 현재 추진 실적 없음.
- 향후계획
 - 2021. 7월 프로그램 시행 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-19(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	앞마루 공원 정자 정비			제안자	최*자
부서명	운서동	담당자	행정8급 박지상	연락처	760-6257
추진상황	예산	38,000천원		집행액	9,491천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			90%

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 2787-4 앞마루공원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 5월
- 사업내용
 - 철거작업 : 기존 정자 철거 및 나무 이식 작업
 - 신규설치 : 정자, 등받이 의자, 석재장기판 등 설치
- 추진상황
 - 철거작업 완료
 - 신규설치
 1. 석재장기판 설치 완료
 2. 공원안내판 설치 완료
 3. 정자 설치 완료 예정(2021. 6. 1일한)
- 향후계획
 - 공사 준공 후 즉시 대금지급

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-20(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	상습 무단투기지역 꽃씨뿌리기 활동	제안자	김*성
부서명	운서동 담당자	행정8급 박지상	연락처 760-6257
추진상황	예산	2,000천원	집행액 00천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
	○		0%

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 관내 상습 무단투기지역 일원
- 사업기간 :
- 사업내용
 - 상습 무단투기지역 내 꽃씨뿌리기를 통한 무단투기 방지에 기여
- 추진상황
 - 꽃씨뿌리기 대상지(상습무단투기지역) 선정 中
 - 꽃씨뿌리기 활동인원 모집 中
- 향후계획
 - 대상지 선정 및 활동인원 모집 완료 후, 관련 물품을 구입하여 활동 개시

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-21(동)
------	------------

기준일 : 2021. 5. 31.

사업명	마을 공동 부엌 설치	제안자	김*선
부서명	용유동 담당자	행정7급 이미희	연락처 760-6286
추진상황	예산	4,300천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
		○	25%

□ 개 요

- 위 치 : 마시란로 308-13 (용유동 행정복지센터 부지 내)
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 기존 유휴공간을 활용하여 마을 공동 부엌으로 설치·운영
 - 공동 조리실 및 주민 커뮤니티 공간 설치
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 공사 착공
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 공사 준공 및 시설 운영 물품 구입
 - 2021. 6월 : 마을 공동 부엌 운영 계획 수립 및 주민 홍보
 - 2021. 7월 : 마을 공동 부엌 운영 개시

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	
