

2021년도 예산 반영, 주민참여예산 사업 현황

(2021. 7.31. 기준, 단위 : 천원)

| 연번 | 사업부서 (사업위치) | 사업명 | 사업비 | 집행액 | 추진상황 | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| | | | | | 시기 미도래 | 추진중 | 추진 완료 |
| | 총 계 | 총 43건 | 2,540,100 | 1,819,369 | 4 | 10 | 29 |
| 1 | 홍보체육실 (영종동) | 백운로228번길 방법용 CCTV 설치 | 150,000 | 135,324 | | | ○ |
| 2 | 문화관광과 (북성동) | 차이나타운 디자인 계단 사업 | 170,000 | 0 | | ○ | |
| 3 | 문화관광과 (신포동) | 월드커뮤니티센터 관광안내 홍보관 설치 | 15,000 | 12,946 | | | ○ |
| 4 | 어르신 장애인과 | 장애인 친화도시 ‘ALL IN ONE’ 프로젝트 | 10,000 | 5,822 | | ○ | |
| 5 | 건설과 (북성동) | 제물량로 일원 보안등 설치 사 업 | 13,000 | 13,000 | | | ○ |
| 6 | 건설과 (신포, 동인천, 신항) | 긴 담모퉁이길 및 홍예문 축대 안전진단용역 | 20,000 | 19,604 | | | ○ |
| 7 | 건설과 (동인천) | 보도블럭 정비 및 안전휰스 설치 | 72,000 | 16,445 | | | ○ |
| 8 | 건설과 (중구) | 장애인을 위한 점자 보도블럭 정비 | 150,000 | 0 | | ○ | |
| 9 | 건설과 (신포동) | 칼국수 골목 일원 보행환경 개선 | 60,000 | 41,000 | | | ○ |
| 10 | 도시개발과 (신포동) | 답동쉼터 시계조형물 정비 | 25,000 | 0 | ○ | | |
| 11 | 도시개발과 (동인천동) | 홍예문로 꽃 터널 길 조성 | 75,000 | 62,496 | | | ○ |
| 12 | 교통운수과 (신포동) | 홍예문로 교차로내 태양광 도로 표지병 설치 | 5,000 | 4,889 | | | ○ |
| 13 | 교통운수과 (중구) | 어린이보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치 | 100,000 | 97,850 | | | ○ |
| 14 | 교통운수과 / 교통과 (중구) | 버스승강장 냉방 편의시설 설치 | 73,500 | 22,632 | | ○ | |
| 15 | 환경보호과 (운서동) | 넙디 내 상습 무단투기지역 CCTV 설치 | 40,000 | 39,814 | | | ○ |
| 16 | 환경보호과 (중구) | 공중화장실 세척대 설치 사업 | 3,000 | 2,814 | | | ○ |
| 17 | 도시공원과 (운서동) | 백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치 | 100,000 | 95,408 | | | ○ |
| 18 | 도시공원과 (운서동) | 세계평화의 숲 산책로 가로수 정비 | 600,000 | 577,599 | | | ○ |
| 19 | 도시공원과 (영종동) | 예단포항 산책로 입구 계단 설치 | 20,000 | 16,836 | | | ○ |
| 20 | 도시공원과 (영종국제도 시) | 인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성 | 50,000 | 50,000 | | | ○ |

| 연번 | 사업부서 (사업위치) | 사업명 | 사업비 | 집행액 | 추진상황 | | |
|----|----------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-----|----------|
| | | | | | 시기 미도래 | 추진중 | 추진 완료 |
| 21 | 도시공원과 (운서동) | 영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비 | 350,000 | 333,782 | | | ○ |
| 22 | 보건행정과 (중구) | 방역취약계층 방문방역 지원 사업 | 100,000 | 61,335 | | ○ | |
| 23 | 신포동 | 신포역 부근 경관개선사업 | 25,000 | 15,840 | | ○ | |
| 24 | 신포동 | 신포로35번길 감나무길 화단 조성사업 | 15,000 | 4,480 | | ○ | |
| 25 | 연안동 | 자전거 공기펌프기 설치 | 5,000 | 4,840 | | | ○ |
| 26 | 신흥동 | 주민자치센터 방수 및 리모델링 공사 | 14,000 | 13,100 | | | ○ |
| 27 | 신흥동 | 동 청사(체력단련실, 회의실) 방수 공사 | 22,000 | 20,390 | | | ○ |
| 28 | 도원동 | 도원동 일대 계단 방부목 및 난간 보수 | 5,000 | 4,340 | | | ○ |
| 29 | 율목동 | 장수의재(어르신일자) 설치 | 5,000 | 4,958 | | | ○ |
| 30 | 율목동 | 율목동 환경개선사업 | 22,000 | 18,588 | | | ○ |
| 31 | 율목동 | 코로나 19 대비 살균 소독수 지원 | 10,600 | 6,523 | | | ○ |
| 32 | 동인천동 | 주민 소통 공간 조성 | 20,000 | 0 | | ○ | |
| 33 | 동인천동 | 동인천동 힐링 체험 교육 | 10,000 | 0 | ○ | | |
| 34 | 개항동 | 북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업 | 4,000 | 3,880 | | | ○ |
| 35 | 개항동 | 삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치 | 3,000 | 2,940 | | | ○ |
| 36 | 개항동 | 차이나타운 경사 개선 사업 | 5,000 | 4,801 | | | ○ |
| 37 | 개항동 | 북성동 동네부엌 조성 사업 | 30,000 | 0 | | ○ | |
| 38 | 개항동 | 무단횡단금지대 설치 | 20,000 | 18,130 | | | ○ |
| 39 | 영종1동 | 영종1동 소식지 게시판 설치 | 13,000 | 12,986 | | | ○ |
| 40 | 영종1동 | 배움과 나눔(아기자기) | 27,000 | 0 | ○ | | |
| 41 | 운서동 | 앞마루 공원 정자 정비 | 38,000 | 35,841 | | | ○ |
| 42 | 운서동 | 상습 무단투기지역 꽃씨뿌리기 활동 | 2,000 | 0 | ○ | | |
| 43 | 용유동 | 마을 공동 부엌 설치 | 43,000 | 38,136 | | ○ | |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-18 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 사업명 | 백운로228번길 방범용 CCTV 설치 | | | 제안자 | 김*호 |
| 부서명 | | 담당자 | 방송통신7급 전명지 | 연락처 | 760-7102 |
| 추진상황 | 예산 | 150,000천원 | 집행액 | 135,324천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 백운로228번길 외 12개소
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 주민참여예산 제안자 의견을 반영하여 영종역2번 출구 ~ 백운로228번길 논골마을 일대 방범 사각지대에 대해 CCTV 설치
 - 설치 시 200만 화소 회전형 및 고정형 카메라, IP비상벨 설치
- 추진상황
 - 2021. 2월 : 주민참여예산 주민의견 청취 및 현장실사
 - 2021. 2월 : 일상감사, 계약심사 의뢰
 - 2021. 3월 4일 : 행정예고 시행(21일)
 - 2021. 4월 19일 : 2021년 방범용 CCTV 설치공사 착공
 - 2021. 6월 17일 : 2021년 방범용 CCTV 설치공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-38 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|
| 사업명 | 차이나타운 디자인 계단 사업 | 제안자 | 장*훈 |
| 부서명 | 문화관광과 담당자 | 시설9급 최정현 | 연락처 |
| | | | 760-6452 |
| 추진상황 | 예산 | 170,000천원 | 집행액 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 |
| | | ○ | 20% |

□ 개요

- 위 치 : 선린문 계단 일원
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 차이나타운 선린문 계단을 특색있는 계단으로 재정비

□ 그동안 추진사항

- 2021. 2. 4 : 용역 발주
- 2021. 2. 19 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. 19 : 용역 중지(주민의견 수렴)
- 2021. 5. 20 : 주민참여예산 제안자 설명(1차)
- 2021. 7월 말 : 주민참여예산 제안자 설명(2차)

□ 향후계획

- 2021. 8월 : 용역 재개
- 2021. 9월 : 공사 시행

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--------|
|  | |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|----------|
| 접수번호 | 2020-112 |
|------|----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|----------------------|----------|----------|
| 사업명 | 월드커뮤니티센터 관광안내 홍보판 설치 | 제안자 | 류*근 |
| 부서명 | 문화관광과 담당자 | 행정7급 정해원 | 연락처 |
| | | | 760-6477 |
| 추진상황 | 예산 | 15,000천원 | 집행액 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 |
| | | | ○ |
| | | | 12,946천원 |
| | | | 추진율 |
| | | | 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 월드커뮤니티센터 내(중구 제물량로 232번길 26)
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 관광 포스터 등 안내물 게시대 및 주변 주요관광지의 안내지도가 포함 된 다기능 홍보판 설치
 - 월드커뮤니티센터 내 관광안내 홍보판을 신규 설치하여 홍보 기능강화

□ 추진사항

- 2021. 4. 23 : 관광안내 홍보판 제작·설치 계획 수립
- 2021. 5. 11 : 관광안내 홍보판 제작·설치 물품 계약 체결
- 2021. 5. 31 : 관광안내 홍보판 제작 및 설치

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">사진 별첨</p> |

사업 시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-16 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------------------|----------|-------------|---------|----------|
| 사업명 | 장애인 친화도시 'ALL IN ONE' 프로젝트 | | | 제안자 | 방*혁 |
| 부서명 | 어르신장애인과 | 담당자 | 사회복지 7급 정지현 | 연락처 | 760-7317 |
| 추진상황 | 예산 | 10,000천원 | 집행액 | 5,822천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 58% | |

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 매소홀로 10 인천중구장애인종합복지관
- 사업기간 : 2021년 2월 ~ 12월
- 사업내용
 1. AAC(보완대체 의사소통) 환경 조성으로 장애인의 의사소통 접근성 강화
 2. 지역사회 활동가 양성으로 장애인의 긍정적인 인식개선 효과 도모
- 추진상황
 1. AAC(보완대체 의사소통) 관련 1,2,3차 직원 교육 실시
 - 1,2차 교육은 코로나19 방역수칙에 따라 실시간 화상시스템 줌(ZOOM)으로 진행
 - 3차 교육은 10인 이내 대면 교육으로 진행
 2. 복지관 내 AAC(보완대체 의사소통) 환경 조성 완료
 - 복지관 사업안내판, 시각지원판 제작
 - 복지관 명판, 안내판 등 AAC 디자인 수정 및 시공
 3. 지역사회 활동가 모집
 - 복지관 및 자원봉사센터 등 유관기관 협조 요청
- 향후계획
 1. 장애인식개선 캠페인 준비
 2. 지역사회 활동가 모집
 3. 장애인 편의시설 교육 준비 및 관련 안내문 제작

□ 관련사진

| | |
|---|--|
| 사업시행 전(복지관 안내판) | 사업시행 중(복지관 안내판) |
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-52 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 제물량로 일원 보안등 정비공사 | | | 제안자 | 조*경 |
| 부서명 | 건설과 | 담당자 | 공업9급 나원영 | 연락처 | 760-7833 |
| 추진상황 | 예산 | 13,000천원 | 집행액 | 13,000천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 제물량로 일원(제물량로 로터리~인천역 사거리)
- 사업기간 : 3월(착공일로부터 28일간)
- 사업내용
 - 보안등 신설 4본
 - LED 로고조명 설치 7개소
- 추진상황
 - 보안등 신설 4본, LED 로고조명 7개소 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-95 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------------------|----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 긴 담모퉁이길 및 홍예문 축대 안전진단 용역 | | | 제안자 | 조*원 |
| 부서명 | 건설과 | 담당자 | 시설9급 이강산 | 연락처 | 760-7454 |
| 추진상황 | 예산 | 20,000천원 | | 집행액 | 19,604천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | | 완 료 | 추진율 |
| | | | | ○ | 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 송학동3가8 일원 외 1개소
- 사업기간 : 2021.3. ~ 2021.5.
- 사업내용
 - 홍예문 및 긴담모퉁이길 석축 정밀안전점검 용역
 - 석축의 구조적인 결함의 유무를 확인하여 향후 점검 및 유지관리에 활용
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 정밀안전점검 용역 착수
 - 2021. 5월 : 정밀안전점검 용역 준공
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 결과보고회 개최 및 건의자에게 결과알림

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2018 - 72 |
|------|-----------|


기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 사업명 | 보도블럭 정비 및 안전횡스 설치(큰우물로 일대) | | | 제안자 | 동인천동 주민자치위원회 |
| 부서명 | 건설과 | 담당자 | 시설9급 정예준 | 연락처 | 760-7456 |
| 추진상황 | 예산 | 72,000천원 | 집행액 | 16,445천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 큰우물로 일원 (길병원 ~ 예지요양병원 앞)
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 7월
- 사업내용
 - 보도블럭 정비 (L = 159M, B = 2M)
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 제안자 의견 확인 및 현장점검
 - 2021. 4월 : 동인천동 행정복지센터 및 주민자치위원회 의견수렴
 - 2021. 4월 : 설계도서 작성 및 착공
 - 2021. 05. 03. : 동인천동 주민자치위원회와 보도 패턴협의
 - 2021. 05. 24. : 큰우물로 일원 보도정비공사 착공
 - 2021. 07. 05. : 큰우물로 일원 보도정비공사 준공

□ 관련사진

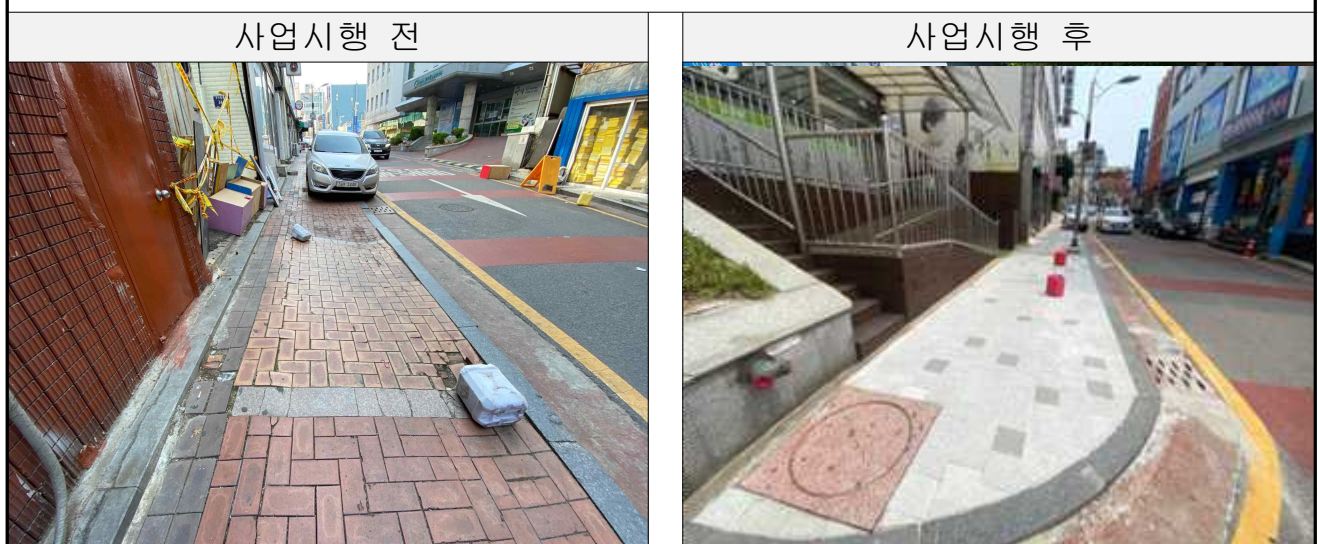

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-39 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------------|-----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 장애인을 위한 점자 보도블럭 정비 | | | 제안자 | 이*배 |
| 부서명 | 건설과 | 담당자 | 시설8급 이강산 | 연락처 | 760-7454 |
| 추진상황 | 예산 | 150,000천원 | 집행액 | - | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 30% | |

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 일원(영종·용유 제외)
 - 인천역~중부경찰서 일원
 - 관내 부적정 설치구간 정비 등
- 사업기간 : 2021.5 ~ 2021.9
- 사업내용
 - 점자블록 미설치 구간 신규설치 및 부적정 설치구간 정비
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 계약의뢰
 - 2021. 6월 : 공사착공
- 향후계획
 - 2021. 9월 : 공사준공

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|----------|
| 접수번호 | 2020-111 |
|------|----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 사업명 | 칼국수 골목 일원 보행환경 개선 | | | 제안자 | 윤*정 |
| 부서명 | 건설과 | 담당자 | 시설8급 이주영, 공업9급 나원영 | 연락처 | 760-7455 |
| 추진상황 | 예산 | 60,000천원 | 집행액 | 41,000천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 중구 신포동 61번지 일원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 7월
- 사업내용
 - 토목 : 보도블럭 정비 (L=200, B=2~3m)
 - 전기 : LED 보안등(80W) 신설(4개소), LED 보안등(80W) 교체(10개소)
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 제안자 의견 및 현장 확인
 - 2021. 5월 : 토목 (보도블럭 정비 완료)
 - 2021. 7월 : 전기 (보안등 정비 완료)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2019-80 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|---------------|----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 답동쉼터 시계조형물 정비 | | | 제안자 | 김*애 |
| 부서명 | 도시개발과 | 담당자 | 녹지7급 박석준 | 연락처 | 760-7582 |
| 추진상황 | 예산 | 25,000천원 | 집행액 | 0천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | ○ | | | 0% | |

□ 개 요

- 위 치 : 답동 18-5(답동쉼터)
- 사업기간 : 미정
- 사업내용
 - 답동쉼터 시계탑 설치 1식
 - 기존시계탑 철거 및 폐기물 처리 1식
- 추진상황
 - 市에서 추진하는 「신포지하공공보도 연장 복합센터 사업」에 답동쉼터가 포함됨에 따라, 사업 세부내용에 관한 별도 협의 필요
 - 사업제안자에게 市추진사업방향에 대하여 설명하였으며, 답동쉼터 시계조형물 정비사업 잠정중단에 대하여 안내하고 의견 청취
- 향후계획
 - 市추진 사업에 답동쉼터 반영예정임에 따라, 시계탑 설치를 포함한 주민건의 사항 반영 협의 예정(주민참여예산 미집행 및 불용처분)

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--------|
|  | |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-74 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 홍예문로 꽃 터널 길 조성 | | | 제안자 | 윤*수 |
| 부서명 | 도시개발과 | 담당자 | 녹지7급 박석준 | 연락처 | 760-7582 |
| 추진상황 | 예산 | 75,000천원 | 집행액 | 62,496천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 전동 2-4(동인천동 쉼터) 일원
- 사업기간 : 2021. 5. 14. ~ 2021. 6. 22.
- 사업내용
 - 장미터널(16개소) 설치 및 장미(320주) 식재
 - 플랜터 212.1m 설치, 꽃잔디 2,170본 식재, 기존수목 560주 이식 등
- 추진상황
 - '21.02.04. ~ '21.04.08. : 실시설계용역 완료
 - '21.05.14. : 공사 착공
 - '21.06.22. : 공사 준공
 - '21.07.07. : 주민참여예산 현장 모니터링 실시
- 향후계획
 - '21.08. ~ : 쉼터 수목 및 시설물 관리 실시

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-75 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 07. 31.

| | | | | | |
|------|-------------------------|---------|----------|---------|----------|
| 사업명 | 홍예문로 교차로내 태양광 도로 표지병 설치 | | | 제안자 | 김*섭 |
| 부서명 | 교통운수과 | 담당자 | 시설9급 강희엽 | 연락처 | 760-7682 |
| 추진상황 | 예산 | 5,000천원 | 집행액 | 4,889천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

○ 위 치 : 홍예문로 교차로

○ 사업기간 : 시기 미도래

○ 사업내용

– 홍예문로 교차로 내 태양광 표지병 34개 설치

○ 추진상황

– 2021. 05. 12. 홍예문로 교차로 내 도로표지병 구입·설치 시행

– 2021. 05. 12. 홍예문로 교차로 내 도로표지병 구입·설치 물품 계약의뢰

– 2021. 05. 24. 준공

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-36 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 07. 31.

| | | | |
|------|-------------------------|-----------|--------------|
| 사업명 | 어린이 보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치 | 제안자 | 이*문 이*린 |
| 부서명 | 교통운수과 담당자 | 시설9급 강희엽 | 연락처 760-7682 |
| 추진상황 | 예산 | 100,000천원 | 집행액 97,850천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 추진율 |
| | | | ○ 100% |

□ 개 요

○ 위 치

- 신흥동3가 7-207(인하대병원 앞) 약 420m 구간
- 신흥동3가 30(중구장애인 복지관 앞) 약 190m 구간
- 향동7가 27-106(연안초등학교 앞) 약 130m 구간
- 신흥동3가 28-2(신광초등학교 앞) 약 160m 구간
- 신흥동3가 56(삼익아파트 앞) 약 140m구간

○ 사업기간 : 2021. 02. 18. ~ 2021. 03. 05.

□ 관련사진

| 구분 | 시공 전 | 시공 후 |
|----------------|---|--|
| 신흥동3가 7-207 |  |  |
| 신선초등 학교 |  |  |

| 구분 | 시공 전 | 시공 후 |
|---------------------------|---|--|
| <p>항 동 7 가 27-106</p> |  |  |
| <p>신 흥 동 3 가 28-2</p> |  |  |
| <p>신 흥 동 3 가 56</p> |  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-37 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 사업명 | 버스승강장 냉방 편의시설 설치 | | | 제안자 | 김*기 |
| 부서명 | 교통운수과 교통과 | 담당자 | 행정7급 오상미 행정6급 조윤진 | 연락처 | 760-7572 760-7752 |
| 추진상황 | 예산 | 73,500천원 | 집행액 | 22,632천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 31% | |

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 버스승강장 내
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월
- 사업내용
 - 버스승강장 내 에어컨(송풍기) 설치
- 추진상황
 - (원도심) 2021. 4월 : 에어컨(송풍기) 설치 대상지 검토
2021. 5월 : 전기공사 현지 실사
2021. 6월 : 계약 의뢰
2021. 7월 : 설치완료
 - (영 중) 2021. 4월 : 에어컨(송풍기) 설치 대상지 검토
2021. 5월 : 전기 굴착허가 신청 및 도로관리심의회 개최
- 향후계획
 - (영 중) 2021. 8월 : 냉방편의시설 설치 완료

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-99 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 넙디 내 상습 무단투기지역 CCTV 설치 | | | 제안자 | 장*애 |
| 부서명 | 환경보호과 | 담당자 | 행정8급 정기영 | 연락처 | 760-7416 |
| 추진상황 | 예산 | 40,000천원 | 집행액 | 39,814천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 넙디 등 환경취약지역
- 사업기간 : 2021년 4월~5월 중
- 사업내용
 - 환경취약지역에 무단투기 단속을 위한 CCTV 10개 설치
- 추진상황
 - 2021.3. : CCTV 설치 지역 선정
 - 2021.3. : CCTV 설치 계획 수립
 - 2021.4. : CCTV 설치에 따른 행정예고 실시
 - 2021.5. : CCTV 설치
- 향후계획
 - CCTV 운용 및 단속 철저

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

설치 사진



인천광역시 중구 해안동2가 9-5

설치 사진



인천광역시 중구 신생동 2-22



인천광역시 중구 사동 30-58



인천광역시 중구 답동 35-16



인천광역시 중구 선화동 28-2



인천광역시 중구 운북동 779-27

설치 사진



인천광역시 중구 운서동 2893-4

설치 사진



인천광역시 중구 운서동 2889-15



인천광역시 중구 운남동 1719-39



인천광역시 중구 운서동 2854-6

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2019-60 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| 사업명 | 공중화장실 세척대 설치 사업 | | | 제안자 | 김*애 |
| 부서명 | 환경보호과 | 담당자 | 환경7급 임 슬 | 연락처 | 760-7218 |
| 추진상황 | 예산 | 3,000천원 | 집행액 | 2,814천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 신흥시장, 인천종합어시장 공중화장실 (2개소)
- 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업내용
 - 소요예산 : 1,407,000원 * 2개소 = 2,814,000원
 - 2021년 市 주민참여예산 제안사업
 - 재활용이 가능하고 위생안전성이 높은 월경컵 사용자 증가를 고려하여 공중화장실 중 여성화장실에 월경컵 세척대 설치
- 추진상황
 - 2021.6.18. 신흥시장, 인천종합어시장의 여성공중화장실 안 월경컵 세척대 및 전기온수기 설치
 - 2021.7.12. 월경컵 세척대 안내판 설치
- 향후계획
 - 월경컵세척대를 편리하게 사용할 수 있도록 지속적 관리

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-58 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|---------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| 사업명 | 백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치 | | | 제안자 | 조*현 |
| 부서명 | | 담당자 | 녹지9급 강원 | 연락처 | 760-7774 |
| 추진상황 | 예산 | 100,000천원 | 집행액 | 95,408천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 95.4% | |

□ 개 요

- 위 치 : 백련산 전망대(중구 운서동 산98-11)
- 사업기간 : 2021. 5. 18. ~ 2021. 6. 28.
- 사업내용
 - 백련산 전망대 정비(2층 증설)
- 추진상황
 - 2021. 4. 15. : 백련산 전망대 정비공사 실시설계 용역 준공
 - 2021. 5. 18. : 백련산 전망대 정비공사 착공
 - 2021. 6. 28. : 백련산 전망대 정비공사 준공

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|---------|
| 접수번호 | 2020-57 |
|------|---------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 사업명 | 세계평화의 숲 산책로 가로수 정비 | | | 제안자 | 최*자 |
| 부서명 | 도시공원과 | 담당자 | 녹지7급 김유리 | 연락처 | 760-7777 |
| 추진상황 | 예산 | 600,000천원 | 집행액 | 577,599천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 공항신도시 유수지공원 및 완충녹지 1호·2호
- 사업기간 : 2021. 03. 29. ~ 06. 15. (착공일 2021. 03. 31.)
- 사업내용
 - 수목보식 : 왕벚나무 외 3종 515주
 - 지피식재 : 무늬옥잠화 외 5종 28,902본
 - 생태학습관 소방도로 조성 : 245m
 - 각종 시설물 설치 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 15. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 03. 31. : 사업 착수
 - 2021. 06. 15. : 사업 준공
- 향후계획
 - 사업대상지 수목 및 시설물 유지관리 철저

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020 - 87 |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|-------------------|----------|--------------|
| 사업명 | 예단포항 산책로 입구 계단 설치 | 제안자 | 이*배 |
| 부서명 | 도시공원과 담당자 | 시설8급 문종욱 | 연락처 760-8848 |
| 추진상황 | 예산 | 20,000천원 | 집행액 16,836천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 추진율 |
| | | | ○ 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 운북동 1264
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 4월
- 사업내용
 - 공원 입구 계단 설치 1식
 - 부지정리 및 야자매트 설치 1식
- 추진상황
 - 2021.2월~3월 : 공사 설계
 - 2021. 03. 30. : 공사 착공
 - 2021. 04. 29. : 공사 준공
- 향후계획
 - 상시 유지관리 예정

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|----------|
| 접수번호 | 2020-108 |
|------|----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성 | | | 제안자 | 배*희 |
| 부서명 | 도시공원과 | 담당자 | 행정6급 이기옥 | 연락처 | 760-7781 |
| 추진상황 | 예산 | 50,000천원 | 집행액 | 50,000천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 운골녹지연결통로(운서동 3157-3)
운서역 철교 하부 통로(운서동 1427-45)
- 사업기간 : 2021. 4. ~2021. 7.
- 사업규모 : 623㎡
- 사업내용 : 벽화작업(도색 등) 및 경관조명 확충을 통한 시설 정비
- 추진상황
 - 2021. 5. 24 : 공사계약
 - 2021. 5. 24 : 공사착공
 - 2021. 6. 23 : 공사준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|----------|
| 접수번호 | 2020-109 |
|------|----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|-------------------------|-----------|---------------|
| 사업명 | 영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비 | 제안자 | 안*숙 |
| 부서명 | 도시공원과 담당자 | 녹지8급 지호승 | 연락처 760-7778 |
| 추진상황 | 예산 | 350,000천원 | 집행액 333,782천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 추진율 |
| | | | ○ 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 공향신도시 영마루공원
- 사업기간 : 2021. 04. 01. ~ 06. 21. (착공일 2021. 04. 01.)
- 사업내용
 - 시설물공 : 시설물공 : 공연장 기둥보수 1개소, 체력단련시설 19개소, 이동식농구대 3개소, 플랜터 264.4㎡ 등
 - 식재공 : 장미 5종 990주
 - 포장공 : 인조화강설블록포장 718㎡, 고무칩포장 207.3㎡, 플라스틱바닥포장 282㎡ 등
 - 부대공 : 수목제거 310주, 토사운반 275.7㎡ 및 폐기물처리 1식 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 10. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 04. 01. : 사업 착공
 - 2021. 04. 26. : 선급금 지급
 - 2021. 06. 21. : 사업 준공
- 향후계획
 - 사업대상지 수목 및 시설물 유지관리 철저

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|----------|
| 접수번호 | 2020-114 |
|------|----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|------------|----------|----------|
| 사업명 | 방역취약계층 방문방역 지원 사업 | | | 제안자 | 윤*수 |
| 부서명 | 보건행정과 | 담당자 | 의료기술6급 김상덕 | 연락처 | 760-6071 |
| 추진상황 | 예산 | 100,000천원 | 집행액 | 61,335천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 61% | |

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 보건행정과
- 사업기간 : 2021. 3. 2 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 대상
 - 300세대 미만의 공동주택과 단독주택 거주
 - 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대,
 - 장애의 정도가 심한 장애인, 65세 이상 홀로 사는 노인세대 등
 - 내용
 - 대상 세대 방문 실내 · 외 방역소독 실시
 - 살균, 살충, 유충구제, 바퀴구제, 개미구제 등
- 추진상황
 - 2021. 3월 ~ 7월 실적 : 472세대
- 향후계획
 - 취약계층 방문방역 사업에 대한 주기적 홍보
 - 거동불편 취약계층 방문 방역 중점 실시 추진
 - 관내 쪽방촌 56세대(인현동, 북성동, 경동·내동) 주기적 방역 실시 추진
 - 지역아동센터, 아동복지시설 지속적 방문방역 실시

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-1(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------|----------|------------|----------|----------|
| 사업명 | 신포역 부근 경관개선 사업 | | | 제안자 | 송*숙 |
| 부서명 | 신포동 | 담당자 | 행정민원팀장 임철기 | 연락처 | 760-6103 |
| 추진상황 | 예산 | 25,000천원 | 집행액 | 15,840천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 63% | |

□ 개 요

- 위 치 : 답동사거리~신포역~신포사거리
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 9월
- 사업내용
 - 답동사거리~신포역 가로등 꽃걸이 17개소 초화 식재
 - 신포역~신포사거리 인도웬스 화분설치 및 초화식재(88m)
- 추진상황
 - 2021.2.24. : 제1차 지역위원회 시 주요 사업내용 선정
 - 2021.3.6. : 사업 추진에 따른 관련부서 검토의견 접수
 - 2021.4.6. : 제3차 지역위원회 시 사업범위와 구체적인 사업내용 선정
 - 2021.4.30. : 조경공사 계약 및 공사 시행
 - 2021.5.21. : 봄 초화 식재 완료
 - 2021.5.31. : 기성대가 지급(13,860천원)
 - 2021.6.29. : 초화 화분 관수작업 용역비용 지출
- 향후계획
 - 2021. 8월 중 : 가을 초화 식재

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-2(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------------|----------|------------|-----|----------|
| 사업명 | 신포로35번길 감나무길 화단 조성사업 | | | 제안자 | 김*유 |
| 부서명 | 신포동 | 담당자 | 행정민원팀장 임철기 | 연락처 | 760-6103 |
| 추진상황 | 예산 | 15,000천원 | | 집행액 | 4,480천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | | 완 료 | 추진율 |
| | | ○ | | | 40% |

□ 개 요

- 위 치 : 신포로35번길
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 감나무 전지작업 및 화단 정리·개보수
- 추진상황
 - 2021.2.24. : 제1차 지역위원회 시 주요 사업내용 선정
 - 2021.3. 6. : 사업 추진에 따른 관련부서 검토의견 접수
 - 2021.3.16. : 제2차 지역위원회 시 사업범위와 구체적인 사업내용 선정
 - 2021.3.25. ~ 3.31. : 감나무 전지작업 및 화단 정리 사업 실시
- 향후계획
 - 2021.6월 중 : 감나무길 화단 개보수
 - 2021.9월 중 : 감나무길 감 수확 행사 실시

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-3(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------|---------|----------|---------|----------|
| 사업명 | 자전거 공기펌프기 설치 | | | 제안자 | 김*영 |
| 부서명 | 연안동 | 담당자 | 행정7급 김신아 | 연락처 | 760-6124 |
| 추진상황 | 예산 | 5,000천원 | 집행액 | 4,840천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 연안동 행정복지센터 1층
- 사업기간 : 2021. 3월
- 사업내용
 - 자동식 복합형 자전거 공기주입기 설치
- 추진상황
 - 2021. 3. 19. : 계약 체결
 - 2021. 3. 29. : 구입·설치 완료
- 향후계획
 - 2021. 4월 : 자전거공기주입기 설치 홍보

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-4(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 주민자치센터 방수 및 리모델링 공사 | | | 제안자 | 김*원 |
| 부서명 | 신흥동 | 담당자 | 행정7급 장진이 | 연락처 | 760-6147 |
| 추진상황 | 예산 | 14,000천원 | 집행액 | 13,100천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 주민자치센터(도원로 4)
- 사업기간 : 2021. 4월 中
- 공사내용
 - 실리콘 방수 작업
 - 바닥 교체
 - 벽지 교체
 - 외벽 가림막 설치
- 그동안 추진사항
 - 2021. 4월 : 공사 시행 및 착공
 - 2021. 4월 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-5(동) |
|------|-----------|


기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|-----------------------|----------|--------------|
| 사업명 | 동 청사(체력단련실, 회의실)방수 공사 | 제안자 | 오*영 |
| 부서명 | 신흥동 담당자 | 행정7급 장진이 | 연락처 760-6147 |
| 추진상황 | 예산 | 22,000천원 | 집행액 20,390천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 추진율 |
| | | | ○ 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 행정복지센터(제물량로80번길 3-14) 옥상 등
- 사업기간 : 2021. 4월 초 ~ 5월 초
- 공사내용
 - 바닥, 수직면 바탕면처리
 - 바닥, 수직면 방수프라이머 도포
 - 바닥 3mm 도막 방수 도포
 - 수직면 0.2mm 도막 방수 도포
 - 바닥, 수직면 마감도료(Top-coat) 도포
- 그동안 추진사항
 - 2021. 4월 초 : 공사 착공
 - 2021. 5월 초 : 공사 준공

□ 관련사진

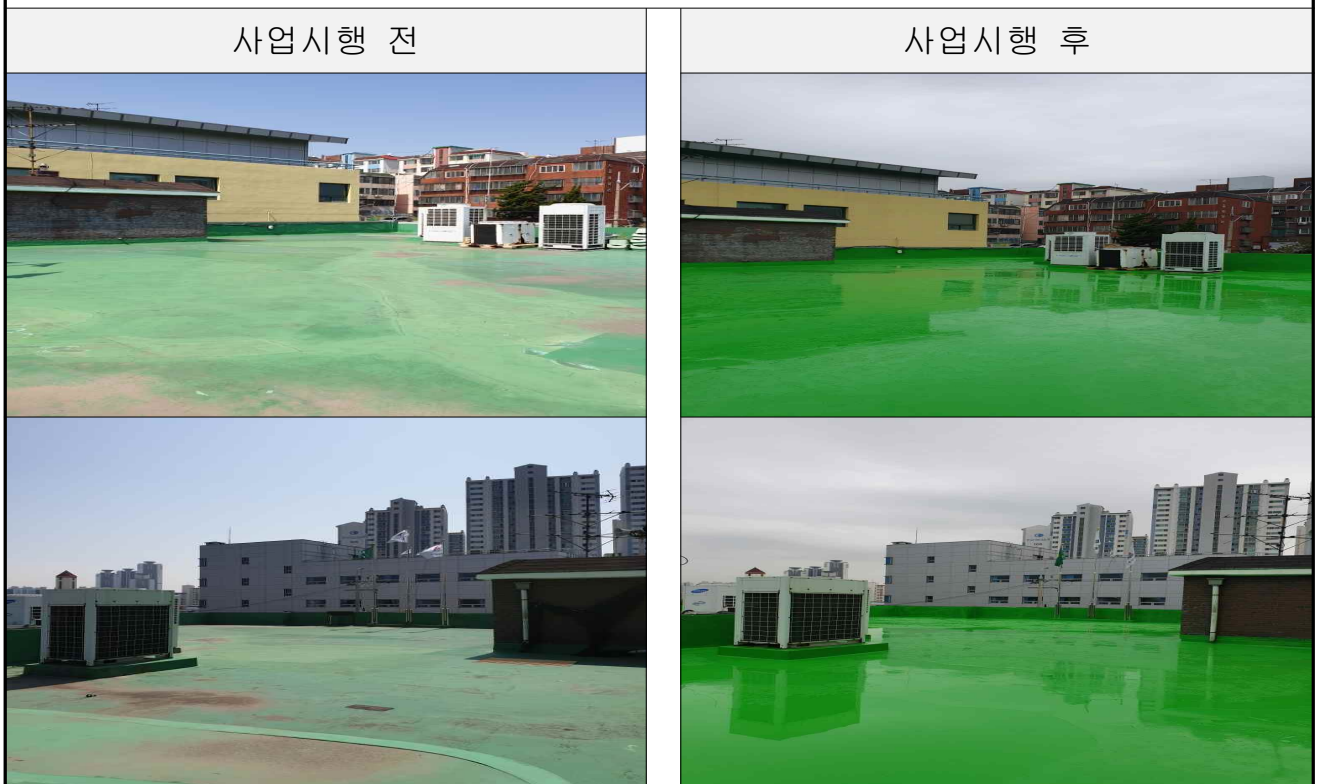

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-6(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-----------------------|---------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 도원동 일대 계단 방부목 및 난간 보수 | | | 제안자 | 김*윤 |
| 부서명 | 도원동 | 담당자 | 행정7급 염혜란 | 연락처 | 760-6164 |
| 추진상황 | 예산 | 5,000천원 | | 집행액 | 4,340천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | | 완 료 | 추진율 |
| | | | | ○ | 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 참외전로244번길 26-1 외 8개소
 - ※ 참외전로244번길 19-10, 도원로30번길 16, 참외전로244번길 30, 도산로 21, 도원로50번길 4-6, 도원로 48, 참외전로244번길 48, 샛골로9번길 53
- 사업기간 : 2021. 1. 28. ~ 2. 2.
- 사업내용
 - 노후된 계단 방부목 보수 및 난간 도색
- 기대효과
 - 주민 통행의 안전성 및 편의성 확보

□ 관련사진 : 붙임 참고


사업시행 전




사업시행 후



참외전로244번길 26-1

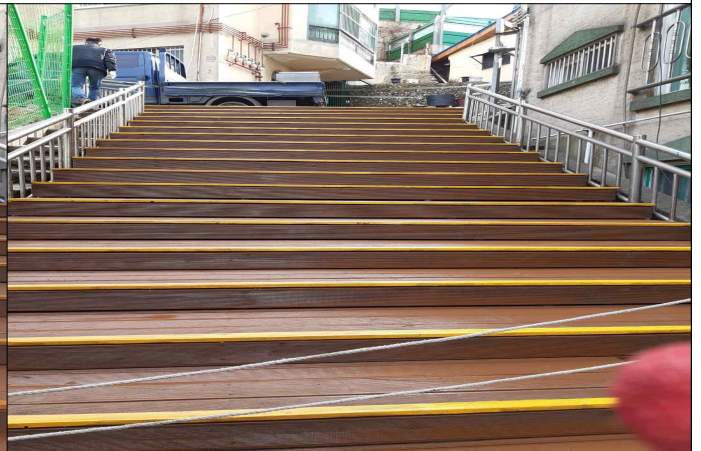

참외전로244번길 19-10

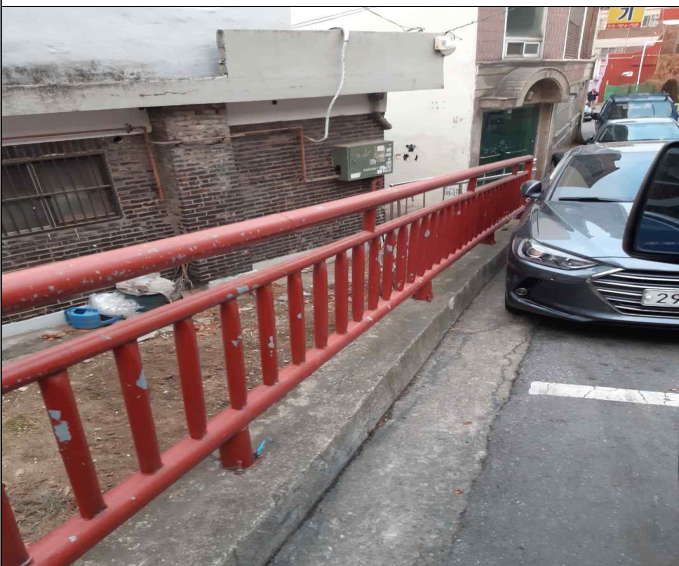

도원로30번길 16



사업시행 전





사업시행 후



참외전로244번길 30

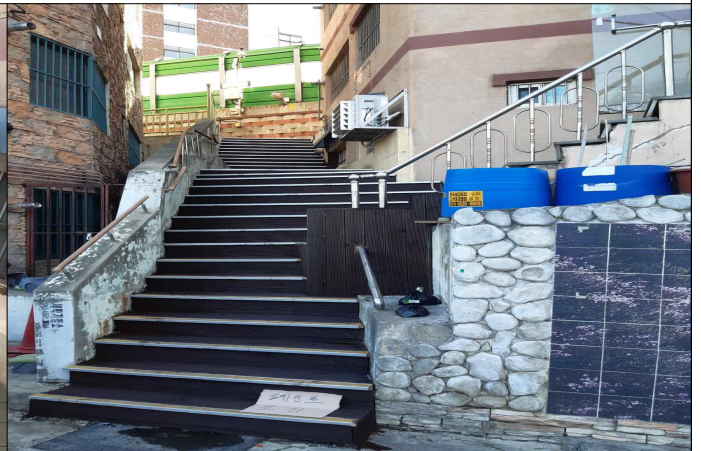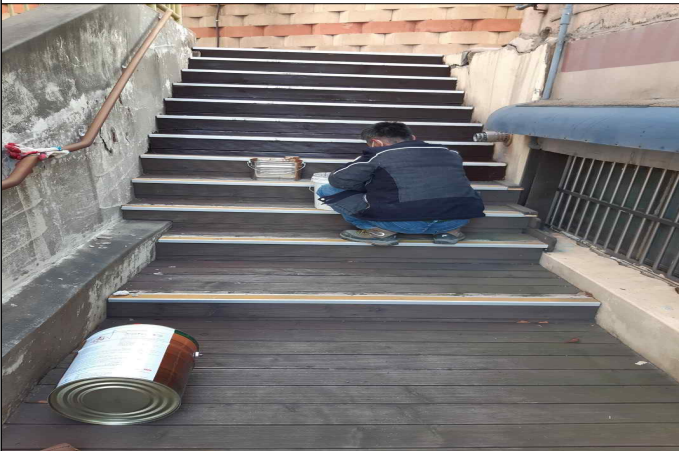

도산로 21

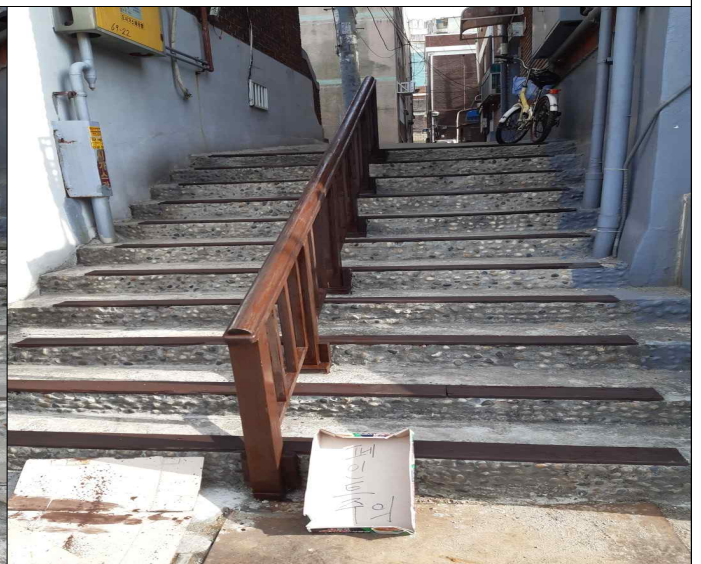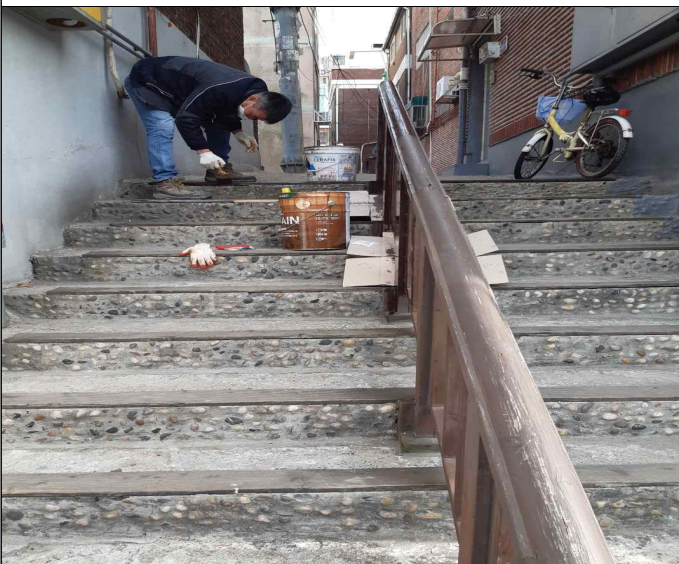


도원로50번길 4-6

사업시행 전



사업시행 후

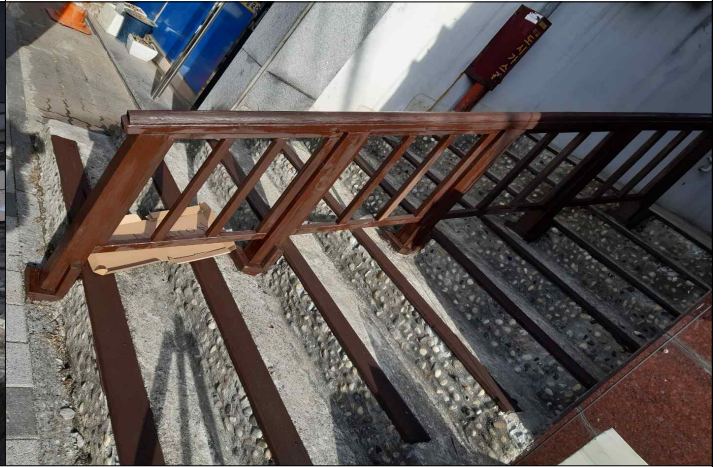

도원로 48



참외전로244번길 48



셋골로9번길 53

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-7(동) |
|------|-----------|


기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|----------------|----------|--------------|
| 사업명 | 장수의자(어르신)의자 설치 | 제안자 | 이*훈 |
| 부서명 | 율목동 담당자 | 행정7급 김희준 | 연락처 760-6185 |
| 추진상황 | 예산 | 5,000 천원 | 집행액 4,958천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 추진율 |
| | | ○ | 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 서해대로483번길 3 앞 횡단보도 등
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 6월
- 사업의 필요성 및 기대효과
 - 교통약자들(노인, 장애인, 임산부)를 위한 대기공간을 제공하여 무단횡단으로 인한 교통사고 방지
 - 율목동 높은 언덕길 요소요소에 설치하여 어르신들이 쉬어갈 수 있는 공간 제공
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터 앞 서대해로 횡단보도 및 율목공원 및 율목동 높은 언덕길에 의자를 설치하여 교통약자 (노인, 장애인, 임산부)를 위한 대기공간을 제공함
 - 2021. 5월 : 설치대상 확정
 - 2021. 6. 28. : 물품구매 계약 체결 및 의자 설치 완료

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-8(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|------------|----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 율목동 환경개선사업 | | | 제안자 | 이*훈 |
| 부서명 | 율목동 | 담당자 | 행정7급 김희준 | 연락처 | 760-6185 |
| 추진상황 | 예산 | 22,000천원 | | 집행액 | 18,588천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | | 완 료 | 추진율 |
| | | | | ○ | 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 율목동
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 율목동 노후 벽화 및 담장 도색
 - 율목동 소규모 정비 공사
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 노후 벽화·담장 및 환경정비 대상 발굴 및 확정
 - 2021. 6. 24. : 환경개선사업 바닥 공사 실시 (2,200천원)
 - 2021. 6. 29. : 환경개선사업 게시판 정비 완료 (1,172천원)
 - 2021. 6. 30. : 환경개선사업 벽면(벽화) 도장 공사 완료 (13,500천원)
 - 2021. 7. 12. : 율목동 환경개선사업 화분 구입 설치 (858천원)
 - 2021. 7. 26. : 율목동 환경개선사업 화분 구입 설치(2차) (858천원)

□ 관련사진

| | |
|---|--|
| 환경개선사업 벽면 도장공사 | 환경개선사업 바닥 공사 |
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|-----------|
| 접수번호 | 2020-9(동) |
|------|-----------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 사업명 | 코로나19 대비 살균소독수 지원 | | | 제안자 | 이*주 |
| 부서명 | 율목동 | 담당자 | 행정7급 김희준 | 연락처 | 760-6185 |
| 추진상황 | 예산 | 10,600천원 | 집행액 | 6,523천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 서해대로483번길 3 (율목동 행정복지센터)
- 사업기간 : 2021. 1월 설치완료 (연중 상시 배부)
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터에 미산성 살균소독수 생성장치를 설치해 주민들에게 무료로 제공하여 주민들 및 개인사업주에게 방역을 강화할 수 있는 방안을 제공함과 동시에 경제적인 도움을 주고자 함.
- 추진상황
 - 살균소독수 생성장치 설치 완료
 - 홍보용 물병을 구입하여 소독수를 담아서 홍보용을 제공하고 있음.
- 향후계획
 - 2021년 연중 상시 홍보 및 무료 배부

□ 관련사진

소독수 분무기 제작 및 배부



소독수 생성장치



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-10(동) |
|------|------------|


기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------|----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 주민 소통 공간 조성 | | | 제안자 | 윤*수 |
| 부서명 | 동인천동 | 담당자 | 행정7급 백연지 | 연락처 | 760-6204 |
| 추진상황 | 예산 | 20,000천원 | 집행액 | 0천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 10% | |

□ 개 요

- 위 치 : 동인천동 행정복지센터 옥상
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 7월
- 사업내용
 - 무대 설치
 - 주민 휴게 공간 조성
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 소통 공간 조성 관련 제안자와 협의
 - 2021. 5월 ~ 7월 : 공간 조성 계획 및 업체 선정중
- 향후계획
 - 2021. 8월 ~ 9월 : 공사 시행

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|---|
|  | <div style="text-align: center; height: 200px;"> <p>사진</p> </div> |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-11(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | | |
|------|---------------|-----|----------|-----|-----|----------|
| 사업명 | 동인천동 힐링 체험 교육 | | | | 제안자 | 윤*수 |
| 부서명 | 동인천동 | 담당자 | 행정7급 백연지 | | 연락처 | 760-6204 |
| 추진상황 | 예산 | | 10,000천원 | 집행액 | | 0천원 |
| | 시기 미도래 | | 추진중 | 완 료 | | 추진율 |
| | ○ | | | | | - |

□ 개 요

- 위 치 : 동인천동 행정복지센터
- 사업기간 : 2021. 7월 ~ 12월
- 사업내용
 - 우수 사례지 탐방
 - 힐링 체험 교육
 - 주민을 위한 문화프로그램 개설
- 추진상황
 - 코로나 19 확산에 따라 사업 진행이 어려움
- 향후계획
 - 2021. 8월 ~ 12월 : 우수 사례지 탐방
힐링 교육 및 문화프로그램 개설

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|--------|--------|
| | |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-12(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|----------|---------|----------|
| 사업명 | 북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업 | | | 제안자 | 유*길 |
| 부서명 | 개항동 | 담당자 | 행정7급 박은예 | 연락처 | 760-6224 |
| 추진상황 | 예산 | 4,000천원 | 집행액 | 3,880천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 북성동1가 4-183 부근(북성동 3통 쪽방촌)
- 사업기간 : 2021. 5월
- 사업내용
 - 북성동 3통 쪽방촌 골목길 포장
 - 취약계층 주거지역 환경개선 및 보행안전 확보
- 추진상황
 - 북성동 3통 쪽방촌 골목길 규사 포장
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 주민참여예산사업 모니터링 시행

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-13(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------------------------|---------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치 | | | 제안자 | 황*욱 |
| 부서명 | 개항동 | 담당자 | 행정7급 박미숙 | 연락처 | 760-6224 |
| 추진상황 | 예산 | 3,000천원 | | 집행액 | 2,940천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | | 완 료 | 추진율 |
| | | | | ○ | 100% |

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운로 55번길 19 일원
- 사업기간 : 2021. 6월
- 사업내용
 - 화교중산학교 앞 삼거리 부분 불법주차로 어린이 안전위협 및 주민불편
 - 보행자 및 차량통행에 방해가 되지 않도록 주차금지 시설물 설치
- 추진상황
 - 삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치완료
- 향후계획
 - 2021. 7월 : 주민참여예산사업 모니터링 시행

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-14(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------|---------|----------|---------|----------|
| 사업명 | 차이나타운 경사 개선 사업 | | | 제안자 | 황*한 |
| 부서명 | 개항동 | 담당자 | 행정7급 박은예 | 연락처 | 760-6224 |
| 추진상황 | 예산 | 5,000천원 | 집행액 | 4,801천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운 경사 골목 일원
- 사업기간 : 2021. 2월
- 사업내용
 - 강우·강설시 관광객 및 보행자 낙상사고 발생 빈번
 - 경사로 개선 사업으로 보행자 안전 확보
- 추진상황
 - 북성동2가 9-7 앞 계단 우측 난간 설치
 - 선린동 41-3 옆 계단 중앙 난간 설치
 - 북성동2가 10-8 북성동행정복지센터 입구 경사로에 난간 설치

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-15(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|----------------|----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 북성동 동네부엌 조성 사업 | | | 제안자 | 유*길 |
| 부서명 | 개항동 | 담당자 | 행정7급 박미숙 | 연락처 | 760-6224 |
| 추진상황 | 예산 | 30,000천원 | 집행액 | - | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 20% | |

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운로44번길 13-2 개항동행정복지센터 별관
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 먹거리를 매개로 이웃간 소통을 활성화하는 마을공동 공간 설치
 - 지역사회 주민들이 자발적으로 소규모 사업을 수행하는 공간으로 사용
- 추진상황
 - 2021. 1월 : 동네부엌 조성 계획 수립 및 공유재산 사용 신청
 - 2021. 2월 : 공유재산 사용 불가 회신
 - 2021. 3월 : 동네부엌 사업장소 재검토
 - 2021. 7월 : 동네부엌 조성 장소 확보
- 향후계획
 - 2021. 8월 : 동네부엌 공사 시행 및 물품구입
 - 2021. 9월 : 동네부엌 운영 개시

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--------|
|  | |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-16(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 무단횡단 금지대 설치 | | | 제안자 | 강*규 |
| 부서명 | 개항동 | 담당자 | 행정7급 송문희 | 연락처 | 760-6245 |
| 추진상황 | 예산 | 20,000천원 | 집행액 | 18,130천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 송월아파트 앞 참외전로 일원 도로 160m
- 사업기간 : 2021.3.13.(토)
- 사업내용
 - 송월아파트 앞 도로중앙에 무단횡단 금지대 설치
- 기대효과
 - 무단횡단으로 인한 안전사고 예방 및 감소
- 행정사항 : 시설물 설치 후 교통운수과 사후관리

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--|
|  |  |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-17(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 사업명 | 영종1동 소식지 게시판 설치 | | | 제안자 | 영종1동 주민참여예산 지역위원회 |
| 부서명 | 영종1동 | 담당자 | 행정8급 이현정 | 연락처 | 760-6364 |
| 추진상황 | 예산 | 13,000천원 | 집행액 | 12,986천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 관내 공동주택 13개소
- 사업기간 : 2021. 4월중
- 사업내용
 - 소식지 게시대를 제작하여 공동주택에 배부하고, 매주 발행하고 있는 영종1동 행정복지센터 소식지를 비치하여 구정 소식을 홍보하고자 함.
- 추진상황
 - 공동주택별 소식지 게시대 배부 완료.

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-18(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------|----------|----------|-----|----------|
| 사업명 | 배움과 나눔(아기자기) | | | 제안자 | 한*희 |
| 부서명 | 영종1동 | 담당자 | 행정8급 이동환 | 연락처 | 760-6364 |
| 추진상황 | 예산 | 27,000천원 | 집행액 | - | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | ○ | | | 0% | |

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터
- 사업기간 : 2021. 7월~12월 (※ 사회적 거리두기 단계 조정에 따라 유동적 시행)
- 사업내용
 - 영종1동 행정복지센터 내 공유주방 및 프로그램실을 활용하여 다양한 문예교육·취미여가·체험활동을 진행하여 배움과 나눔으로써 활기찬 생활을 영위할 수 있도록 기회를 마련
- 추진상황
 - 코로나 19 사회적 거리두기 4단계 시행에 따라 시행 지연
- 향후계획
 - 코로나 19 사회적 거리두기 단계 하향 시 추진 검토

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---------|---------|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-19(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 앞마루 공원 정자 정비 | | | 제안자 | 최*자 |
| 부서명 | 운서동 | 담당자 | 행정8급 박지상 | 연락처 | 760-6257 |
| 추진상황 | 예산 | 38,000천원 | 집행액 | 35,841천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | | ○ | 100% | |

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 2787-4 앞마루공원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 5월
- 사업내용
 - 철거작업 : 기존 정자 철거 및 나무 이식 작업
 - 신규설치 : 정자, 등받이 의자, 석재장기판 등 설치
- 추진상황
 - 철거작업 완료
 - 신규설치
 1. 석재장기판 설치 완료
 2. 공원안내판 설치 완료
 3. 정자 설치 완료
- 향후계획
 - 2021. 7. 6일에 실시한 모니터링 결과 반영
 - 장기판이용 안전대책 강구 및 여름철 모기로 인한 포충기 설치 검토

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-20(동) |
|------|------------|

기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | |
|------|--------------------|----------|--------------|
| 사업명 | 상습 무단투기지역 꽃씨뿌리기 활동 | 제안자 | 김*성 |
| 부서명 | 운서동 담당자 | 행정8급 박지상 | 연락처 760-6257 |
| 추진상황 | 예산 | 2,000천원 | 집행액 00천원 |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 추진율 |
| | ○ | | 0% |

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 관내 상습 무단투기지역 일원
- 사업기간 :
- 사업내용
 - 상습 무단투기지역 내 꽃씨뿌리기를 통한 무단투기 방지에 기여
- 추진상황
 - 꽃씨뿌리기 대상지(상습무단투기지역) 선정 中
 - 꽃씨뿌리기 활동인원 모집 中
- 향후계획
 - 사회적 거리두기 완하 시, 대상지역 선정 및 사업 실행

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|--------|--------|
| | |

주민참여예산 제안사업 관리카드

| | |
|------|------------|
| 접수번호 | 2020-21(동) |
|------|------------|


기준일 : 2021. 7. 31.

| | | | | | |
|------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 사업명 | 마을 공동 부엌 설치 | | | 제안자 | 김*선 |
| 부서명 | 용유동 | 담당자 | 행정6급 이미희 | 연락처 | 760-6286 |
| 추진상황 | 예산 | 43,000천원 | 집행액 | 38,136천원 | |
| | 시기 미도래 | 추진중 | 완 료 | 추진율 | |
| | | ○ | | 80% | |

□ 개 요

- 위 치 : 마시란로 308-13 (용유동 행정복지센터 부지 내)
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 9월
- 사업내용
 - 기존 유휴공간을 활용하여 마을 공동 부엌으로 설치·운영
 - 공동 조리실 및 주민 커뮤니티 공간 설치
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 공사 착공
 - 2021. 6월 : 공사 준공 및 시설 운영 물품 구입
- 향후계획
 - 2021. 7월 : 시설 운영 물품 구입
 - 2021. 8월 : 마을 공동 부엌 운영 계획 수립 및 주민 홍보
 - 2021. 9월 : 마을 공동 부엌 운영 개시

□ 관련사진

| 사업시행 전 | 사업시행 후 |
|---|--------|
|  | |
