

2021년도 예산 반영, 주민참여예산 사업 현황

(2021. 12. 31. 기준, 단위 : 천원)

연 번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					미추진	추진중	추진 완료
	총 계	총 43건	2,540,100	2,268,814	3	0	40
1	홍보체육실 (영종동)	백운로228번길 방범용 CCTV 설치	150,000	135,324			○
2	문화관광과 (북성동)	차이나타운 디자인 계단 사업	170,000	132,533			○
3	문화관광과 (신포동)	월드커뮤니티센터 관광안내 홍보관 설치	15,000	12,946			○
4	어르신 장애인과	장애인 친화도시 ‘ALL IN ONE’ 프로젝트	10,000	9,859			○
5	건설과 (북성동)	제물량로 일원 보안등 설치 사업	13,000	12,449			○
6	건설과 (신포, 동인천, 신흥)	긴 담모퉁이길 및 홍예문 축대 안전진단용역	20,000	19,604			○
7	건설과 (동인천)	보도블럭 정비 및 안전휀스 설치	72,000	24,361			○
8	건설과 (중구)	장애인을 위한 점자 보도블럭 정비	150,000	137,146			○
9	건설과 (신포동)	칼국수 골목 일원 보행환경 개선	60,000	41,000			○
10	도시개발과 (신포동)	담동쉼터 시계조형물 정비	25,000	0	○		
11	도시개발과 (동인천동)	홍예문로 꽃 터널 길 조성	75,000	62,496			○
12	교통운수과 (신포동)	홍예문로 교차로내 태양광 도로 표지병 설치	5,000	4,889			○
13	교통운수과 (중구)	어린이보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치	100,000	97,850			○
14	교통운수과 / 교통과 (중구)	버스승강장 냉방 편의시설 설치	73,500	66,377			○
15	환경보호과 (운서동)	넙디 내 상습 무단투기지역 CCTV 설치	40,000	39,814			○
16	환경보호과 (중구)	공중화장실 세척대 설치 사업	3,000	2,814			○
17	도시공원과 (운서동)	백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치	100,000	95,408			○
18	도시공원과 (운서동)	세계평화의 숲 산책로 가로수 정비	600,000	579,908			○
19	도시공원과 (영종동)	예단포항 산책로 입구 계단 설치	20,000	18,779			○
20	도시공원과 (영종국제도시)	인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성	50,000	50,000			○

연 번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					미추진	추진중	추진 완료
21	도시공원과 (운서동)	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비	350,000	349,396			○
22	보건행정과 (중구)	방역취약계층 방문방역 지원 사업	100,000	99,859			○
23	신포동	신포역 부근 경관개선사업	25,000	23,500			○
24	신포동	신포로35번길 감나무길 화단 조성사업	15,000	14,440			○
25	연안동	자전거 공기펌프기 설치	5,000	4,840			○
26	신흥동	주민자치센터 방수 및 리모델링 공사	14,000	13,100			○
27	신흥동	동 청사(체력단련실,회의실) 방수 공사	22,000	20,390			○
28	도원동	도원동 일대 계단 방부목 및 난간 보수	5,000	4,340			○
29	율목동	장수의재(어르신외자) 설치	5,000	4,958			○
30	율목동	율목동 환경개선사업	22,000	19,138			○
31	율목동	코로나 19 대비 살균 소독수 지원	10,600	9,924			○
32	동인천동	주민 소통 공간 조성	20,000	9,702			○
33	동인천동	동인천동 힐링 체험 교육	10,000	1,920	○		
34	개항동	북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업	4,000	3,880			○
35	개항동	삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치	3,000	2,940			○
36	개항동	차이나타운 경사 개선 사업	5,000	4,801			○
37	개항동	북성동 동네부엌 조성 사업	30,000	27,815			○
38	개항동	무단횡단금지대 설치	20,000	18,130			○
39	영종1동	영종1동 소식지 게시판 설치	13,000	12,986			○
40	영종1동	배움과 나눔(아기자기)	27,000	0	○		
41	운서동	앞마루 공원 정자 정비	38,000	35,841			○
42	운서동	상습 무단투기지역 꽃씨뿌리기 활동	2,000	1,980			○
43	용유동	마을 공동 부엌 설치	43,000	41,377			○

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-18
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	백운로228번길 방범용 CCTV 설치			제안자	김*호
부서명		담당자	방송통신7급 전명지	연락처	760-7102
추진상황	예산	150,000천원	집행액	135,324천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 백운로228번길 외 12개소

○ 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월

○ 사업내용


- 주민참여예산 제안자 의견을 반영하여 영종역2번 출구 ~ 백운로228번길 논골마을 일대 방범 사각지대에 대해 CCTV 설치
- 설치 시 200만 화소 회전형 및 고정형 카메라, IP비상벨 설치

○ 추진상황

- 2021. 2월 : 주민참여예산 주민의견 청취 및 현장실사
- 2021. 2월 : 일상감사, 계약심사 의뢰
- 2021. 3월 4일 : 행정예고 시행(21일)
- 2021. 4월 19일 : 2021년 방범용 CCTV 설치공사 착공
- 2021. 6월 17일 : 2021년 방범용 CCTV 설치공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전

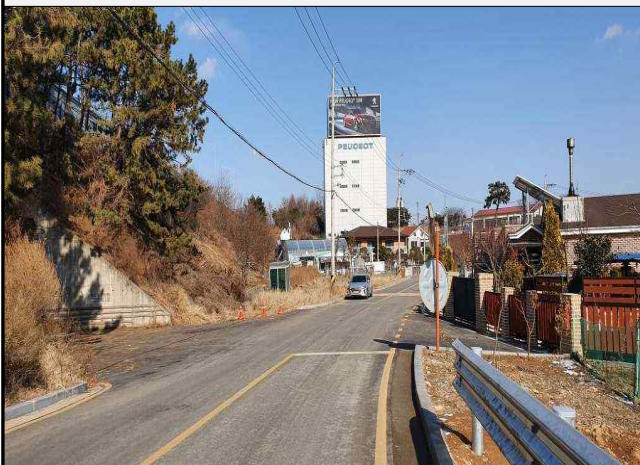

사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-38
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	차이나타운 디자인 계단 사업			제안자	장*훈
부서명	문화관광과	담당자	시설9급 최정현	연락처	760-6452
추진상황	예산	170,000천원		집행액	132,533천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 선리문 계단 일원
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 차이나타운 선린문 계단을 특색있는 계단으로 재정비

□ 그동안 추진사항

- 2021. 2. 4 : 용역 발주
- 2021. 2. 19 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. 19 : 용역 중지(주민의견 수렴)
- 2021. 5. 20 : 주민참여예산 제안자 설명(1차)
- 2021. 8. 4. : 용역 설명 및 주민의견 수렴(2차)
- 2021. 9. 7. : 용역 재개
- 2021. 9. 16. : 용역 준공
- 2021. 9. 30. : 『차이나타운 디자인 계단사업』 시행 및 계약의뢰
- 2021. 10. 22. : 공사 착공
- 2021. 12. 19. : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-112
------	----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	월드커뮤니티센터 관광안내 홍보판 설치	제안자	류*근
부서명	문화관광과 담당자	행정7급 정해원	연락처
			760-6477
추진상황	예산	15,000천원	집행액
			12,946천원
	시기 미도래	추진중	완 료
			추진율
			○
			100%

□ 개 요

- 위 치 : 월드커뮤니티센터 내(중구 제물량로 232번길 26)
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 관광 포스터 등 안내물 게시대 및 주변 주요관광지의 안내지도가 포함 된 다기능 홍보판 설치
 - 월드커뮤니티센터 내 관광안내 홍보판을 신규 설치하여 홍보 기능강화

□ 추진사항

- 2021. 4. 23 : 관광안내 홍보판 제작·설치 계획 수립
- 2021. 5. 11 : 관광안내 홍보판 제작·설치 물품 계약 체결
- 2021. 5. 31 : 관광안내 홍보판 제작 및 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p style="text-align: center;">사진 별첨</p>

사업 시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-16
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	장애인 친화도시 ‘ALL IN ONE’ 프로젝트			제안자	방*혁
부서명	어르신장애인과	담당자	사회복지 7급 정지현	연락처	760-7317
추진상황	예산	10,000천원		집행액	9,859천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 매소홀로 10 인천중구장애인종합복지관
- 사업기간 : 2021년 2월 ~ 12월
- 사업내용
 - 1. AAC(보완대체 의사소통) 환경 조성으로 장애인의 의사소통 접근성 강화
 - 2. 지역사회 활동가 양성으로 장애인의 긍정적인 인식개선 효과 도모
- 추진상황
 - 1. AAC(보완대체 의사소통) 관련 1,2,3차 직원 교육 실시 완료
 - 2. 복지관 내 AAC(보완대체 의사소통) 환경 조성 완료
 - 복지관 사업 안내판, 시각 지원판 제작
 - 복지관 명판, 안내판 등 AAC 디자인 수정 및 시공
 - 복지관 내 AAC 홍보 진행
 - 3. 장애인식개선 캠페인 진행
 - 코로나19로 인해 영상 활용한 온라인 캠페인으로 진행
 - 참여자 중 추천을 통해 장애인 생산품을 전달하여 장애 인식 개선 홍보
 - 4. 지역사회 활동가 모집 및 활동 (10명)
 - 장애 이해 및 편의시설 교육 진행 (2시간 진행)
 - 중구 지역 내에서 지역사회 활동가 활동
 - ① 장애인 주차구역 비장애인 주정차 시 이동 권고
 - ② 시각장애인 유도 블럭 위 주정차 차량 이동 권고
 - ③ 올바른 장애 명칭 권고
 - ④ 안내견 동반 가능 안내문 및 스티커 배포
 - 5. 장애인 친화도시 보고서 발간 (200권)
 - 장애인식 개선을 위한 홍보자료 활용

□ 관련사진



AAC 2차 직원 교육



AAC 안내도움판 구입



복지관 안내판 제작 (변경 전)



복지관 안내판 제작 (변경 후)



온라인 캠페인 홍보물 제작



AAC 홍보물품 제작·배부



지역사회 활동가 활동



장애인친화도시 보고서

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-52
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	제물량로 일원 보안등 정비공사			제안자	조*경
부서명	건설과	담당자	공업9급 나원영	연락처	760-7833
추진상황	예산	13,000천원		집행액	12,449천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 제물량로 일원(제물량로 로터리~인천역 사거리)
- 사업기간 : 3월(착공일로부터 28일간)
- 사업내용
 - 보안등 신설 4본
 - LED 로고조명 설치 7개소
- 추진상황
 - 보안등 신설 4본, LED 로고조명 7개소 설치 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-95
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	긴 담모퉁이길 및 홍예문 축대 안전진단 용역			제안자	조*원
부서명	건설과	담당자	시설9급 이강산	연락처	760-7454
추진상황	예산	20,000천원		집행액	19,604천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 송학동3가8 일원 외 1개소
- 사업기간 : 2021.3. ~ 2021.5.
- 사업내용
 - 홍예문 및 긴담모퉁이길 석축 정밀안전점검 용역
 - 석축의 구조적인 결함의 유무를 확인하여 향후 점검 및 유지관리에 활용
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 정밀안전점검 용역 착수
 - 2021. 5월 : 정밀안전점검 용역 준공
 - 2021. 6월 : 결과보고회 개최 및 결과 안내

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2018 - 72
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	보도블럭 정비 및 안전횡스 설치(큰우물로 일대)			제안자	동인천동 주민자치위원회
부서명	건설과	담당자	시설9급 정예준	연락처	760-7456
추진상황	예산	72,000천원		집행액	24,361천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 큰우물로 일원 (길병원 ~ 예지요양병원 앞)
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 7월
- 사업내용
 - 보도블럭 정비 (L = 159M, B = 2M)

○ 추진상황

- 2021. 3월 : 제안자 의견 확인 및 현장점검
- 2021. 4월 : 동인천동 행정복지센터 및 주민자치위원회 의견수렴
- 2021. 4월 : 설계도서 작성 및 착공
- 2021. 05. 03. : 동인천동 주민자치위원회와 보도 패턴협의
- 2021. 05. 24. : 큰우물로 일원 보도정비공사 착공
- 2021. 07. 05. : 큰우물로 일원 보도정비공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-39
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	장애인을 위한 점자 보도블럭 정비			제안자	이*배
부서명	건설과	담당자	시설9급 정예준	연락처	760-7454
추진상황	예산	150,000천원	집행액	137,146천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 일원(영종·용유 제외)
 - 인천역~중부경찰서 일원
 - 율목동 행정복지센터 일원

○ 사업기간 : 2021. 6 ~ 2021. 12

○ 사업내용

- 점자블록 미설치 구간 신규설치 및 부적정 설치구간 정비

○ 추진상황

- 2021. 5월 : 계약의뢰
- 2021. 6월 : 공사착공
- 2021. 12월 : 공사준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-111
------	----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	칼국수 골목 일원 보행환경 개선			제안자	윤*정
부서명	건설과	담당자	시설8급 이주영, 공업9급 나원영	연락처	760-7455
추진상황	예산	60,000천원	집행액	41,000천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 신포동 61번지 일원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 7월
- 사업내용
 - 토목 : 보도블럭 정비 (L=200, B=2~3m)
 - 전기 : LED 보안등(80W) 신설(4개소), LED 보안등(80W) 교체(10개소)
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 제안자 의견 및 현장 확인
 - 2021. 5월 : 토목 (보도블럭 정비 완료)
 - 2021. 7월 : 전기 (보안등 정비 완료)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2019-80
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	답동쉼터 시계조형물 정비			제안자	김*애
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 박석준	연락처	760-7582
추진상황	예산	25,000천원	집행액	0천원	
	미추진	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 답동 18-5(답동쉼터)
 - 사업기간 : 미정
 - 사업내용
 - 답동쉼터 시계탑 설치 1식
 - 기존시계탑 철거 및 폐기물 처리 1식
 - 추진상황
 - 市에서 추진하는 「신포지하공공보도 연장 복합센터 사업」에 답동쉼터가 포함됨에 따라, 사업 세부내용에 관한 별도 협의 필요
 - 사업제안자에게 市추진사업방향에 대하여 설명하였으며, 답동쉼터 시계조형물 정비사업 잠정중단에 대하여 안내하고 의견 청취
 - 향후계획
 - 市추진 사업에 답동쉼터 반영예정임에 따라, 시계탑 설치를 포함한 주민건의 사항 반영 협의 예정(주민참여예산 미집행 및 불용처분)
- ※현재 실시설계용역 진행중으로 2022년 3월 준공 후 2022년 상반기 본공사 착공 예정(市 재생콘텐츠과)

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-74
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	홍예문로 꽃 터널 길 조성			제안자	윤*수
부서명	도시개발과	담당자	녹지7급 박석준	연락처	760-7582
추진상황	예산	75,000천원		집행액	62,496천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 전동 2-4(동인천동 쉼터) 일원
 - 사업기간 : 2021. 5. 14. ~ 2021. 6. 22.
 - 사업내용
 - 장미터널(16개소) 설치 및 장미(320주) 식재
 - 플랜터 212.1m 설치, 꽃잔디 2,170본 식재, 기존수목 560주 이식 등
 - 추진상황
 - '21.02.04. ~ '21.04.08. : 실시설계용역 완료
 - '21.05.14. : 공사 착공
 - '21.06.22. : 공사 준공
 - '21.07.07. : 주민참여예산 현장 모니터링 실시
 - 향후계획
 - '21.08. ~ : 쉼터 수목 및 시설물 관리 실시
- ※사업잔액을 활용한 장미터널 바닥 도막포장 시공 검토중('21년 11월 완료 목표)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-75
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	홍예문로 교차로내 태양광 도로 표지병 설치			제안자	김*섭
부서명	교통운수과	담당자	시설9급 강희엽	연락처	760-7682
추진상황	예산	5,000천원	집행액	4,889천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 홍예문로 교차로
- 사업기간 : 시기 미도래
- 사업내용
 - 홍예문로 교차로 내 태양광 표지병 34개 설치

○ 추진상황

- 2021. 05. 12. 홍예문로 교차로 내 도로표지병 구입·설치 시행
- 2021. 05. 12. 홍예문로 교차로 내 도로표지병 구입·설치 물품 계약의뢰
- 2021. 05. 24. 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-36
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	어린이 보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치			제안자	이*문 이*린
부서명	교통운수과	담당자	시설9급 강희엽	연락처	760-7682
추진상황	예산	100,000천원	집행액	97,850천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치

- 신흥동3가 7-207(인하대병원 앞) 약 420m 구간
- 신흥동3가 30(중구장애인 복지관 앞) 약 190m 구간
- 향동7가 27-106(연안초등학교 앞) 약 130m 구간
- 신흥동3가 28-2(신광초등학교 앞) 약 160m 구간
- 신흥동3가 56(삼익아파트 앞) 약 140m구간

○ 사업기간 : 2021. 02. 18. ~ 2021. 03. 05.

□ 관련사진

구분	시공 전	시공 후
신흥동3가 7-207		
신선초등 학교		

구분	시공 전	시공 후
<p>항 동 7 가 27-106</p>		
<p>신 흥 동 3 가 28-2</p>		
<p>신 흥 동 3 가 56</p>		

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-37
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	버스승강장 냉방 편의시설 설치			제안자	김*기
부서명	교통운수과 교통과	담당자	행정7급 유환섭 행정7급 서동혁	연락처	760-7572 760-7752
추진상황	예산	73,500천원	집행액	66,377천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 버스승강장 내
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월
- 사업내용
 - 버스승강장 내 에어컨(송풍기) 설치
- 추진상황
 - (원도심) 2021. 4월 : 에어컨(송풍기) 설치 대상지 검토
2021. 5월 : 전기공사 현지 실사
2021. 6월 : 계약 의뢰
2021. 7월 : 설치완료
 - (영 중) 2021. 4월 : 에어컨(송풍기) 설치 대상지 검토
2021. 5월 : 전기 굴착허가 신청 및 도로관리심의회 개최
2021. 9월 : 냉방편의시설 설치 완료

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-99
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	넙디 내 상습 무단투기지역 CCTV 설치			제안자	장*애
부서명	환경보호과	담당자	행정8급 정기영	연락처	760-7416
추진상황	예산	40,000천원	집행액	39,814천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 넙디 등 환경취약지역
- 사업기간 : 2021년 4월~5월 중
- 사업내용
 - 환경취약지역에 무단투기 단속을 위한 CCTV 10개 설치
- 추진상황
 - 2021.3. : CCTV 설치 지역 선정
 - 2021.3. : CCTV 설치 계획 수립
 - 2021.4. : CCTV 설치에 따른 행정예고 실시
 - 2021.5. : CCTV 설치
- 향후계획
 - CCTV 운용 및 단속 철저

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

설치 사진



인천광역시 중구 해안동2가 9-5

설치 사진



인천광역시 중구 신생동 2-22



인천광역시 중구 사동 30-58



인천광역시 중구 답동 35-16



인천광역시 중구 선화동 28-2



인천광역시 중구 운북동 779-27

설치 사진



인천광역시 중구 운서동 2893-4

설치 사진



인천광역시 중구 운서동 2889-15



인천광역시 중구 운남동 1719-39



인천광역시 중구 운서동 2854-6

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2019-60
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	공중화장실 세척대 설치 사업			제안자	김*애
부서명	환경보호과	담당자	환경7급 임 슬	연락처	760-7218
추진상황	예산	3,000천원	집행액	2,814천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 신흥시장, 인천종합어시장 공중화장실 (2개소)
- 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업내용
 - 소요예산 : 1,407,000원 * 2개소 = 2,814,000원
 - 2021년 市 주민참여예산 제안사업
 - 재활용이 가능하고 위생안전성이 높은 월경컵 사용자 증가를 고려하여 공중화장실 중 여성화장실에 월경컵 세척대 설치
- 추진상황
 - 2021.6.18. 신흥시장, 인천종합어시장의 여성공중화장실 안 월경컵 세척대 및 전기온수기 설치
 - 2021.7.12. 월경컵 세척대 안내판 설치
- 향후계획
 - 월경컵세척대를 편리하게 사용할 수 있도록 지속적 관리

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-58
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	백련산 전망대 및 등산로 내 이용편의시설 설치			제안자	조*현
부서명	도시공원과	담당자	녹지9급 강원	연락처	760-7774
추진상황	예산	100,000천원	집행액	95,408천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 백련산 전망대(중구 운서동 산98-11)
- 사업기간 : 2021. 5. 18. ~ 2021. 6. 28.
- 사업내용
 - 백련산 전망대 정비(2층 증설)
- 추진상황
 - 2021. 4. 15. : 백련산 전망대 정비공사 실시설계 용역 준공
 - 2021. 5. 18. : 백련산 전망대 정비공사 착공
 - 2021. 6. 28. : 백련산 전망대 정비공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-57
------	---------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	세계평화의 숲 산책로 가로수 정비			제안자	최*자
부서명	도시공원과	담당자	녹지7급 김유리	연락처	760-7777
추진상황	예산	600,000천원	집행액	579,908천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 공항신도시 유수지공원 및 완충녹지 1호·2호
- 사업기간 : 2021. 03. 29. ~ 06. 15. (착공일 2021. 03. 31.)
- 사업내용
 - 수목보식 : 왕벚나무 외 3종 515주
 - 지피식재 : 무늬옥잠화 외 5종 28,902본
 - 생태학습관 소방도로 조성 : 245m
 - 각종 시설물 설치 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 15. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 03. 31. : 사업 착수
 - 2021. 06. 15. : 사업 준공
- 향후계획
 - 사업대상지 수목 및 시설물 유지관리 철저

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020 - 87
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	예단포항 산책로 입구 계단 설치			제안자	이*배
부서명	도시공원과	담당자	시설8급 문종욱	연락처	760-8848
추진상황	예산	20,000천원		집행액	18,779천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 운북동 1264
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 4월
- 사업내용
 - 공원 입구 계단 설치 1식
 - 부지정리 및 야자매트 설치 1식
- 추진상황
 - 2021.2월~3월 : 공사 설계
 - 2021. 03. 30. : 공사 착공
 - 2021. 04. 29. : 공사 준공
- 향후계획
 - 상시 유지관리 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-108
------	----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	인도주변 환경 개선을 통한 보행 친화거리 조성			제안자	배*희
부서명	도시공원과	담당자	행정6급 이기옥	연락처	760-7781
추진상황	예산	50,000천원	집행액	50,000천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운골녹지연결통로(운서동 3157-3)
운서역 철교 하부 통로(운서동 1427-45)
- 사업기간 : 2021. 4. ~2021. 7.
- 사업규모 : 623㎡
- 사업내용 : 벽화작업(도색 등) 및 경관조명 확충을 통한 시설 정비
- 추진상황
 - 2021. 5. 24 : 공사계약
 - 2021. 5. 24 : 공사착공
 - 2021. 6. 23 : 공사준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-109
------	----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	영마루공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비			제안자	안*숙
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 지호승	연락처	760-7778
추진상황	예산	350,000천원	집행액	349,396천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 공항신도시 영마루공원
- 사업기간 : 2021. 04. 01. ~ 06. 21. (착공일 2021. 04. 01.)
- 사업내용
 - 시설물공 : 시설물공 : 공연장 기동보수 1개소, 체력단련시설 19개소, 이동식농구대 3개소, 플랜터 264.4㎡ 등
 - 식재공 : 장미 5종 990주
 - 포장공 : 인조화강설블럭포장 718㎡, 고무칩포장 207.3㎡, 플라스틱바닥포장 282㎡ 등
 - 부대공 : 수목제거 310주, 토사운반 275.7㎡ 및 폐기물처리 1식 등
- 추진상황
 - 2021. 02. 10. : 실시설계 용역 준공
 - 2021. 04. 01. : 사업 착공
 - 2021. 04. 26. : 선급금 지급
 - 2021. 06. 21. : 사업 준공
- 향후계획
 - 사업대상지 수목 및 시설물 유지관리 철저

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-114
------	----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	방역취약계층 방문방역 지원 사업			제안자	윤*수
부서명	보건행정과	담당자	의료기술6급 김상덕	연락처	760-6071
추진상황	예산	100,000천원	집행액	99,859천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 보건행정과
- 사업기간 : 2021. 3. 2 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 대상
 - 300세대 미만의 공동주택과 단독주택 거주
 - 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대,
 - 장애의 정도가 심한 장애인, 65세 이상 홀로 사는 노인세대 등
 - 내용
 - 대상 세대 방문 실내 · 외 방역소독 실시
 - 살균, 살충, 유충구제, 바퀴구제, 개미구제 등
- 추진상황
 - 2021. 3월 ~ 9월 실적 : 848세대
- 향후계획
 - 취약계층 방문방역 사업에 대한 주기적 홍보
 - 거동불편 취약계층 방문 방역 중점 실시 추진
 - 관내 쪽방촌 56세대(인현동, 북성동, 경동·내동) 주기적 방역 실시 추진
 - 지역아동센터, 아동복지시설 지속적 방문방역 실시

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-1(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	신포역 부근 경관개선 사업			제안자	송*숙
부서명	신포동	담당자	행정민원팀장 임철기	연락처	760-6103
추진상황	예산	25,000천원		집행액	23,500천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 답동사거리~신포역~신포사거리
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 9월
- 사업내용
 - 답동사거리~신포역 가로등 꽃걸이 17개소 초화 식재
 - 신포역~신포사거리 인도웬스 화분설치 및 초화식재(88m)
- 추진상황
 - 2021.2.24. : 제1차 지역위원회 시 주요 사업내용 선정
 - 2021.3.6. : 사업 추진에 따른 관련부서 검토의견 접수
 - 2021.4.6. : 제3차 지역위원회 시 사업범위와 구체적인 사업내용 선정
 - 2021.4.30. : 조경공사 계약 및 공사 시행
 - 2021.5.21. : 봄 초화 식재 완료
 - 2021.5.31. : 기성대가 지급(13,860천원)
 - 2021.6.29. : 초화 화분 관수작업 용역비용 지출
 - 2021.8.25. : 가을 초화 식재 완료
 - 2021.9.30. : 관수작업 용역 및 화분 보수

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-2(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	신포로35번길 감나무길 화단 조성사업			제안자	김*유
부서명	신포동	담당자	행정8급 이지민	연락처	760-6103
추진상황	예산	15,000천원	집행액	14,440천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

○ 위 치 : 신포로35번길

○ 사업기간 : 2021. 3월 ~ 6월

○ 사업내용

- 감나무 전지작업 및 화단 정리·개보수
- 감나무 감 수확 · 나눔 행사 실시
- 신포로35번길 감나무길 화단 개·보수 공사
- 탈착 부분 미장 및 파벽돌 부착
- 마감돌(스톤캡) 공사

○ 추진상황

- 2021.2.24. : 제1차 지역위원회 시 주요 사업내용 선정
- 2021.3. 6. : 사업 추진에 따른 관련부서 검토의견 접수
- 2021.3.16. : 제2차 지역위원회 시 사업범위와 구체적인 사업내용 선정
- 2021.3.25. ~ 3.31. : 감나무 전지작업 및 화단 정리 사업 실시
- 2021. 10. 21. : 감나무 감 수확 · 나눔 행사 실시
- 2021. 11. 19. : 화단보수 계약
- 2021. 11. 22. : 공사 착공
- 2021. 12. 1. : 공사 준공

○ 향후계획

- 2022. 신포동 환경개선 사업 : 신포로35번길 감나무길 전지작업 실시
- 2022. 10월 중 : 감나무길 감 수확·나눔 행사

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-3(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	자전거 공기펌프기 설치			제안자	김*영
부서명	연안동	담당자	행정7급 김신아	연락처	760-6124
추진상황	예산	5,000천원	집행액	4,840천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 연안동 행정복지센터 1층
- 사업기간 : 2021. 3월
- 사업내용
 - 자동식 복합형 자전거 공기주입기 설치
- 추진상황
 - 2021. 3. 19. : 계약 체결
 - 2021. 3. 29. : 구입·설치 완료
- 향후계획
 - 2021. 4월 : 자전거공기주입기 설치 홍보

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-4(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	주민자치센터 방수 및 리모델링 공사			제안자	김*원
부서명	신흥동	담당자	행정7급 장진이	연락처	760-6147
추진상황	예산	14,000천원		집행액	13,100천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 주민자치센터(도원로 4)
- 사업기간 : 2021. 4월 中
- 공사내용
 - 실리콘 방수 작업
 - 바닥 교체
 - 벽지 교체
 - 외벽 가림막 설치
- 그동안 추진사항
 - 2021. 4월 : 공사 시행 및 착공
 - 2021. 4월 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-5(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	동 청사(체력단련실, 회의실)방수 공사			제안자	오*영
부서명	신흥동	담당자	행정7급 장진이	연락처	760-6147
추진상황	예산	22,000천원		집행액	20,390천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 행정복지센터(제물량로80번길 3-14) 옥상 등
- 사업기간 : 2021. 4월 초 ~ 5월 초
- 공사내용
 - 바닥, 수직면 바탕면처리
 - 바닥, 수직면 방수프라이머 도포
 - 바닥 3mm 도막 방수 도포
 - 수직면 0.2mm 도막 방수 도포
 - 바닥, 수직면 마감도료(Top-coat) 도포
- 그동안 추진사항
 - 2021. 4월 초 : 공사 착공
 - 2021. 5월 초 : 공사 준공

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-6(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	도원동 일대 계단 방부목 및 난간 보수			제안자	김*윤
부서명	도원동	담당자	행정7급 염혜란	연락처	760-6164
추진상황	예산		5,000천원	집행액	4,340천원
	시기 미도래		추진중	완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

○ 위 치 : 참외전로244번길 26-1 외 8개소

※ 참외전로244번길 19-10, 도원로30번길 16, 참외전로244번길 30,
도산로 21, 도원로50번길 4-6, 도원로 48, 참외전로244번길 48,
샛골로9번길 53

○ 사업기간 : 2021. 1. 28. ~ 2. 2.

○ 사업내용

- 노후된 계단 방부목 보수 및 난간 도색

○ 기대효과

- 주민 통행의 안전성 및 편의성 확보

□ 관련사진 : 불임 참고


사업시행 전




사업시행 후



참외전로244번길 26-1

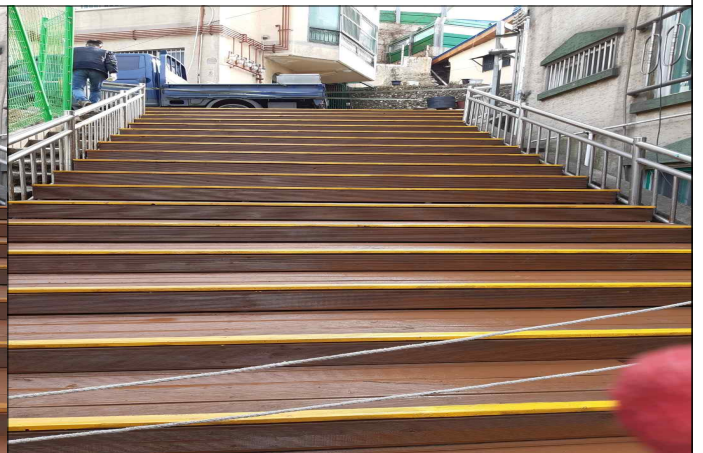

참외전로244번길 19-10

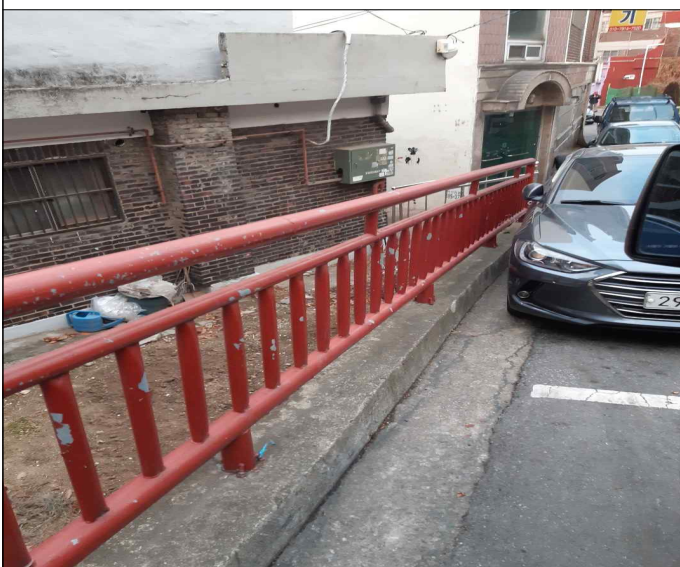

도원로30번길 16



사업시행 전





사업시행 후



참외전로244번길 30

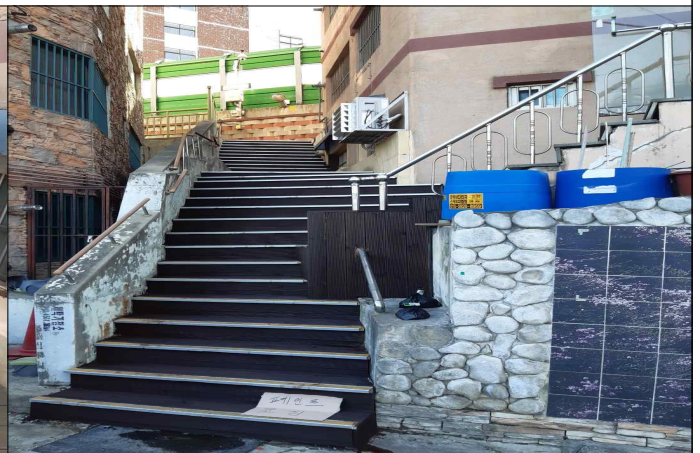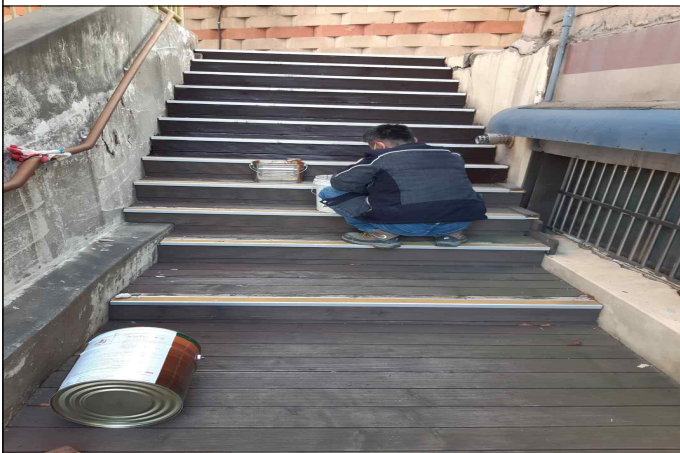


도산로 21

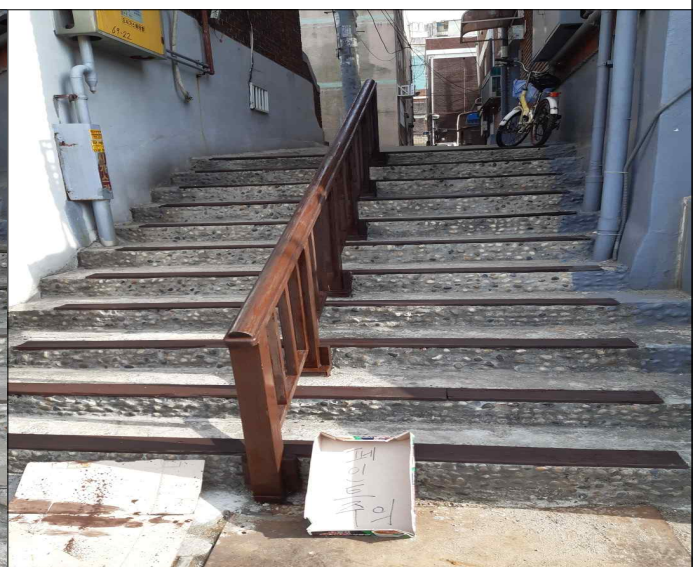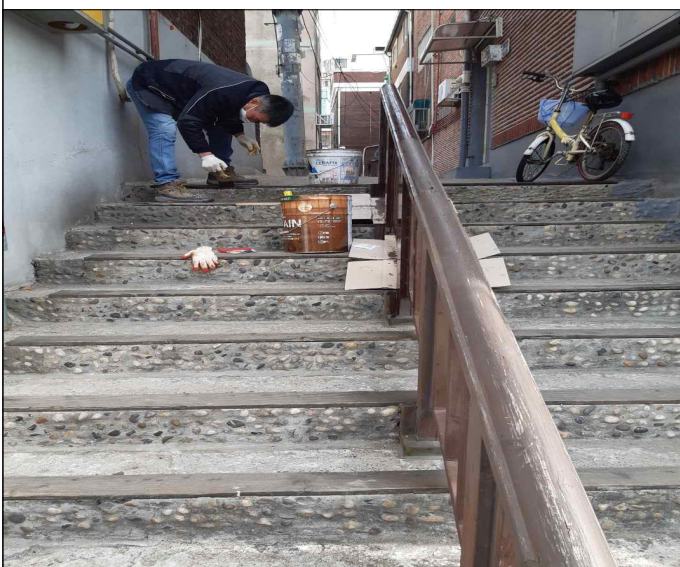


도원로50번길 4-6

사업시행 전

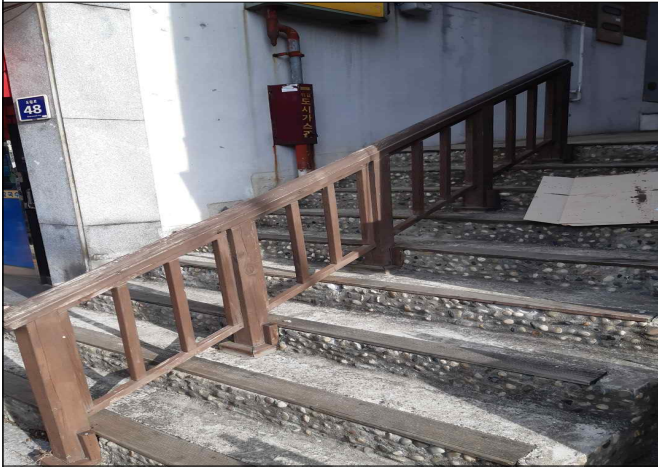

사업시행 후

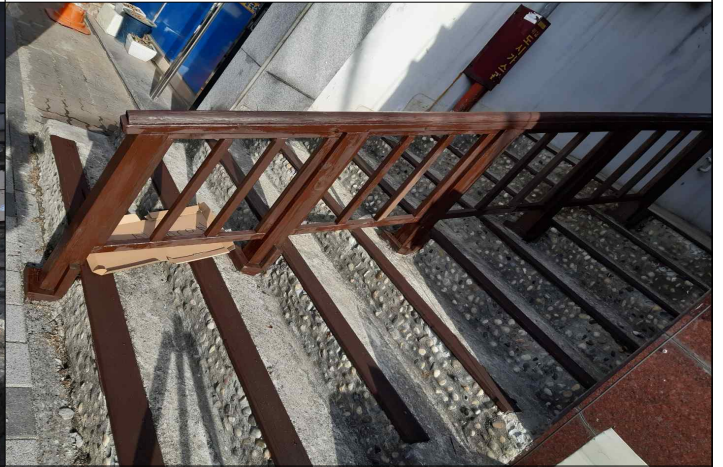

도원로 48



참외전로244번길 48



셋골로9번길 53

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-7(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	장수의자(어르신)의자 설치			제안자	이*훈
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	5,000 천원	집행액	4,958천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 서해대로483번길 3 앞 횡단보도 등
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 6월
- 사업의 필요성 및 기대효과
 - 교통약자(노인, 장애인, 임산부)를 위한 대기공간을 제공하여 무단횡단으로 인한 교통사고 방지
 - 율목동 높은 언덕길 요소요소에 설치하여 어르신들이 쉬어갈 수 있는 공간 제공
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터 앞 서해대로 횡단보도 및 율목공원 및 율목동 높은 언덕길에 의자를 설치하여 교통약자 (노인, 장애인, 임산부)를 위한 대기공간을 제공함
 - 2021. 5월 : 설치대상 확정
 - 2021. 6. 28. : 물품구매 계약 체결 및 의자 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-8(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	율목동 환경개선사업			제안자	이*훈
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	22,000천원	집행액	19,138천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 율목동
- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 11월
- 사업내용
 - 율목동 노후 벽화 및 담장 도색
 - 율목동 소규모 정비 공사
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 노후 벽화·담장 및 환경정비 대상 발굴 및 확정
 - 2021. 6. 24. : 환경개선사업 바닥 공사 실시 (2,200천원)
 - 2021. 6. 29. : 환경개선사업 게시판 정비 완료 (1,172천원)
 - 2021. 6. 30. : 환경개선사업 벽면(벽화) 도장 공사 완료 (13,500천원)
 - 2021. 7. 12. : 율목동 환경개선사업 화분 구입 설치 (858천원)
 - 2021. 7. 26. : 율목동 환경개선사업 화분 구입 설치(2차) (858천원)
 - 2021. 11월 : 율목동 환경개선사업 수목제거 실시 (550천원)

□ 관련사진

환경개선사업 벽면 도장공사	환경개선사업 바닥 공사
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-9(동)
------	-----------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	코로나19 대비 살균소독수 지원			제안자	이*주
부서명	율목동	담당자	행정7급 김희준	연락처	760-6185
추진상황	예산	10,600천원		집행액	9,924천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 서해대로483번길 3 (율목동 행정복지센터)
- 사업기간 : 2021. 1월 설치완료 (연중 상시 배부)
- 사업내용
 - 율목동 행정복지센터에 미산성 살균소독수 생성장치를 설치해 주민들에게 무료로 제공하여 주민들 및 개인사업주에게 방역을 강화할 수 있는 방안을 제공함과 동시에 경제적인 도움을 주고자 함.
- 추진상황
 - 2021. 1월 : 살균소독수 생성장치 설치 완료
 - 2021. 3월 : 소독수 배부용 물병 구입
 - 2021. 4월 : 홍보용 현수막 및 배너 제작
 - 2021. 6월 : 소독수 배부용 분무기 구입 (760개) 및 무료 제공
 - 2021. 11월 : 소독수 배부용 분무기 구입 (700개) 및 무료 제공
 - 2021. 12월 : 소독수 배부용 분무기 구입 (214개) 및 무료 제공
- 향후계획
 - 2021년 연중 상시 홍보 및 무료 배부

□ 관련사진

소독수 분무기 제작 및 배부



소독수 생성장치



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-10(동)
------	------------


기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	주민 소통 공간 조성			제안자	윤*수
부서명	동인천동	담당자	행정7급 전하영	연락처	760-6205
추진상황	예산	20,000천원	집행액	9,702천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 동인천동 행정복지센터 옥상
- 사업기간 : 2021. 6월 ~ 12월
- 사업내용
 - 무대 설치
 - 주민 휴게 공간 조성
- 추진상황
 - 2021. 3월 : 소통 공간 조성 관련 제안자와 협의
 - 2021. 6월 ~ 8월 : 사업 계획 논의
 - 2021. 9월 : 옥상 위험 요인 관련 사업 재검토중
 - 2021. 12월
 - 동인천동행정복지센터 주민 소통공간(옥상무대설치) 조성공사 완료
 - 동인천동행정복지센터 주민 소통공간(옥상무대설치) 오일스테인 칠 시공 완료

□ 관련사진

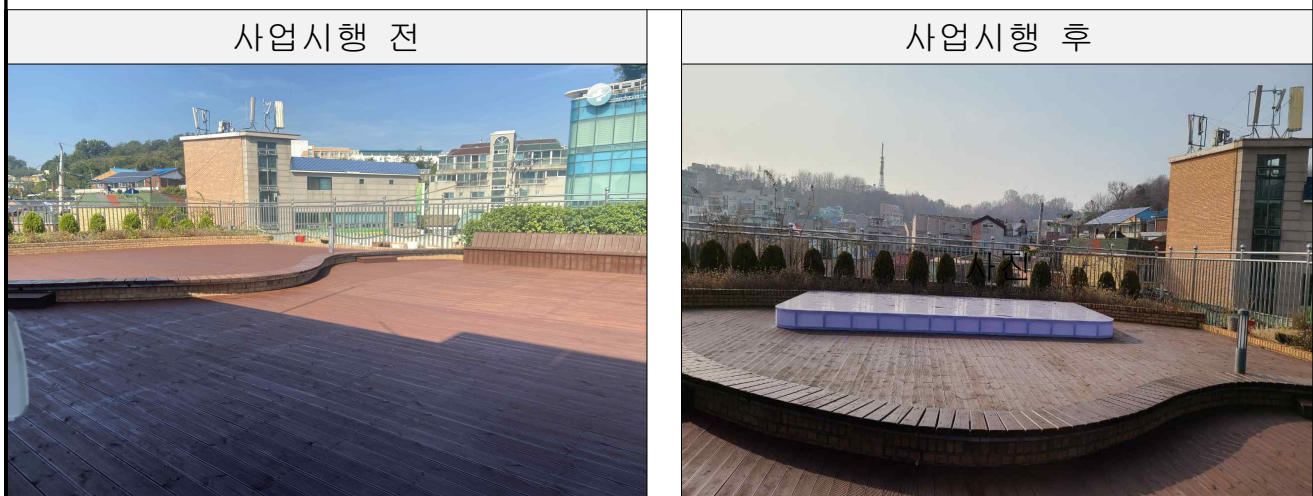

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-11(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	동인천동 힐링 체험 교육			제안자	윤*수
부서명	동인천동	담당자	행정7급 전하영	연락처	760-6205
추진상황	예산	10,000천원	집행액	1,920천원	
	미추진	추진중	완 료	추진율	
	○			-	

□ 개요

○ 위치 : 동인천동 행정복지센터

○ 사업기간 : 2021. 10월 ~ 12월

○ 사업내용

- 우수 사례지 탐방
- 힐링 체험 교육
- 주민을 위한 문화프로그램 개설

○ 추진상황

- 2021. 10월 : 코로나 19 확산에 따라 사업 진행 지연
- 2021. 11월
 - 코로나19 단계적 일상회복 이후 「기성세대와 MZ세대와의 소통·교수법」 강의
2021.12. 5.(일) 개최 예정으로 행사 추진
 - 행사 물품 구입, 현수막 · 포스터 · 배너 제작 등 지출
- 2021. 12. 3. : 일상회복 이후 코로나19의 대유행(오미크론 변이바이러스
국내유입 및 감염 확산)에 따라 강연 취소

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-12(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	북성동 쪽방촌 골목길 포장 사업			제안자	유*길
부서명	개항동	담당자	행정7급 박은예	연락처	760-6224
추진상황	예산	4,000천원		집행액	3,880천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 북성동1가 4-183 부근(북성동 3통 쪽방촌)
- 사업기간 : 2021. 5월
- 사업내용
 - 북성동 3통 쪽방촌 골목길 포장
 - 취약계층 주거지역 환경개선 및 보행안전 확보
- 추진상황
 - 북성동 3통 쪽방촌 골목길 규사 포장
- 향후계획
 - 2021. 6월 : 주민참여예산사업 모니터링 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-13(동)
------	------------


기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치			제안자	황*욱
부서명	개항동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6224
추진상황	예산	3,000천원		집행액	2,940천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운로 55번길 19 일원
- 사업기간 : 2021. 6월
- 사업내용
 - 화교중산학교 앞 삼거리 부분 불법주차로 어린이 안전위협 및 주민불편
 - 보행자 및 차량통행에 방해가 되지 않도록 주차금지 시설물 설치
- 추진상황
 - 삼국지 벽화거리 일대(화교중산학교) 교통안전시설물 설치완료
- 향후계획
 - 2021. 7월 : 주민참여예산사업 모니터링 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-14(동)
------	------------


기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	차이나타운 경사 개선 사업			제안자	황*한
부서명	개항동	담당자	행정7급 박은예	연락처	760-6224
추진상황	예산	5,000천원	집행액	4,801천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운 경사 골목 일원
- 사업기간 : 2021. 2월
- 사업내용
 - 강우·강설시 관광객 및 보행자 낙상사고 발생 빈번
 - 경사로 개선 사업으로 보행자 안전 확보
- 추진상황
 - 북성동2가 9-7 앞 계단 우측 난간 설치
 - 선린동 41-3 옆 계단 중앙 난간 설치
 - 북성동2가 10-8 북성동행정복지센터 입구 경사로에 난간 설치

□ 관련사진

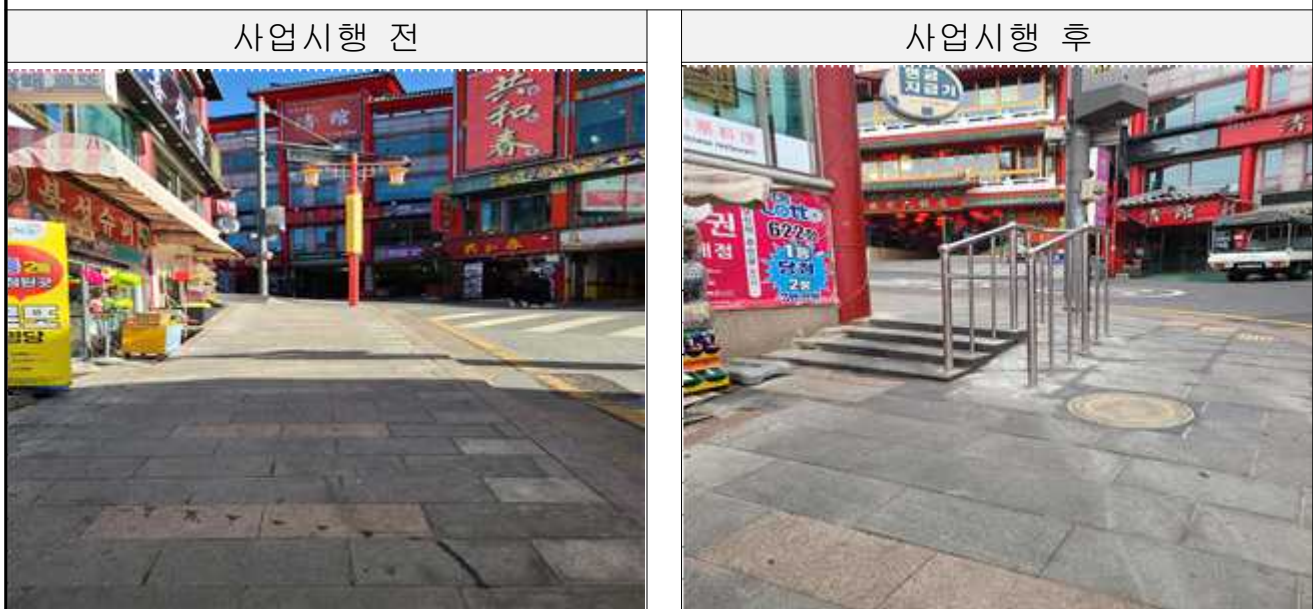

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-15(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	북성동 동네부엌 조성 사업			제안자	유*길
부서명	개항동	담당자	행정7급 박미숙	연락처	760-6224
추진상황	예산	30,000천원	집행액	27,815천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운로44번길 13-2 개항동행정복지센터 별관
- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 먹거리를 매개로 이웃간 소통을 활성화하는 마을공동 공간 설치
 - 지역사회 주민들이 자발적으로 소규모 사업을 수행하는 공간으로 사용
- 추진상황
 - 2021. 1월 : 동네부엌 조성 계획 수립 및 공유재산 사용 신청
 - 2021. 2월 : 공유재산 사용 불가 회신
 - 2021. 3월 : 동네부엌 사업장소 재검토
 - 2021. 7월 : 동네부엌 조성 장소 확보
 - 2021. 8월 : 동네부엌 공사 시행 및 물품구입
 - 2021. 9월 : 주민참여예산사업 모니터링 시행

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-16(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	무단횡단 금지대 설치			제안자	강*규
부서명	개항동	담당자	행정7급 송문희	연락처	760-6245
추진상황	예산	20,000천원	집행액	18,130천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 송월아파트 앞 참외전로 일원 도로 160m
- 사업기간 : 2021.3.13.(토)
- 사업내용
 - 송월아파트 앞 도로중앙에 무단횡단 금지대 설치
- 기대효과
 - 무단횡단으로 인한 안전사고 예방 및 감소
- 행정사항 : 시설물 설치 후 교통운수과 사후관리

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-17(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	영종1동 소식지 게시판 설치			제안자	영종1동 주민참여예산 지역위원회
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이현정	연락처	760-6364
추진상황	예산	13,000천원	집행액	12,986천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 관내 공동주택 13개소
- 사업기간 : 2021. 4월
- 사업내용
 - 소식지 게시대를 제작하여 공동주택에 배부하고, 매주 발행하고 있는 영종1동 행정복지센터 소식지를 비치하여 구정 소식을 홍보하고자 함.
- 추진상황
 - 공동주택별 소식지 게시대 배부 완료.

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-18(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	배움과 나눔(아기자기)			제안자	한*희
부서명	영종1동	담당자	행정8급 이동환	연락처	760-6364
추진상황	예산	27,000천원		집행액	-
	미추진	추진중		완 료	추진율
	○				0%

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터
- 사업기간 : 2021. 7월~12월 (※ 사회적 거리두기 단계 조정에 따라 유동적 시행)
- 사업내용
 - 영종1동 행정복지센터 내 공유주방 및 프로그램실을 활용하여 다양한 문예교육·취미여가·체험활동을 진행하여 배움과 나눔으로써 활기찬 생활을 영위할 수 있도록 기회를 마련
- 추진상황
 - 코로나 19 사회적 거리두기 4단계 시행에 따라 시행 지연
 - 11월 중 단계적 일상회복이 진행되었지만 회계연도 말까지 기한이 촉박해 사업진행이 어렵다고 판단
- 향후계획
 - 사업 종료 및 예산 반납

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
해당사항 없음	해당사항 없음

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-19(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	앞마루 공원 정자 정비			제안자	최*자
부서명	운서동	담당자	행정8급 박지상	연락처	760-6257
추진상황	예산	38,000천원		집행액	35,841천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 2787-4 앞마루공원
- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 5월
- 사업내용
 - 철거작업 : 기존 정자 철거 및 나무 이식 작업
 - 신규설치 : 정자, 등받이 의자, 석재장기판 등 설치
- 추진상황
 - 철거작업 완료
 - 신규설치
 1. 석재장기판 설치 완료
 2. 공원안내판 설치 완료
 3. 정자 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-20(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	상습 무단투기지역 꽃씨뿌리기 활동			제안자	김*성
부서명	운서동	담당자	행정8급 박지상	연락처	760-6257
추진상황	예산	2,000천원	집행액	1,980천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 3045-2(450평)
- 사업기간 : 2021. 9. 6 ~ 9. 15(10일간)
- 사업내용
 - 장기간 방치로 인한 무분별한 무단투기 쓰레기 및 잡초 정리
 - 주민참여를 통한 꽃밭 조성 및 무단투기 금지 안내판 설치
- 추진상황
 - 2021. 9. 7. : 무단투기 쓰레기 및 잡초정리
 - 2021. 9. 14. : 주민참여 꽃밭 조성 및 무단투기 금지 안내판 설치
- 향후계획
 - 2021. 연중 : 주민참여를 통한 지속적인 꽃밭관리

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2020-21(동)
------	------------

기준일 : 2021. 12. 31.

사업명	마을 공동 부엌 설치			제안자	김*선
부서명	용유동	담당자	행정7급 육민호	연락처	760-6286
추진상황	예산	43,000천원	집행액	41,377천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 마시란로 308-13 (용유동 행정복지센터 부지 내)
- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 9월
- 사업내용
 - 기존 유휴공간을 활용하여 마을 공동 부엌으로 설치·운영
 - 공동 조리실 및 주민 커뮤니티 공간 설치
- 추진상황
 - 2021. 5월 : 공사 착공
 - 2021. 6월 : 공사 준공 및 시설 운영 물품 구입
 - 2021. 7월 : 시설 운영 물품 구입
 - 2021. 9월 : 추석 명절 취약계층 명절음식 만들기 공간 제공
 - 2021. 10월: 마을 공동 부엌 운영 계획 수립 및 주민 홍보
- 향후계획
 - 2022. 1월 이후 : 동 행사 및 주민 행사 시 마을 공동 부엌 운영

□ 관련사진

