

2023년도 예산 반영, 주민참여예산 사업 현황

(2023. 3. 31. 기준, 단위 : 천원)

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
	총 계	총 41건	2,551,160	94,869			
1	건설과 (원도심)	구도심 노후 점멸기 교체사업	450,000	0		○	
2	건설과 (신흥동)	신흥시장 입구 보도블럭 정비	30,000	0		○	
3	안전관리과 (울목동)	범죄예방시설물 설치사업	11,000	0		○	
4	도시계획과 (신포동)	자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업	250,000	18,260		○	
5	도시계획과 (신포동)	자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업	500,000	0		○	
6	교통운수과 (원도심)	원도심 내 도로표지병 설치	50,000	0		○	
7	평생교육과 (중구)	생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업	41,960	0	○		
8	기반시설과 (용유동)	안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사	200,000	0		○	
9	도시공원과 (영종1동)	하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업	50,000	0		○	
10	도시공원과 (용유동)	무의도 등산로 먼지털이시설 설치사업	30,000	0		○	
11	교통과 (영종국제도시)	영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치	100,000	0		○	
12	교통과 (영종국제도시)	영종국제도시 노후 노면표시 정비	200,000	13,761		○	
13	해양수산과 (용유동)	해수욕장 현수막 게시대 설치	84,000	0	○		
14	해양수산과 (용유동)	용유지역 해수욕장 조형물 보수	50,000	0	○		
15	보건행정과 (중구)	방역 취약 계층 방문 방역지원사업	100,000	27,580		○	
16	보건행정과 (중구)	친환경 해충 퇴치기 설치	20,000	0		○	
17	신포동	신포동 경관개선사업	13,700	0		○	
18	신포동	벽화 그리기 사업	10,000	0	○		
19	신포동	마을게시판 설치	10,000	0		○	
20	신포동	경사로 벤치 설치	5,000	0		○	

연번	사업부서 (사업위치)	사업명	사업비	집행액	추진상황		
					시기 미도래	추진중	추진 완료
21	연안동	연안동 관내 버스정류장 온열의자 설치	40,000	0		○	
22	신흥동	골목길 소화기 설치사업	3,500	0		○	
23	신흥동	경로당 미니 텃밭 보급 사업	5,000	0		○	
24	신흥동	우리동네 사통팔달 게시판 설치 사업	13,500	0		○	
25	도원동	환경개선을 위한 초화 가꾸기	5,000	0	○		
26	도원동	마을미관 개선 벽화 그리기	15,000	0	○		
27	도원동	쉬어가는 의자(쉽표의자) 설치	10,000	0	○		
28	율목동	쓰레기 무단투기방지 로고라이트 설치	19,800	0		○	
29	율목동	가로등주 화분 설치 및 초화식재	15,200	0		○	
30	율목동	도시텃밭 사업	3,000	0		○	
31	율목동	코로나19대비 소독수 주민지원사업	2,000	1,985			○
32	동인천동	마을 공동시설물 설치	40,000	0		○	
33	개항동	개항동 동네부엌(제과제빵)관련 물품(기구)구입	17,000	16,239		○	
34	개항동	카페쫄띠고 앞 쉼터 그늘막 설치	12,500	12,059			○
35	영종동	횡단보도 주변 휴게용 의자 설치	25,000	0		○	
36	영종1동	동청사 지하1층 환기시설 설치 및 장식장 설치	21,600	0		○	
37	영종1동	공구대여소 공구 등 확충 및 유지보수	17,400	275		○	
38	운서동	동네부엌 입구 정비	5,000	4,710			○
39	운서동	라이프 플러스 아카데미	13,000	0	○		
40	운서동	외국인 특화거리 벽화그리기 사업	22,000	0	○		
41	용유동	무의지역 스마트 마을게시판 설치	40,000	0		○	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-48
------	---------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	구도심 노후 점멸기 교체사업			제안자	박*경
부서명	건설과	담당자	공업9급 김승일	연락처	760-7834
추진상황	예산	450,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내 일원(영종국제도시 제외)
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 7월
- 사업내용 : 노후된 보안등 점멸기를 양방향 점멸기로 교체(1,790개소)
- 추진상황
 - 2023. 3. 6. : 실시설계 용역 시행
 - 2023. 3. 10. : 실시설계 용역 착수
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 실시설계 용역 준공
 - 2023. 4월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰
 - 2023. 5월 : 공사 착공
 - 2023. 7월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-65
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	신흥시장 입구 보도블럭 정비			제안자	오*영
부서명	건설과	담당자	시설8급 피성환	연락처	760-7454
추진상황	예산	30,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 신흥시장 일원
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 2023. 6월
- 사업내용
 - 신흥시장 일원 보도블럭 정비
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 현장확인
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 공사 설계
 - 2023. 5월 : 공사 착공
 - 2023. 6월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-173
------	----------



기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	범죄예방시설물 설치사업			제안자	이광훈
부서명	안전관리과	담당자	통신8급 강연구	연락처	760-7805
추진상황	예산	11,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 율목동 내 5개소
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 5월
- 사업내용
 - 율목동 일대 저조도 지역(골목 등)에 로고라이트를 설치하여 조도개선 및 여성안심귀갓길 조성
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 설치 예정지 방문 및 일정 조율
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 로고라이트 시안 선정 및 의견조회
 - 2023. 5월 : 범죄예방시설물 설치사업 완료

□ 관련사진

설치예시(1)	설치예시(2)
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-14
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업			제안자	안*수
부서명	도시계획과	담당자	녹지7급 김유리	연락처	760-7582
추진상황	예산	250,000천원		집행액	18,260천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			10%

□ 개 요

- 위 치 : 자유공원 게이트볼구장 일원 (중구 전동 34-9)
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 7월
- 사업내용
 - 게이트볼구장 : 지붕시설 및 방풍벽 교체
 - 화장실 : 기존화장실 철거 및 신규 설치
- 추진상황
 - 2022. 6월 : 주민참여예산 부서 검토의견 제출
 - 2022. 8월 : 숙의토론회 관련 수정사항 재검토
 - 2022. 10월 : 사업 확정 및 2023년 본예산 사업비 편성
 - 2023. 1월 ~ 3월 : 실시설계 용역 추진
 - 2023. 3월 : 주민참여예산 주민설명회 개최
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰
 - 2023. 4월 : 사업 착공
 - 2023. 7월 : 사업 준공 및 시설 개방

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-96
------	---------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업			제안자	류*근
부서명	도시계획과	담당자	녹지7급 김유리	연락처	760-7582
추진상황	예산	750,000천원		집행액	0천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			10%

□ 개 요

- 위 치 : 자유공원 광장 일원 (중구 송학동1가 11-1)
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 8월
- 사업내용
 - 광장화장실 (지상 및 지하)
 - 1) 화장실 내 소변기, 대변기, 세면대 교체
 - 2) 바닥재 및 벽체 타일 교체
 - 3) 출입문, 창문 등 노후시설 교체 등
 - 야외무대 : 노후 및 파손시설 교체 등
- 추진상황
 - 2022. 7월 : 주민참여예산 부서 검토의견 제출
 - 2022. 10월 : 사업 확정 및 2023년 본예산 사업비 편성
 - 2023. 2월 : 실시설계 용역 착수
- 향후계획
 - 2023. 5월 : 행정절차 이행, 일상감사 및 계약심사 의뢰
 - 2023. 5월 : 사업 착공
 - 2023. 8월 : 사업 준공 및 시설 개방

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-153
------	----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	원도심 내 도로표지병 설치	제안자	어*희
부서명	교통운수과 담당자	시설8급 강희엽	연락처
			760-7553
추진상황	예산	50,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	00천원
			추진율
			0%

□ 개 요

- 위 치 : 중구 관내(원도심)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 5.
- 사업내용 : 도로표지병 설치
- 추진상황
 - 2023. 2. : 설치대상지 수요조사(→ 각 행정복지센터, 중부경찰서, 도로교통공단)
 - 2023. 3. : 도로표지병 설치 관련 도로 포장 여부 회신 요청
(→ 건설과, 市종합건설본부)
 - 2023. 3. : 도로표지병 설치 관련 도로포장 계획 여부 회신
(市종합건설본부→ 區)[도로관리부-6286(2023. 3. 27.)호]
 - 회신내용 : 4월~7월 도로 포장 계획 有
- 향후계획
 - 2023. 하반기 : 물품 구입 및 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
<p style="text-align: center;">사진</p> <p><전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것></p>	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-18
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업			제안자	김*수
부서명	평생교육과	담당자	최문형	연락처	760-7958
추진상황	예산	41,960천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

○ 사업기간 : 2023. 9월 ~ 12월

○ 사업내용

1. 생애주기별(중장년·노년층) 평생교육 “바리스타 양성과정” 운영

- 기 간 : 2023. 9월 ~ 12월
- 장 소 : 바리스타 전문교육장
- 대 상 : 관심있는 40세이상 구민 30여명
- 소요예산 : 11,960천원
- 주요내용 : 바리스타 2급 자격증 취득교육(이론·실습 병행)

2. 중구 평생학습관 내 바리스타 및 제빵실 마련

- 위 치 : 중구 평생학습관(운남동 1737-2 / 인천하늘중학교 부지 內) 1층
- 소요예산 : 30,000천원
- 기 자 재 : 교육용 커피머신, 그라인더, 블랜더, 온수기, 제빙기 등

○ 추진상황

- 2023년 인천 중구 평생학습 연간사업 추진계획 수립

○ 향후계획

- 2023. 7월 : 바리스타 양성과정 실행계획 수립 및 운영
- 2023. 11월 : 평생학습관 바리스타 및 제빵실 기자재 구입 등

□ 관련사진

관련 부지 및 조감도



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-102
------	----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사	제안자	장*준
부서명	기반시설과 담당자	공업8급 나원영	연락처 760-8958
추진상황	예산	200,000천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
		○	20%

□ 개 요

- 위 치 : 인천 중구 하나개 해수욕장
- 사업기간 : 2023. 2월 ~ 6월
- 사업내용
 - 조명타워 신설 2개소
- 추진상황
 - 2023. 2. 16. : 실시설계용역 착공
- 향후계획
 - 2023. 3. 31. : 실시설계용역 준공
 - 2023. 4월 : 공사 착공
 - 2023. 6월 : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-26
------	---------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업			제안자	전*호
부서명	도시공원과	담당자	시설9급 오인호	연락처	760-7787
추진상황	예산	50,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		40%	

□ 개 요

- 위 치 : 하늘체육공원 (중산동 1878-3)
- 사업기간 : 2023. 2월 ~ 4월
- 사업내용
 - 체육시설 (인라인스케이트장, 배드민턴장 등) 주변 퍼걸러, 벤치 등 휴게시설 설치
- 추진상황
 - 2023. 3. 3. : 하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업 계약의뢰
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-11
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	무의도 등산로 먼지털이시설 설치사업			제안자	심*목
부서명	도시공원과	담당자	녹지8급 강원	연락처	760-7774
추진상황	예산	30,000천원		집행액	0천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			0%

□ 개 요

- 위 치 : 하나개해수욕장 (무의동 산189), 광명항 공영주차장 (무의동 50-18)
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 4월
- 사업내용 : 등산로 인근 먼지털이시설 설치 (2개)
 - 하나개해수욕장 내 흙먼지털이기 1개 설치
 - 광명항 공영주차장 내 흙먼지털이기 1개 설치
- 추진상황
 - 2023. 2월 : 먼지털이시설 설치 대상지 현장확인
 - 2023. 3월 : 「무의도 등산로 먼지털이시설 구입 설치」 계약
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 먼지털이시설 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
사진	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-81
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치			제안자	김*신
부서명	교통과	담당자	시설8급 이대한	연락처	760-7798
추진상황	예산	100,000천원		집행액	00천원
	시기 미도래	추진중		완료	추진율
		○			30%

□ 개요

- 위치 : 공항신도시, 운남지구 등 인구밀집과 교통사고가 많은 구간
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 4월
- 사업내용
 - 도로 시인성 강화를 위한 시설물(도로표지병) 설치
- 추진상황
 - 2023. 3. 24. : 「영종국제도시 도로 시인성 강화를 위한 도로표지병 설치사업」 계획 수립
 - 2023. 3. 27. : 일상감사 의뢰
 - 2023. 3. 28. : 물품 구입 계약의뢰
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 물품 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-41
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	영종국제도시 노후 노면표시 정비			제안자	김*신
부서명	교통과	담당자	시설8급 이대한	연락처	760-7798
추진상황	예산	200,000천원		집행액	13,761천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			30%

□ 개 요

- 위 치 : 공항신도시 일원 외 2개소(하늘도시중심상가지역, 운남지구)
- 사업기간 : 2022.4월
- 사업내용
 - 도로 내 노후 노면표시 재도색
- 추진상황
 - 2023. 1. 13. : 영종국제도시 노후 노면표시 정비 계획 수립
 - 2023. 1. 13. : 「영종국제도시 노후 노면표시 정비 조사용역」 시행
 - 2023. 2. 24. : 「영종국제도시 노후 노면표시 정비 조사용역」 준공 (13,716천원)
 - 2023. 3. 20. : 「2023년 영종국제도시 노후 노면표시 정비공사」 일상감사 의뢰
 - 2023. 3. 22. : 「2023년 영종국제도시 노후 노면표시 정비공사」 공사 계약의뢰
 - 2023. 3. 23. : 「2023년 영종국제도시 노후 노면표시 정비공사」 교통 공안 협의
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 공사 착공 및 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-105
------	----------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	해수욕장 현수막 게시대 설치			제안자	강*규
부서명	해양수산과	담당자	시설9급 안지혜	연락처	760-8874
추진상황	예산	84,000천원	집행액	0원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 용유동(을왕리·왕산·하나개 해수욕장)
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 해수욕장 내에 기설치되어 있는 현수막게시용 철탑 등 제거
 - 공식 게시대 신규 설치
- 추진상황
 - 시기 미도래
- 향후계획
 - 4월 중 사업 진행 예정
 - 위치
 - 을왕리 해수욕장 : 2개소 설치
 - 왕산 해수욕장 : 1개소 설치
 - 하나개 해수욕장 : 1개소 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	(사업시기 미도래)

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-110
------	----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	용유지역 해수욕장 조형물 보수			제안자	최*종
부서명	해양수산과	담당자	시설9급 안지혜	연락처	760-8874
추진상황	예산	50,000천원	집행액	0원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 을왕리 해수욕장
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 해수욕장 입구 아치 조형물 노후화로 전면 교체 필요
 - 조명 등 아치 조형물 내 기타 시설물 파손으로 인한 교체 필요
- 추진상황
 - 시기 미도래
- 향후계획
 - 4월 중 사업 진행 예정
 - 을왕리 해수욕장 2개소에 각각 설치하여 “동문“, ”서문“ 글자 추가 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p style="text-align: center;">(사업시기 미도래)</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-67
------	---------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	방역 취약 계층 방문 방역지원사업	제안자	허*봉
부서명	보건행정과 담당자	의료기술6급 김상덕	연락처
			760-6071
추진상황	예산	100,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	
			27,580천원
			추진율
			27%

□ 개 요

- 위 치 : 인천광역시 중구 보건행정과
- 사업기간 : 2023년 3월 ~ 12월
- 사업내용
 - 목표 : 1,350건
 - 대상 : 300세대 미만으로 공동주택과 단독주택 거주 중
 - 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대,
 - 장애의 정도가 심한 장애인, 65세 이상 홀로 사는 노인세대 등
 - 내용
 - 대상 세대 방문 실내 · 외 방역소독 실시
 - 살균, 살충, 유충구제, 바퀴벌레구제, 개미구제
 - 방문방역 후 자가방역 할 수 있도록 방역약품 지원 등
- 추진상황
 - 2023. 2월 : 「취약계층 방문방역 지원 사업」 운영 계획 수립
 - 2023. 3월 : 동행정복지센터, 건강증진과, 국제도시보건과, 대한노인회 중구 지회 홍보 협조 공문 및 포스터, 신청서, 전단지 배부 등
 - 2023. 3월 실적 : 160건
- 향후계획
 - 취약계층 방문방역 사업에 대한 주기적 홍보
 - 거동불편 취약계층 방문 방역 중점 실시 추진
 - 지역아동센터, 아동복지시설 지속적 방문방역 실시

□ 관련사진

사업시행 모습	사업시행 모습
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-169
------	----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	친환경 해충 퇴치기 설치	제안자	권*원
부서명	보건행정과 담당자	의료기술6급 김상덕	연락처
			760-6071
추진상황	예산	2,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
		○	30%

□ 개 요

○ 위 치 : 5개소 / 23대

- 인천 중구 신포로 27번길(안) : 4대
- 인천 중구 중산동 1871-6 구석말공원(안) : 8대
- 인천 중구 중산동 1880-4 선사공원(안) : 3대
- 인천 중구 중산동 1878-2 파크골프장(안) : 4대
- 인천 중구 백운로 414번길 75 영종역 버스 환승센터장 앞 주차장(안) : 4대

○ 사업기간 : 2023년 3월 ~ 4월

○ 사업내용

- 근린공원 등 주민여가시설 주변에 유해해충 친환경 해충 퇴치기 포충기 설치·운영하여 유해해충으로부터 주민을 보호하고 감염병 발생률을 감소 시키고자 함

○ 추진상황

- 2023. 3월 : 포충기 설치 장소 답사 및 장소 선정 협의

○ 향후계획

- 2023. 4월 : 포충기 설치 관련 업무 협조 요청(건설과, 기반시설과, 영종역)
- 2023. 4월 : 포충기 조달 구입 및 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-1(동)
------	-----------

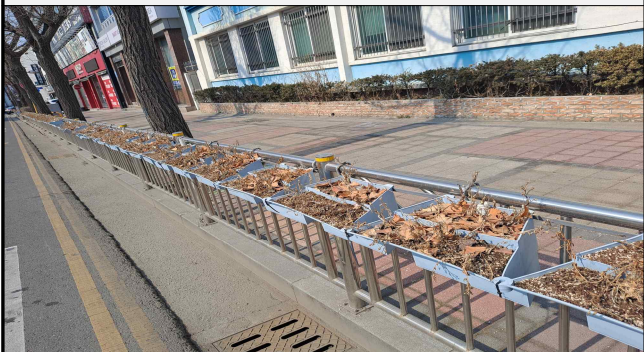
기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	신포동 경관개선사업			제안자	김*섭
부서명	신포동	담당자	행정7급 이광희	연락처	760-6105
추진상황	예산	13,700천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 신포동행정복지센터 부근, 신포로35번길 감나무 화단
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 10월
- 사업내용
 - 신포동행정복지센터 부근 초화 식재
 - 신포로35번길 감나무 화단관리
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 초화 식재 시기, 횡수와 범위(장소) 결정
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 초화 식재, 신포로35번길 감나무 비료 주기
 - 2023. 10월 : 신포로35번길 감나무 감 수확

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<div style="text-align: center; height: 150px;">사진</div>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-2(동)
------	-----------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	벽화 그리기 사업			제안자	조*자
부서명	신포동	담당자	행정7급 이광희	연락처	760-6105
추진상황	예산	10,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			0%	

□ 개 요

- 위 치 : 신포로35번길 54 (동국빌리지 담장)
- 사업기간 : 2023. 5월 이후 (미정)
- 사업내용
 - 신포동 관내 낡은 벽에 벽화를 그려 동 이미지 제고
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 동국빌리지 담장 현장 점검 → 노후화되어 보수 필요
 - ※ 참고사항 : ‘동국빌리지 담장보수’건이 건축과 소관 2023년도 공동주택 관리지원 사업으로 선정(3.23.)되어 담장보수 공사(4~5월) 준공 후에 벽화 그리기가 가능할 것으로 판단
- 향후계획
 - 2023. 4~5월 : 동국빌리지 담장보수 공사 진행
 - 2023. 5월 이후 : 벽화 그리기 추진 (장마철 시기 고려 예정)

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-3(동)
------	-----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	마을게시판 설치	제안자	김*희
부서명	신포동 담당자	행정7급 이광희	연락처 760-6105
추진상황	예산	10,000천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
		○	0%

□ 개 요

- 위 치 : 신포동 관내
- 사업기간 : 2023. 4월
- 사업내용
 - 신포동 관내 유동인구 많은 구역에 마을 게시판 설치
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 게시판 설치 장소 결정
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 업체 선정 및 게시판 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
<p style="text-align: center;">사진</p> <p><전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것></p>	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-4(동)
------	-----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	경사로 벤치 설치	제안자	김*유
부서명	신포동 담당자	행정7급 이광희	연락처 760-6105
추진상황	예산	5,000천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
		○	0%

□ 개 요

- 위 치 : 신포동 관내
- 사업기간 : 2023. 4월
- 사업내용
 - 신포동 관내 오르막길에 쉬어가는 벤치 설치
- 추진상황
 - 2023. 3~4월 : 벤치 설치 장소 결정
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 업체 선정 및 벤치 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
<p style="text-align: center;">사진</p> <p><전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것></p>	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-5(동)
------	-----------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	연안동 관내 버스정류장 온열의자 설치	제안자	김*영
부서명	연안동 담당자	행정7급 권수진	연락처 760-6124
추진상황	예산	4,000천원	집행액 0천원
	시기 미도래	추진중	완료
		○	추진율 0%

□ 개요

- 위치 : 연안동 관내 버스정류장
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 6월
- 사업내용
 - 관내 버스정류장 온열의자 설치
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 견적서 검토 및 사업대상지 선정
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 전기 인입공사 계약 체결
 - 2023. 5월 : 전기 인입공사 실시
 - 2023. 6월 : 온열의자 구입 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<p>사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-6(동)
------	-----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	골목길 소화기 설치 사업			제안자	오*영
부서명	신흥동	담당자	행정8급 윤현재	연락처	760-6145
추진상황	예산	3,500천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 관내 소방차 진입이 곤란한 좁은 골목길
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 골목길 보이는 소화기 10개소 설치
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 업체 선정 및 견적서 검토



- 향후계획
 - 2023. 4월 : 주민참여예산위원회 개최, 설치 장소 선정
 - 2023. 5월 : 물품 구매 및 비치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
<p style="text-align: center;">사진</p> <p><전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것></p>	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-7(동)
------	-----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	경로당 미니 텃밭 보급 사업			제안자	함*경
부서명	신흥동	담당자	행정8급 윤현재	연락처	760-6145
추진상황	예산	5,000천원	집행액	00천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 관내 경로당 9개소
- 사업기간 : 2023. 4월
- 사업내용
 - 관내 경로당 9개소에 미니 텃밭 배부

○ 추진상황

- 2023. 3월 : 업체 선정 및 견적서 검토

상자텃밭 세트

					
텃밭 화분	배양토	마사토	영양배합토	씨앗	모종

○ 향후계획

- 2023. 4월 : 물품 구매 및 배부

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
<p style="text-align: center;">사진</p> <p><전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것></p>	<p style="text-align: center;">사진</p>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-8(동)
------	-----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	우리동네 사통발달 게시판 설치 사업	제안자	고*순
부서명	신흥동 담당자	행정8급 윤현재	연락처 760-6145
추진상황	예산	13,500천원	집행액 00천원
	시기 미도래	추진중	완 료 추진율
		○	0%

□ 개 요

- 위 치 : 신흥동 관내 빌라 밀집지역(1~5통, 8통, 36통)
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 5월
- 사업내용
 - 노후화된 게시판을 현해화하여 관내 마을소식을 알리는 데 기여
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 업체 선정 및 견적서 검토
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 주민참여예산위원회 개최, 설치 장소 선정
 - 2023. 5월 : 게시판 설치

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
사진 <전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것>	사진

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-9(동)
------	-----------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	환경 개선을 위한 초화 가꾸기	제안자	도원동 주민자치회
부서명	도원동 행정복지센터	담당자	행정7급 이정아
		연락처	760-6165
추진상황	예산	5,000천원	집행액
	시기 미도래	추진중	완 료
	○		

□ 개 요

○ 위 치 : 참외전로244번길 23 옆 계단 외 1개소

※ 대상지는 상황에 따라 변동될 수 있음.

○ 사업기간 : 2023. 5월 ~ 6월

○ 사업내용

– 쓰레기 무단투기 지역 또는 공터에 초화 식재 및 화분 배치

○ 향후계획

– 2023. 5월 : 적합한 초화 또는 식재 결정 및 장소 확정

– 2023. 5월 : 착공

– 2023. 6월 : 준공

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-10(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	마을미관 개선 벽화그리기			제안자	도원동 주민자치회
부서명	도원동 행정복지센터	담당자	행정7급 이정아	연락처	760-6165
추진상황	예산	15,000천원	집행액		-
	시기 미도래	추진중	완 료		추진율
	○				-

□ 개 요

○ 위 치 : 도원로56번길 13-18 외 3개소

○ 사업기간 : 2023. 5월 ~6월

○ 사업내용

- 관내 노후 담장 등에 벽화그리기로 미관 개선

○ 향후계획

- 2023. 4월 : 주민 동의서 징구

- 2023. 5월 : 착공

- 2023. 6월 : 준공

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-11(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	쉬어가는 의자(쉼표의자) 설치			제안자	도원동 주민자치회
부서명	도원동 행정복지센터	담당자	행정7급 이정아	연락처	760-6165
추진상황	예산	10,000천원	집행액		-
	시기 미도래	추진중	완 료		추진율
	○				-

□ 개 요

○ 위 치 : 도원동 28-119 쉼터 앞 외 9개소

※ 대상지는 상황에 따라 변동될 수 있음.

○ 사업기간 : 2023. 4월 ~5월

○ 사업내용

- 보행 중 휴식이 필요한 주민들을 위하여 옥외용 휴게의자 설치

○ 향후계획

- 2023. 4월 : 도로점용 허가관련 협의 및 확정 (건설과)

- 2023. 4월 : 착공

- 2023. 5월 : 준공

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-12(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	쓰레기 무단투기방지 로고라이트 설치			제안자	이*훈
부서명	율목동	담당자	행정7급 이진아	연락처	760-6184
추진상황	예산	19,800천원		집행액	0천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			0%

□ 개 요

- 위 치 : 율목동 관내
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 쓰레기 무단투기 감시가 상대적으로 어려운 야간시간대 무단투기금지 로고 이미지를 바닥에 표출하여 상습투기지역의 무단투기를 감소시키고자 함.
- 추진상황
 - 2023. 2월 : 주민참여예산 제안자의 의견수렴
 - 2023. 3월 : 설치 위치 재확인(주민의견 수렴)
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 견적 및 물품 확인(디자인 등), 관련부서 협조 요청
 - 2023. 6월 : 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<div style="text-align: center; height: 200px;">사진</div>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-13(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	가로등주 화분 설치 및 초화식재			제안자	엄*숙
부서명	율목동	담당자	행정7급 이진아	연락처	760-6184
추진상황	예산	15,200천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		30%	

□ 개 요

- 위 치 : 율목동 관내
- 사업기간 : 2023. 2월 ~ 10월
- 사업내용
 - 율목동 공영주차장 외부펜스 화분 설치 및 봄 가을 초화 식재를 통해 도심미관을 개선하여 생동감이 넘치고 활기찬 주거환경을 제공
 - ※ 가로등주 화분 설치 및 설치 이후의 관리에 어려움이 있는 가로등주 화분을 대신하여 외부펜스에 꽃 화분을 설치하는 방법으로 진행
- 추진상황
 - 2023. 2월 : 주민참여예산 제안자의 의견수렴 및 위치 선정
 - 2023. 3월 : 관련부서(교통운수과) 협조요청
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 견적 및 물품 확인(디자인 등)
 - 2023. 5월 : 외부펜스 화분 설치 완료 및 봄 초화 식재
 - 2023. 9월 : 가을 초화 식재

□ 관련사진

사업시행 전		사업시행 후	
			
외부펜스	화단		

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-14(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	도시텃밭사업			제안자	장*숙
부서명	율목동	담당자	행정7급 이진아	연락처	760-6184
추진상황	예산	3,000천원	집행액	0천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		20%	

□ 개 요

- 위 치 : 율목동 188, 193-2 (빈집 정비 공공용토지)
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 11월
- 사업내용
 - 공공용 토지를 이용하여 작물의 식재 및 재배, 수확을 통해 빈 토지의 우범화를 막고 이웃 간 친목 도모 및 공동체 생활 활성화에 기여
- 추진상황
 - 2023. 2월 : 찾아가는 도시농업 교육(10회) 신청 및 선정
 - 2023. 3월 : 공공용토지 사용 단체 모집
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 공공용토지 사용 단체 선정
 찾아가는 도시농업 교육 진행 및 재배작물 식재
 - 2023. 5월 ~ 10월 : 작물 재배 및 수확
 - 2023. 11월 : 재배 작물을 이용한 나눔행사 진행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-15(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	코로나19대비 소독수 주민지원사업			제안자	김*분
부서명	율목동	담당자	행정7급 이진아	연락처	760-6184
추진상황	예산	2,000천원		집행액	1,986천원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
				○	100%

□ 개 요

○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 지속적인 방역지원(소독수 무료배포) 활동을 통해 동 주민들의 건강한 보건위생을 도모

○ 추진상황

- 2023. 2월 : 소독수 배부용 분무기 구입
- 2023. 3월 : 소독수 무료배부 홍보 현수막 제작

○ 향후계획

- 2023. 3월 ~ 12월 : 소독수 무료배부

□ 관련사진

사업시행 후



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-16(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	마을 공동시설물 설치			제안자	김*근
부서명	동인천동	담당자	행정7급 전하영	연락처	760-6205
추진상황	예산	40,000천원	집행액	-천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 동 청사 내(전동 2-1)
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 6월
- 사업내용
 - 컨테이너 기초설치공사(바닥기초 및 상·하수도, 전기 연결공사 등)
 - 컨테이너 하우스 물품 구입
 - 컨테이너 내부 구성 물품 구입
- 추진상황
 - 2023. 3월 : 컨테이너 하우스 및 바닥 기초설치 공사 견적 등 사전 작업
 - 2023. 3. 30. : 예산변경 사용 계획 수립 및 예산변경 요구제출(→기획예산실)
- 향후계획
 - 2023. 4월 ~5월
 - 바닥 기초설치 공사 계약 · 착공 · 준공
 - 컨테이너 하우스 구입(나라장터 조달물품 계약체결)
 - 컨테이너 설치 후 상·하수도, 전기 연결공사 등
 - 2023. 6월 : 컨테이너 하우스 내부 구성 물품 구입

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-17(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	개항동 동네부엌(제과제빵)관련 물품(기구)구입			제안자	정*진
부서명	개항동	담당자	행정7급 백현정	연락처	760-6224
추진상황	예산	17,000천원	집행액	16,239천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		96%	

□ 개 요

- 위 치 : 차이나타운로44번길 13-2
- 사업기간 : 2023. 3월~12월
- 사업내용
 - 개항동 지역사회보장협의체 위원님들의 재능기부로 빵을 만들어 어려운 이웃에게 제공하는 계기를 마련하려 함.
 - 개항동 주민자치센터에 제과제빵 교실을 개강하여 프로그램을 폭넓게 구성하고자 함.
- 추진상황
 - 2023. 3. 9. : 개항동 동네부엌(제과제빵)관련 물품 구입 계획 수립
 - 2023. 3. 17. ~ 3. 31. : 제과제빵 물품 계약 및 구입
- 향후계획
 - 2023. 4월 : 제과제빵 물품(소도구) 구입 및 배치
 - 2023. 7월 : 2023년도 3분기 주민자치프로그램(제과제빵) 운영

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-18(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	카페곶띠고 앞 쉼터 그늘막 설치			제안자	신*재
부서명	개항동	담당자	행정7급 백현정	연락처	760-6224
추진상황	예산	12,500천원	집행액	12,059천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 제물량로 262-20 앞 도로
- 사업기간 : 2023. 2월~3월
- 사업내용
 - 차이나타운 관광객들에게 휴식 공간 마련
- 추진상황
 - 2023. 2. 8. : 카페곶띠고 앞 쉼터 그늘막 구입·설치 계획 수립
 - 2023. 2. 8. : 그늘막 설치에 따른 도로점용허가 신청(개항동 → 인천 중구 건설과)
 - 2023. 2. 9. : 그늘막 설치에 따른 도로점용허가 신청 회신(인천 중구 건설과 → 개항동)
 - 2023. 2. 16. : 그늘막 계약 및 구입
 - 2023. 3. 7. : 그늘막 설치
 - 2023. 3. 13. : 영조물 손해배상 공제보험 가입 신청(개항동 → 인천 중구 재무과)

□ 관련사진



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-19(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	횡단보도 주변 휴게용 의자 설치			제안자	최*호
부서명	영종동	담당자	행정6급 안현진	연락처	760-8883
추진상황	예산	25,000천원		집행액	-
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			0%

□ 개 요

- 위 치 : 영종동 관내 횡단보도 주변 25개소
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 5월
- 사업내용 : 횡단보도 주변 옥외용 벤치 설치
- 추진상황
 - 2023. 2. 23. : 사업 대상지 보행자 휴게의자 설치 가능 여부 검토 의뢰(1차)
(기반시설과)
 - 2023. 3. 3. : 검토의견 회신(부적정 지역 다수)
 - 2023. 3. 6. ~ 3. 31. : 사업 대상지 재 선정을 위한 현지 확인
- 향후계획
 - 2023. 3월 : 사업 대상지 보행자 휴게의자 설치 가능 여부 검토 의뢰(2차)
(기반시설과)
 - 2023. 4월
 - 사업 대상지 선정 및 설계, 유관부서(교통운수과) 및 기관(인천중부서) 사업내용 검토 요청
 - 도로점용허가신청(기반시설과) 및 계약시행
 - 2023. 5월 : 설치 완료

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
<div style="text-align: center;">사진</div> <p><전, 후 사진을 가능한 같은 장소에서 촬영할 것></p>	<div style="text-align: center;">사진</div>

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-20(동)
------	------------


기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	동 청사 지하1층 환기시설 및 장식장 설치			제안자	석*아
부서명	영종1동	담당자	행정8급 박철중	연락처	760-6364
추진상황	예산	21,600천원		집행액	0원
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
		○			0%

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터 지하1층
- 사업기간 : 2023년 4월 중
- 사업내용
 - 지하1층 환기시설 설치
 - 나눔부두막 이용자들을 위한 장식장 설치
- 추진상황
 - 2023. 3. 14. : 시설설치 등을 위한 현장 확인
- 향후계획
 - 2023. 4월 중 : 공사 시행

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-21(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	공구대여소 공구 등 확충 및 유지보수			제안자	권*옥
부서명	영종1동	담당자	행정8급 박철중	연락처	760-6364
추진상황	예산	17,400천원	집행액	275천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		10%	

□ 개 요

- 위 치 : 영종1동 행정복지센터 지하1층
- 사업기간 : 2023. 연중
- 사업내용
 - 공구대여소 공구 등 확충
 - 공구 유지보수
- 추진상황
 - 2023. 3. 16. : 공구 유지보수 시행 (1회)
- 향후계획
 - 2023. 4월 중 : 공구 구매 예정
 - 2023. 수시 : 공구문제 발생 시 유지보수 예정

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-22(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	동네부엌 입구정비			제안자	안*숙
부서명	운서동	담당자	사회복지7급 신정희	연락처	760-6277
추진상황	예산	5,000천원	집행액	4,710천원	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
			○	100%	

□ 개 요

- 위 치 : 신도시북로140번길 7 동네부엌 진입로
- 사업기간 : 2023. 3. 2. ~ 3. 8.
- 사업내용
 - 동네부엌 입구 배수로 하수관 설치
 - 보도블럭 일부 교체
- 추진상황
 - 동네부엌 입구 진입로 정비 완료
- 향후계획
 - 여름철 장마 기간 중 배수 여부 수시 확인

□ 관련사진

사업시행 전



사업시행 후



주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-23(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	라이프플러스 아카데미			제안자	장*애
부서명	운서동	담당자	행정7급 성정은	연락처	760-6264
추진상황	예산	13,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
	○			-	

□ 개 요

- 위 치 : 운서동 행정복지센터 5층 대강당
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 10월
- 사업내용
 - 스마트폰 사진 아카데미 : 사진 어플 활용법 및 보정 등
 - 도란도란 손뜨개 아카데미 : 손뜨개 기초 및 나만의 작품 만들기
 - 반려식물 키우기 아카데미 : 원예키트를 이용한 반려식물 심기 체험 등
- 추진상황
 - 2023.4월 추진예정
- 향후계획
 - 2023.4월 : 강사 선정 및 수강생 모집
 - 2023.5월 ~ : 아카데미 진행 및 마무리

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-24(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	외국인특화거리 벽화그리기			제안자	최*자
부서명	운서동	담당자	행정7급 성정은	연락처	760-6264
추진상황	예산	22,000천원		집행액	-
	시기 미도래	추진중		완 료	추진율
	○				-

□ 개 요

- 위 치 : 외국인특화거리(신도시남로 141번길 일대)
- 사업기간 : 2023. 4월
- 사업내용
 - 기존 낡고 노후화된 벽화를 특색있는 벽화 디자인 및 트릭아트, 포토존 등 조성하여 도시미관 개선 및 볼거리 제공
- 추진상황
 - 2023.4월 추진예정
- 향후계획
 - 2023. 4. 14.限 : 용역업체 선정 및 계약 추진
 - 2023. 4. 28.限 : 작업 착수 및 마무리

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

주민참여예산 제안사업 관리카드

접수번호	2022-25(동)
------	------------

기준일 : 2023. 3. 31.

사업명	무의지역 스마트 마을게시판 설치			제안자	이*국
부서명	용유동	담당자	행정7급 윤새라	연락처	760-6284
추진상황	예산	40,000천원	집행액	-	
	시기 미도래	추진중	완 료	추진율	
		○		0%	

□ 개 요

- 위 치 : 무의동 471-1번지, 무의동 186-1번지, 무의동 9-4번지
- 사업기간 : 2023. 4월~6월
- 사업내용
 - 주민들이 많이 통행하는 버스정류장 등에 전자게시판을 설치하여 용유동 관내 마을소식을 쉽게 전달
- 추진상황
 - 2023. 3. : 마을게시판 설치 위치 등 현장 조사
- 향후계획
 - 2023. 4. : 공사 세부견적 진행 및 추진 업체 물색
 - 2023. 5. : 계약 체결 및 공사 착공
 - 2023. 6. : 공사 준공

□ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후
	<div style="text-align: center; height: 150px;">사진</div>
